DIGA DI BARCIS - SCARICO DI SUPERFICIE AUSILIARIO IN SPONDA SINISTRA

PROGRAMMA DEI LAVORI

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine
1	**PROGRAMMA LAVORI**	**654 g**	**lun 01/07/24**	**sab 01/08/26**
2	**CONSEGNA DELLE AREE**	**0 g**	**lun 01/07/24**	**lun 01/07/24**
3	**ACCANTIERAMENTO**	**54 g**	**lun 01/07/24**	**sab 31/08/24**
4	Installazione cantiere	52 g	lun 01/07/24	gio 29/08/24
5	Taglio alberature inteferenti con i lavori	6 g	ven 23/08/24	gio 29/08/24
6	Pedisposizione restringimenti stradali e segnaletica di cantiere	1 g	ven 30/08/24	ven 30/08/24
7	Consolidamento nicchia dietro ristorante	11 g	mar 20/08/24	sab 31/08/24
8	Completamento imbocco	0 g	mer 30/04/25	mer 30/04/25
9	Completamento manufatto di restituzione	0 g	mar 30/09/25	mar 30/09/25
10	Completamento galleria	0 g	mer 01/04/26	mer 01/04/26
11	Completamento sistemazioni finali e finiture	0 g	sab 01/08/26	sab 01/08/26
12	**OPERAZIONI PRELIMINARI**	**83 g**	**lun 01/07/24**	**ven 04/10/24**
13	Accantieramento per esecuzione Lavori Progetto	52 g	lun 01/07/24	gio 29/08/24
14	Operazioni topografiche	5 g	ven 26/07/24	mer 31/07/24
15	Parzializzazione sede stradale	2 g	gio 29/08/24	ven 30/08/24
16	Predisposizioni gru a torre	30 g	sab 31/08/24	ven 04/10/24
17	Carotaggio all'imbocco (C.T. Art. 2.4)	9 g	ven 02/08/24	lun 12/08/24
18	Messa in sicurezza parete rocciosa (C.T. Art. 3.8)	26 g	lun 01/07/24	mar 30/07/24
19	**SCAVI IMBOCCO**	**122 g**	**lun 02/09/24**	**mar 21/01/25**
20	**FASE S1 - SCAVO FINO A Q. 400**	**79 g**	**lun 02/09/24**	**lun 02/12/24**
21	*Abbassamento invaso a q. 398*	*0 g*	*lun 02/09/24*	*lun 02/09/24*
22	Scavo fino a . 401	5 g	mar 03/09/24	sab 07/09/24
23	Formazione pista in sx (fino a quota 401)	5 g	mar 03/09/24	sab 07/09/24
24	Preparazione imbocco pista in dx	15 g	ven 15/11/24	lun 02/12/24
25	Montaggio gru a torre	5 g	mar 12/11/24	sab 16/11/24
26	Campo prova tiranti	13 g	lun 18/11/24	lun 02/12/24
27	*Abbassamento invaso a q. 397*	*0 g*	*mar 24/09/24*	*mar 24/09/24*
28	Scavo fino a . 400	3 g	mer 25/09/24	ven 27/09/24
29	Formazione pista in sx (fino a quota 400)	2 g	sab 28/09/24	lun 30/09/24
30	Campo prova ancoraggi	10 g	gio 26/09/24	lun 07/10/24
31	Chiodature	3 g	ven 11/10/24	lun 14/10/24
32	Tiranti q. 401 (n. 6)	5 g	mar 15/10/24	sab 19/10/24
33	Maturazione tiranti	14 gt	sab 19/10/24	sab 02/11/24
34	**FASE S2 - SCAVO FINO A Q. 397**	**6 g**	**ven 01/11/24**	**gio 07/11/24**
35	*Abbassamento invaso a q. 394*	*0 g*	*ven 01/11/24*	*ven 01/11/24*
36	Scavo fino a q. 397 (900 m3)	3 g	ven 01/11/24	lun 04/11/24
37	Adattamento pista in sx	3 g	ven 01/11/24	lun 04/11/24

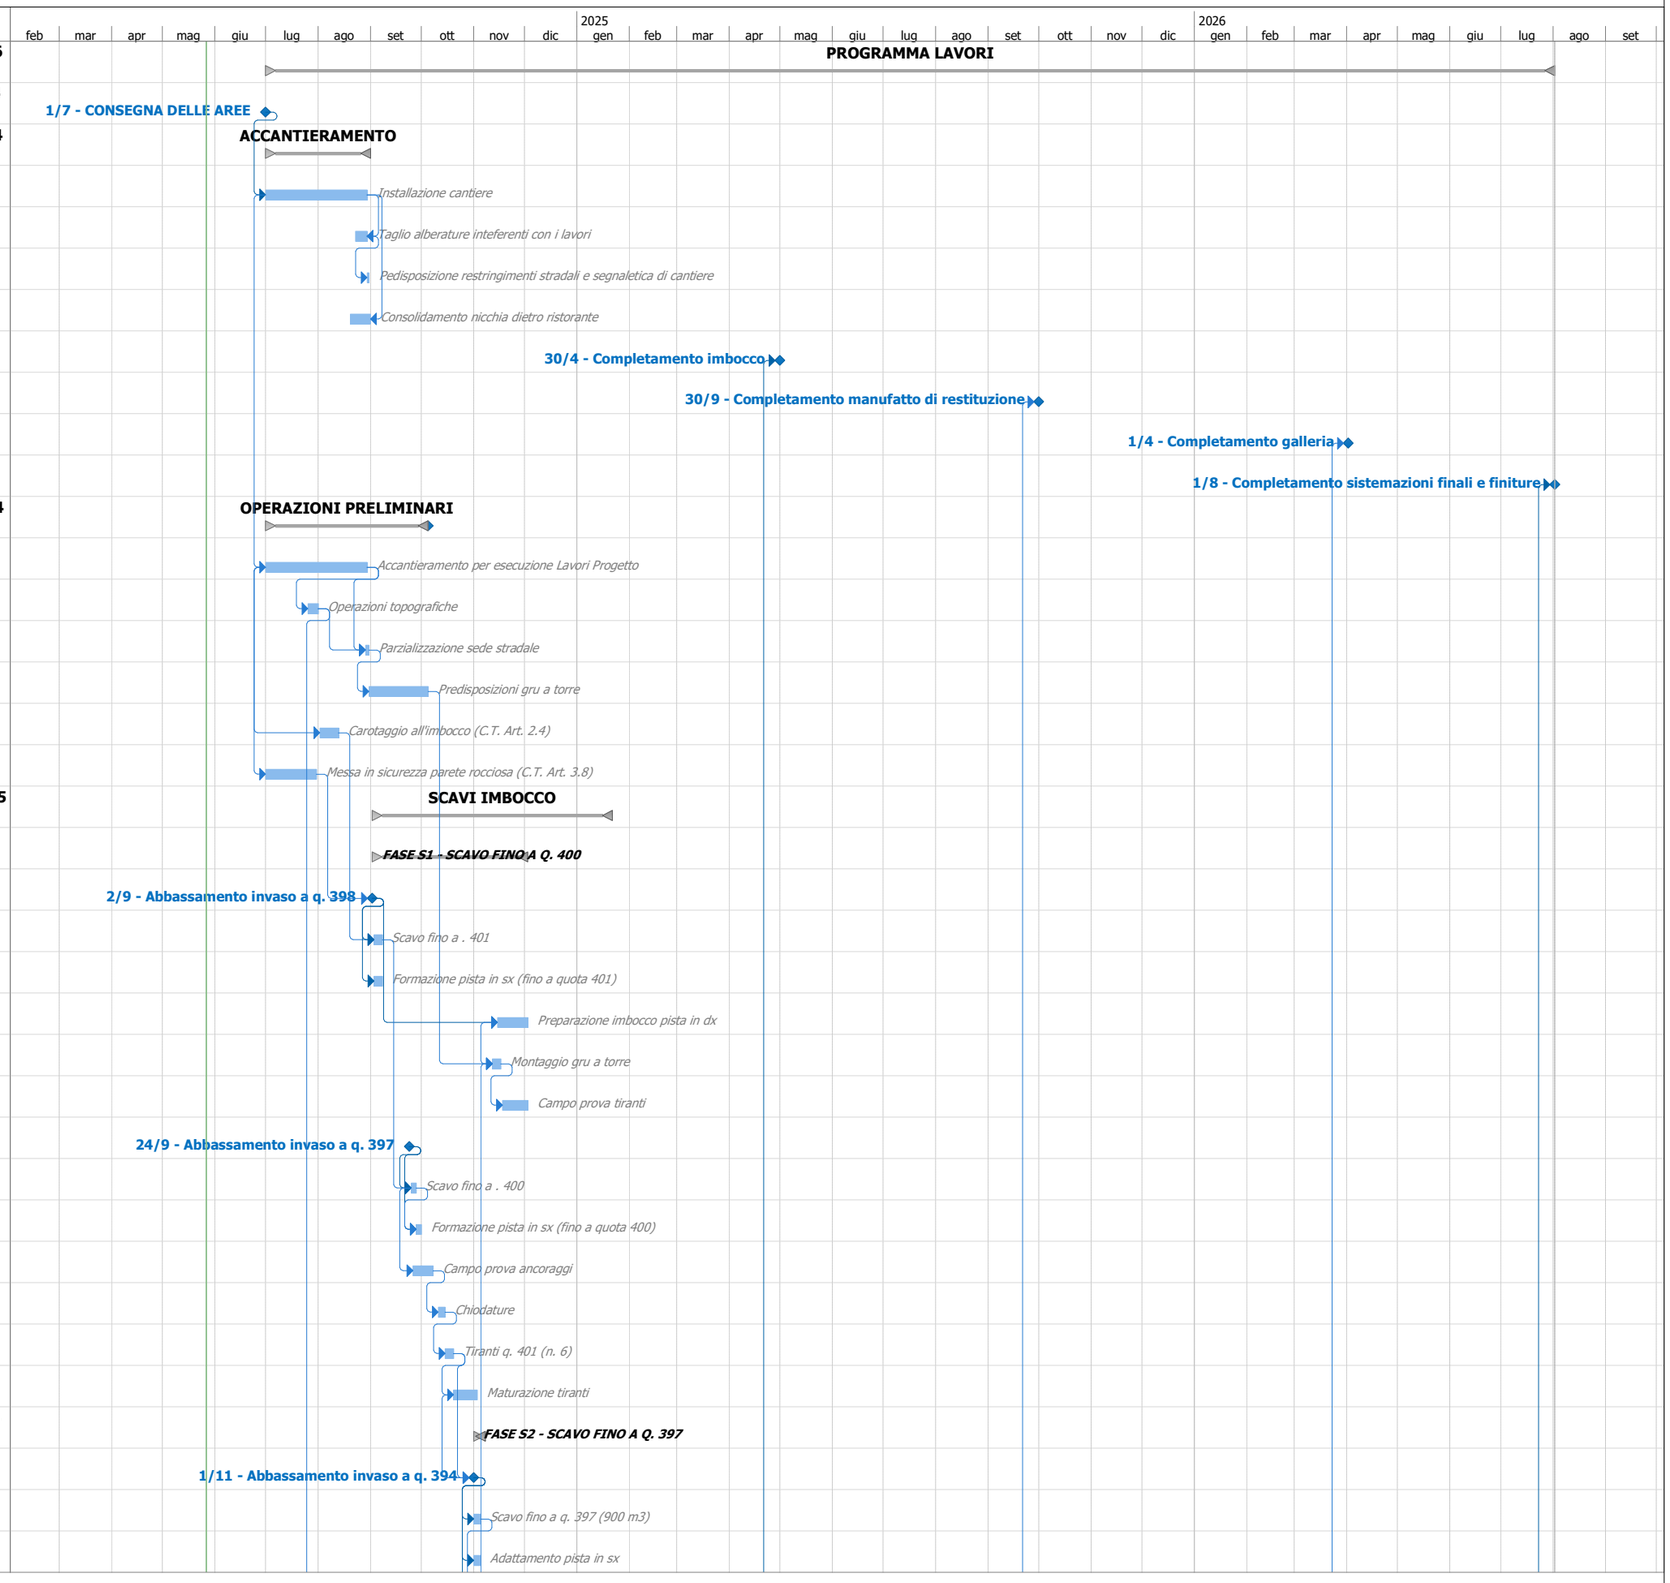

Progetto: Diga di Barcis - Prog
Data: lun 27/05/24

Attività — Cardine — Riepilogo — Avanzamento

DIGA DI BARCIS - SCARICO DI SUPERFICIE AUSILIARIO IN SPONDA SINISTRA

PROGRAMMA DEI LAVORI

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine
38	Pista in dx fino a q. 397	4 g	ven 01/11/24	mar 05/11/24
39	Chiodature (n. 43)	4 g	lun 04/11/24	gio 07/11/24
40	**FASE S3 - SCAVO FINO A Q. 394**	**7 g**	**gio 07/11/24**	**ven 15/11/24**
41	*Abbassamento invaso a q. 390*	*0 g*	*gio 07/11/24*	*gio 07/11/24*
42	Scavo fino a q. 394 (1.600 m3)	3 g	ven 08/11/24	lun 11/11/24
43	Completamento pista in dx	7 g	ven 08/11/24	ven 15/11/24
44	Chiodature (n. 39)	4 g	mar 12/11/24	ven 15/11/24
45	**FASE S4 - SCAVO FINO A Q. 391**	**24 g**	**ven 15/11/24**	**ven 13/12/24**
46	*Abbassamento invaso a q. 384*	*0 g*	*ven 15/11/24*	*ven 15/11/24*
47	Scavo fino a q. 391 (2.300 m3)	3 g	sab 16/11/24	mar 19/11/24
48	Scavi imposta muri in sx	14 g	lun 25/11/24	mar 10/12/24
49	Chiodature e barre vetroresina (n. 79)	4 g	gio 21/11/24	lun 25/11/24
50	Tiranti a q. 393 (n. 14)	5 g	lun 25/11/24	ven 29/11/24
51	Maturazione tiranti	14 gt	ven 29/11/24	ven 13/12/24
52	**FASE S5 - SCAVO FINO A Q. 388**	**15 g**	**sab 30/11/24**	**mar 17/12/24**
53	Scavo fino a q. 388 (3.200 m3)	6 g	sab 30/11/24	ven 06/12/24
54	Chiodature e barre vetroresina (n. 61)	3 g	mar 03/12/24	gio 05/12/24
55	Volate di prova e primi 3 m galleria	6 g	ven 06/12/24	gio 12/12/24
56	Centine galleria	4 g	ven 13/12/24	mar 17/12/24
57	**FASE S6 - SCAVO FINO A Q. 385**	**15 g**	**gio 12/12/24**	**sab 28/12/24**
58	*Abbassamento invaso a q. 375*	*0 g*	*gio 12/12/24*	*gio 12/12/24*
59	Scavo a valle fino a q. 385 (3.100 m3)	3 g	ven 13/12/24	lun 16/12/24
60	Scavi imposta muri in dx	15 g	gio 12/12/24	sab 28/12/24
61	Chiodature e barre vetroresina (n. 61)	2 g	sab 14/12/24	lun 16/12/24
62	Primi 6 m galleria	3 g	gio 19/12/24	sab 21/12/24
63	Centine galleria	2 g	sab 21/12/24	lun 23/12/24
64	**FASE S7 - SCAVO FINO A Q. 382**	**13 g**	**ven 20/12/24**	**ven 03/01/25**
65	Scavo a valle fino a q. 382 (1.200 m3)	2 g	lun 23/12/24	mar 24/12/24
66	Scavo a monte fino a q. 380 (1.100 m3)	9 g	ven 20/12/24	lun 30/12/24
67	Chiodature e barre vetroresina (n. 42)	2 g	gio 26/12/24	ven 27/12/24
68	Primi 9 m galleria	3 g	sab 28/12/24	mar 31/12/24
69	Centine galleria	2 g	gio 02/01/25	ven 03/01/25
70	**FASE S8 - SCAVO FINO A Q. 379**	**10 g**	**gio 02/01/25**	**lun 13/01/25**
71	Scavo a valle fino a q. 379 (1.400 m3)	3 g	gio 02/01/25	sab 04/01/25
72	Chiodature e barre vetroresina (n. 37)	2 g	lun 06/01/25	mar 07/01/25
73	Primi 12 m galleria	3 g	mer 08/01/25	ven 10/01/25
74	Centine galleria	2 g	sab 11/01/25	lun 13/01/25

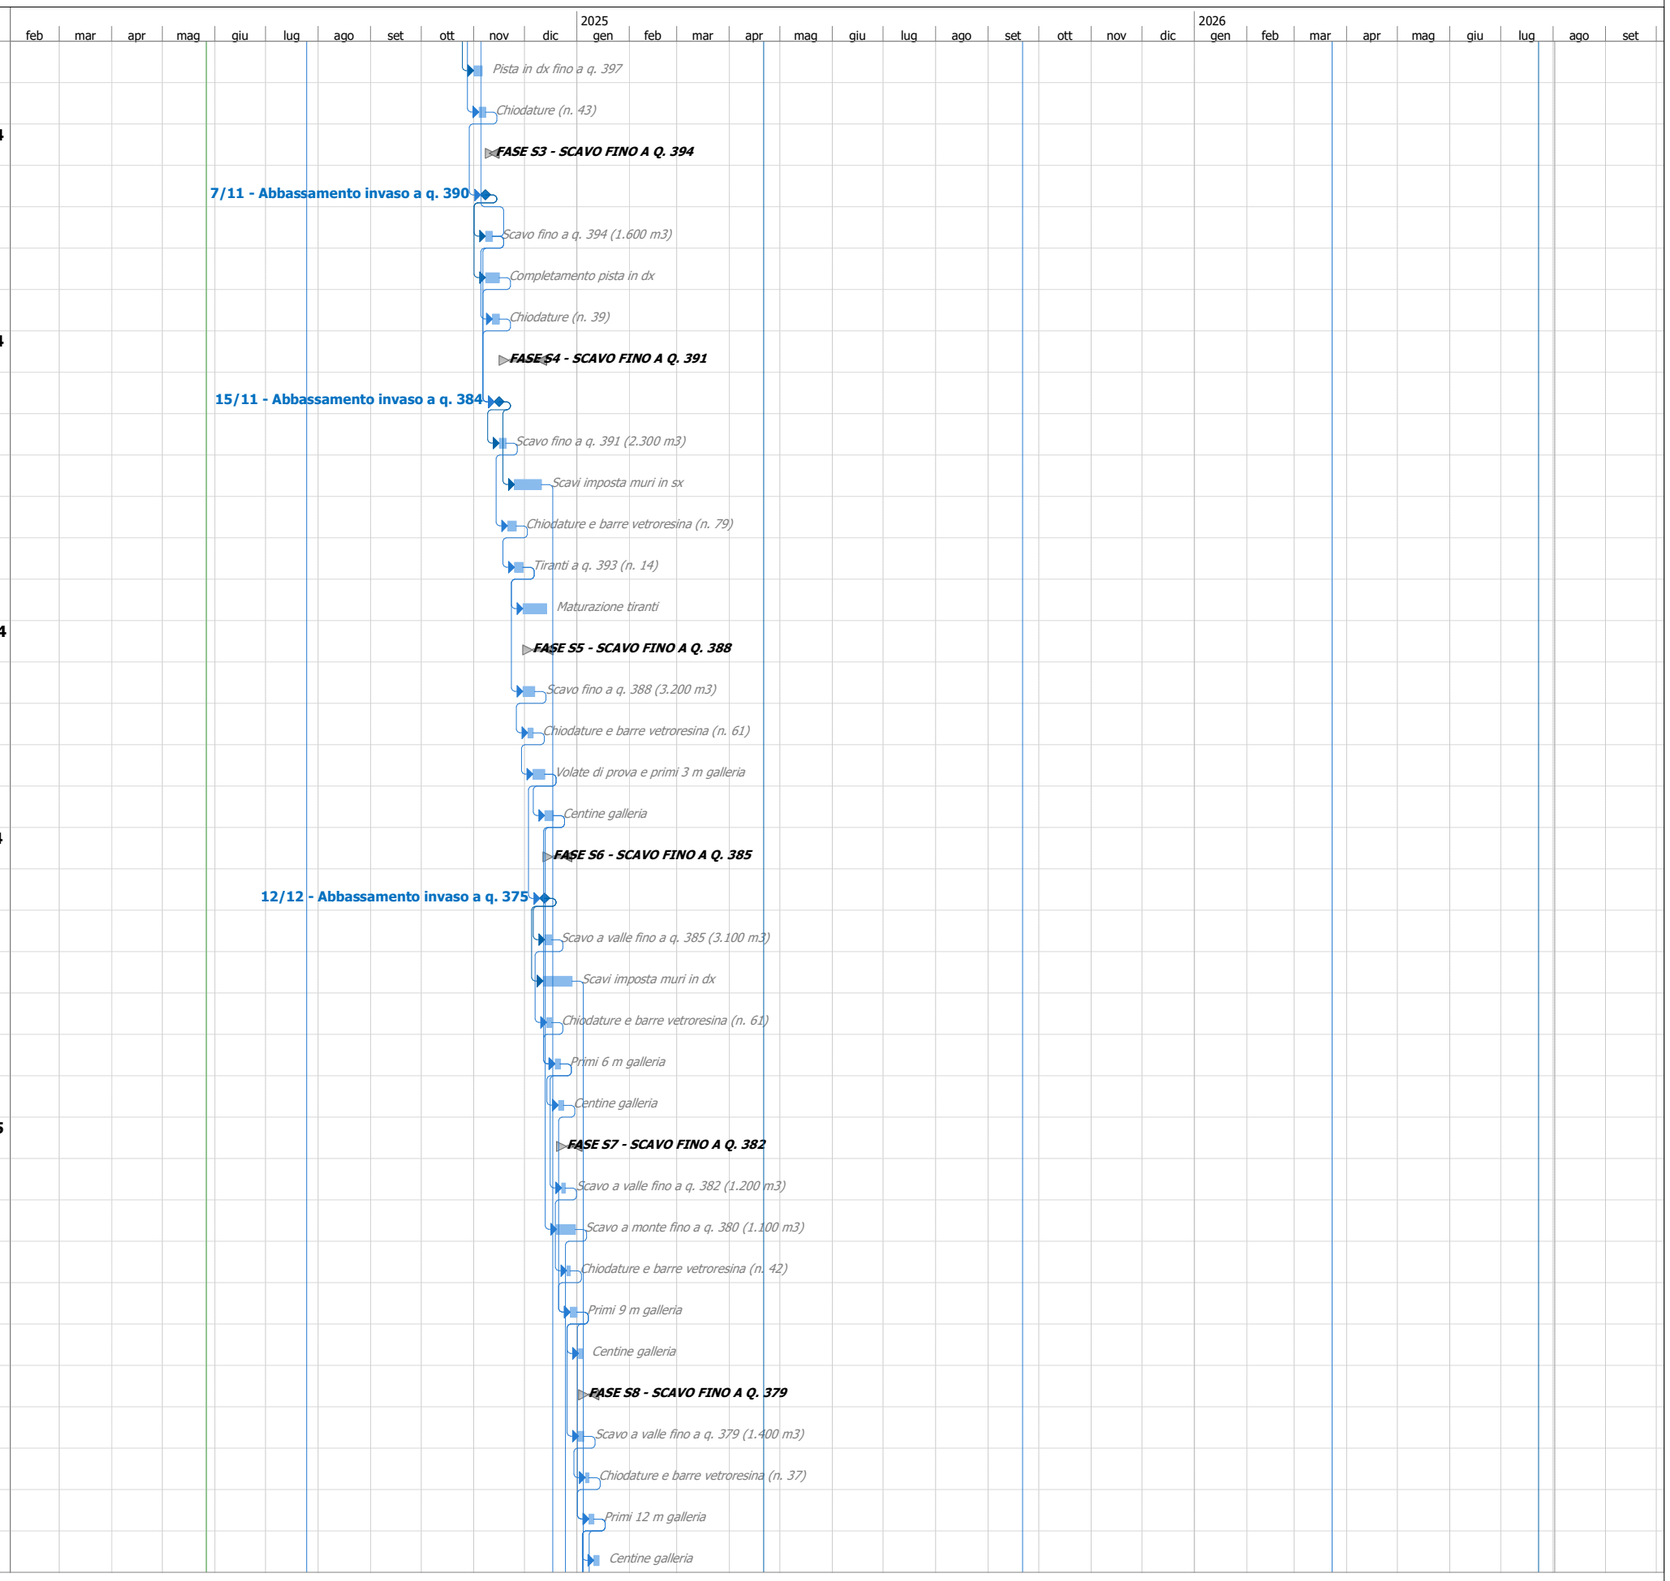

Progetto: Diga di Barcis - Prog
Data: lun 27/05/24

Attività | Cardine | Riepilogo | Avanzamento

DIGA DI BARCIS - SCARICO DI SUPERFICIE AUSILIARIO IN SPONDA SINISTRA

PROGRAMMA DEI LAVORI

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine
75	**FASE S9 - SCAVO FINO A Q. 376,50**	**9 g**	**sab 11/01/25**	**mar 21/01/25**
76	Scavo a valle fino a q. 376,50 (800 m3)	3 g	sab 11/01/25	mar 14/01/25
77	Chiodature e barre vetroresina (n. 30)	2 g	lun 13/01/25	mar 14/01/25
78	Primi 15 m galleria	4 g	mer 15/01/25	sab 18/01/25
79	Centine galleria	2 g	lun 20/01/25	mar 21/01/25
80	**CALCESTRUZZI IMBOCCO**	**103 g**	**mer 01/01/25**	**mer 30/04/25**
81	**FASE I1: GETTI ZONA DI MONTE**	**45 g**	**mer 01/01/25**	**ven 21/02/25**
82	M1 (da 380 a 384 - 800 m3)	4 g	mer 01/01/25	sab 04/01/25
83	M2 (da 384 a 386 - 800 m3)	4 g	lun 06/01/25	gio 09/01/25
84	M3 (da 386 a 390 - 3.000 m3)	20 g	ven 10/01/25	sab 01/02/25
85	*Innalzamento invaso a q. 384*	*0 g*	*sab 01/02/25*	*sab 01/02/25*
86	M4 (da 390 a 394 - 1.700 m3)	17 g	lun 03/02/25	ven 21/02/25
87	*Innalzamento invaso a q. 388*	*0 g*	*ven 21/02/25*	*ven 21/02/25*
88	**FASE I2: GETTI ZONA DI VALLE**	**28 g**	**mer 22/01/25**	**sab 22/02/25**
89	V1 (platea - 300 m3)	3 g	mer 22/01/25	ven 24/01/25
90	V2 (da 377,50 a 390 - 1.700 m3)	17 g	sab 25/01/25	gio 13/02/25
91	V3 (da 390 a 395 - 750 m3)	8 g	ven 14/02/25	sab 22/02/25
92	**FASE I3: GETTI MURI, PILE, PUNTONE**	**36 g**	**lun 24/02/25**	**sab 05/04/25**
93	L1 (da 395 a 401 - 1.700 m3)	17 g	lun 24/02/25	ven 14/03/25
94	*Innalzamento invaso a q. 393*	*0 g*	*ven 14/03/25*	*ven 14/03/25*
95	L2 (puntone - 150 m3)	8 g	sab 15/03/25	lun 24/03/25
96	L3 (da 401 a 405 - 1.100 m3)	11 g	mar 25/03/25	sab 05/04/25
97	**FASE I4: GETTI SCIVOLO E MURI PROVV.**	**17 g**	**mar 25/03/25**	**sab 12/04/25**
98	S1 (sopra q. 388 - 600 m3)	8 g	mar 25/03/25	mer 02/04/25
99	S2 (muri di protezione - 300 m3)	9 g	gio 03/04/25	sab 12/04/25
100	**FASE I5: GETTI MURI PIAZZALI**	**62 g**	**lun 03/02/25**	**mar 15/04/25**
101	PD1 (destra, fondazione - 110 m3)	2 g	lun 24/02/25	mar 25/02/25
102	PD2 (destra, elevazione - 70 m3)	3 g	lun 07/04/25	mer 09/04/25
103	PS1 (sinistra, micropali - n. 42)	25 g	lun 03/02/25	lun 03/03/25
104	PS2 (sinistra, fondazione - 270 m3)	4 g	mar 04/03/25	ven 07/03/25
105	PS3 (sinistra, elevazione - 360 m3)	8 g	lun 07/04/25	mar 15/04/25
106	**FASE I6: SCHERMO DI IMPERMEABILIZZAZIONE**	**30 g**	**sab 22/02/25**	**ven 28/03/25**
107	Perforazioni sotto soglie sfioro	12 g	sab 22/02/25	ven 07/03/25
108	Iniezioni sotto soglie sfioro	15 g	lun 03/03/25	mer 19/03/25
109	Perforazioni sotto piazzale dx	4 g	sab 08/03/25	mer 12/03/25
110	Iniezioni sotto piazzale dx	3 g	gio 20/03/25	sab 22/03/25
111	Perforazioni sotto piazzale sx	8 g	gio 13/03/25	ven 21/03/25

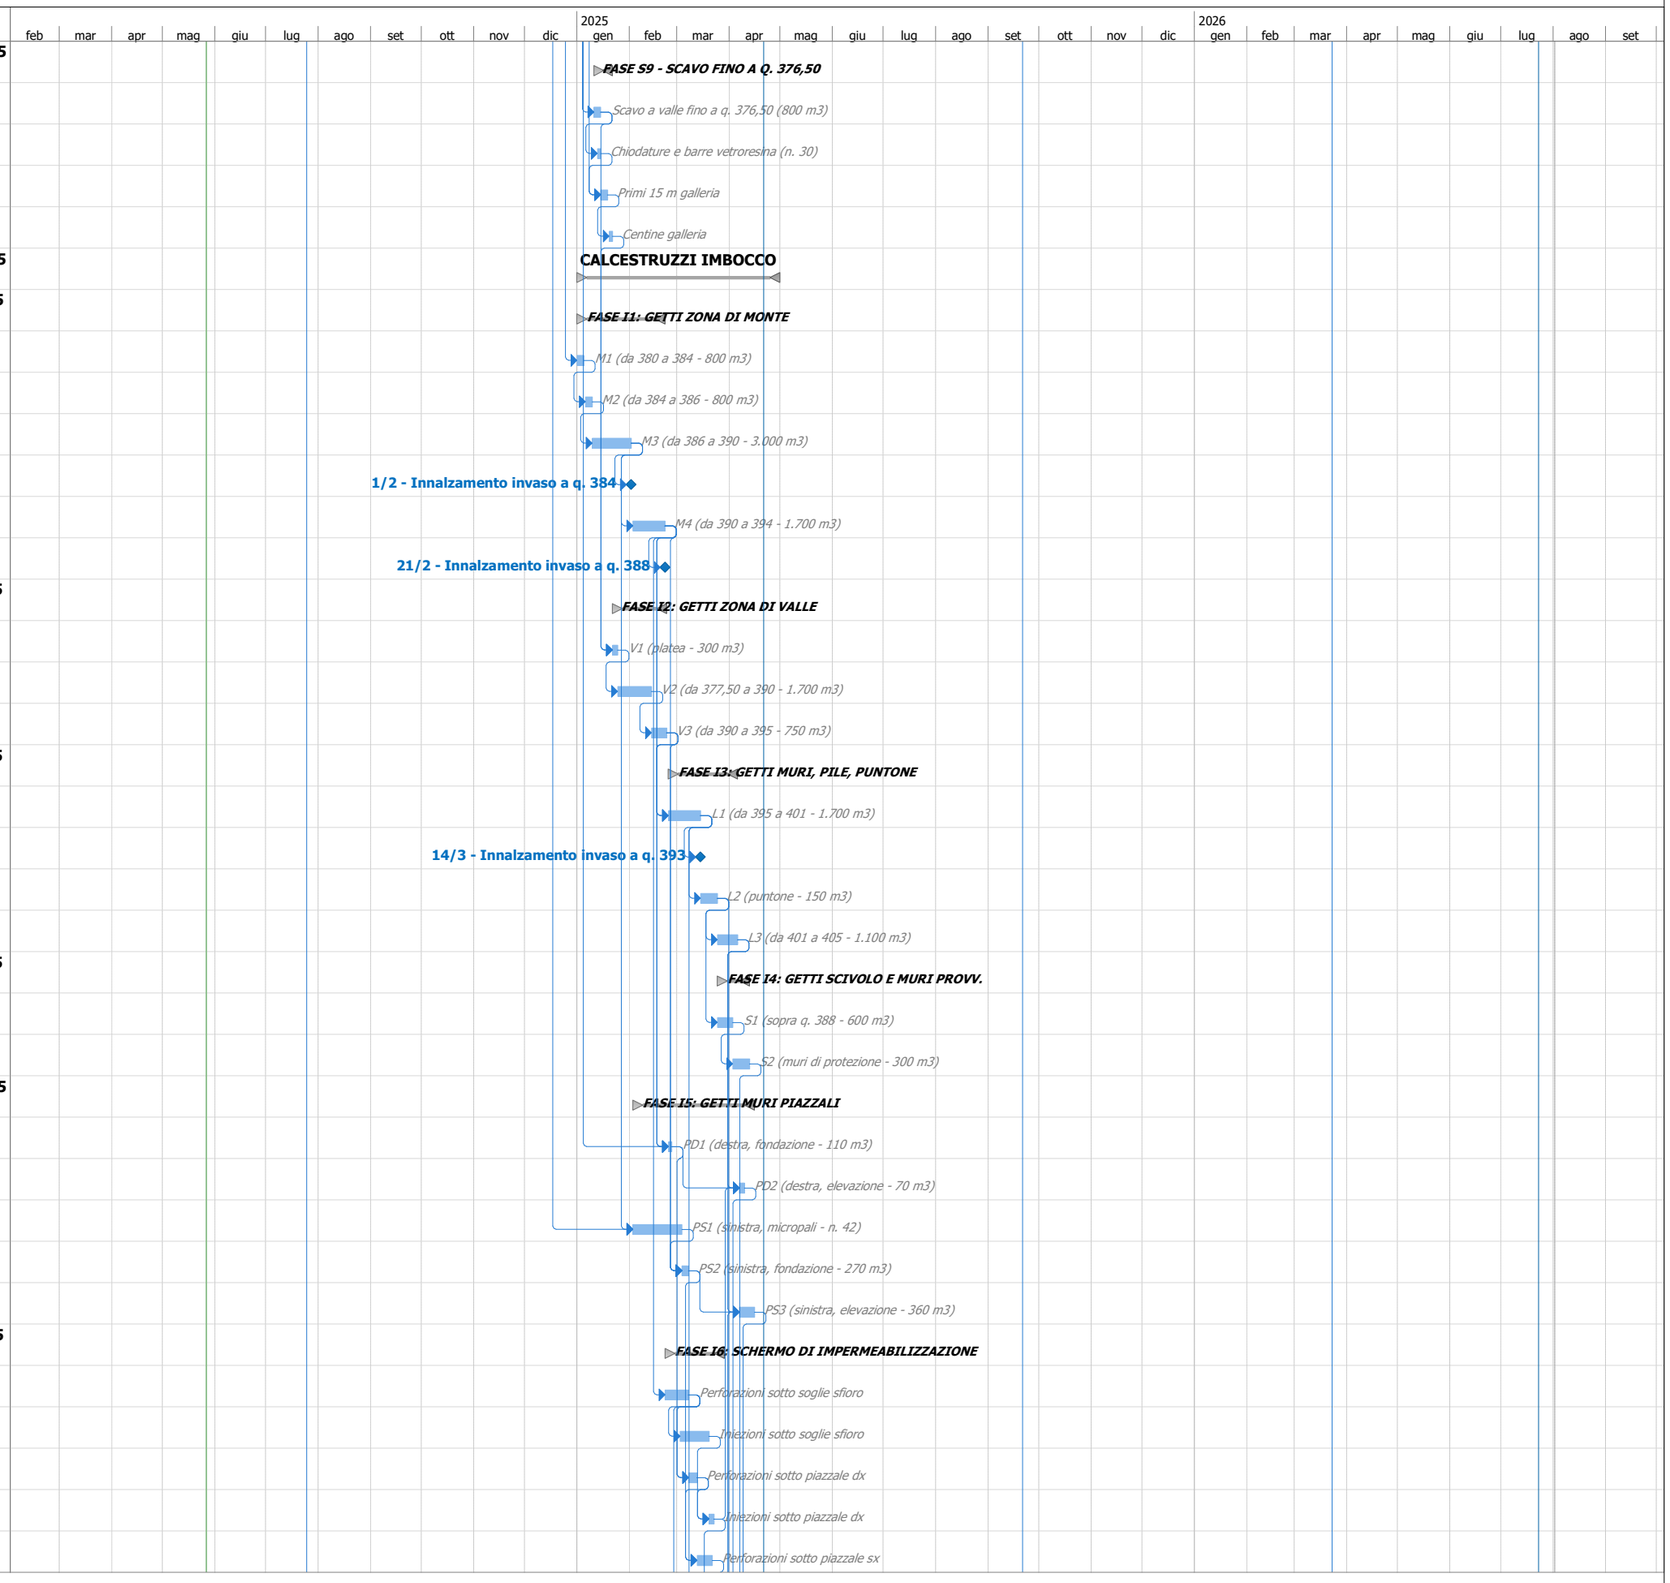

Progetto: Diga di Barcis - Prog
Data: lun 27/05/24

Attività — Cardine — Riepilogo — Avanzamento

DIGA DI BARCIS - SCARICO DI SUPERFICIE AUSILIARIO IN SPONDA SINISTRA

PROGRAMMA DEI LAVORI

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine
112	Iniezioni sotto piazzale sx	5 g	lun 24/03/25	ven 28/03/25
113	**FASE I7: PARATOIE**	**40 g**	**sab 15/03/25**	**mer 30/04/25**
114	Inghisaggio e maturazione parti fisse	20 g	sab 15/03/25	lun 07/04/25
115	Messa in opera diaframmi	15 g	lun 14/04/25	mer 30/04/25
116	**FASE I8: PIAZZALI**	**18 g**	**gio 10/04/25**	**mer 30/04/25**
117	Rinterro piazzale dx	5 g	gio 10/04/25	mar 15/04/25
118	Rinterro piazzale sx	5 g	mer 16/04/25	lun 21/04/25
119	*Invaso senza limitazioni*	*0 g*	*mer 30/04/25*	*mer 30/04/25*
120	**GALLERIA**	**336 g**	**gio 06/03/25**	**mer 01/04/26**
121	Scavo, consolidamenti e prerivestimento fino a progressiva 70	10 g	gio 06/03/25	lun 17/03/25
122	Iniezioni di integrazione schermo diga	8 g	mar 18/03/25	mer 26/03/25
123	Scavo, consolidamenti e prerivestimento da progressiva 70	108 g	gio 27/03/25	mer 30/07/25
124	Getto arco rovescio e maturazione	30 g	lun 27/10/25	sab 29/11/25
125	Getto piedritti e calotta	80 g	lun 01/12/25	mar 03/03/26
126	Tratto a sezione variabile	25 g	mer 04/03/26	mer 01/04/26
127	**MANUFATTO DI RESTITUZIONE**	**365 g**	**gio 01/08/24**	**mar 30/09/25**
128	**Stagione 1**	**52 g**	**gio 01/08/24**	**lun 30/09/24**
129	Disgaggi parete rocciosa	23 g	gio 01/08/24	mar 27/08/24
130	Protezione versante con posa reti e chiodature e costruzione accesso pedonale	7 g	mar 20/08/24	mar 27/08/24
131	Inizio scavo di sbancamento in roccia a fasi alterne con perforazione e inghisaggio barre di collegamento	28 g	gio 29/08/24	lun 30/09/24
132	Smaltimento materiale di scavo	17 g	mer 11/09/24	lun 30/09/24
133	**Stagione 2**	**52 g**	**ven 01/08/25**	**mar 30/09/25**
134	Ultimazione scavo galleria	13 g	ven 01/08/25	ven 15/08/25
135	Ultimazione scavo di sbancamento in roccia a fasi alterne con perforazione e inghisaggio barre di	9 g	ven 15/08/25	lun 25/08/25
136	Smaltimento materiale di scavo	9 g	sab 16/08/25	mar 26/08/25
137	Casseratura, posa ferro e getto manufatto di restituzione	22 g	lun 25/08/25	gio 18/09/25
138	Rivestimento, copertina in C.A. e finiture del manufatto di restituzione	14 g	lun 15/09/25	mar 30/09/25
139	**SISTEMAZIONI FINALI**	**105 g**	**gio 02/04/26**	**sab 01/08/26**
140	*Abbassamento invaso a q. 386*	*0 g*	*gio 02/04/26*	*gio 02/04/26*
141	Demolizione muri provvisionali e relativi ripristini	25 g	gio 02/04/26	gio 30/04/26
142	*Invaso senza limitazioni*	*0 g*	*gio 30/04/26*	*gio 30/04/26*
143	Finiture	78 g	gio 02/04/26	mer 01/07/26
144	Impianti	78 g	gio 02/04/26	mer 01/07/26
145	Completamento lavori	27 g	gio 02/07/26	sab 01/08/26
146	Smobilizzo cantiere	15 g	gio 16/07/26	sab 01/08/26
147	**ULTIMAZIONE LAVORI**	**0 g**	**sab 01/08/26**	**sab 01/08/26**

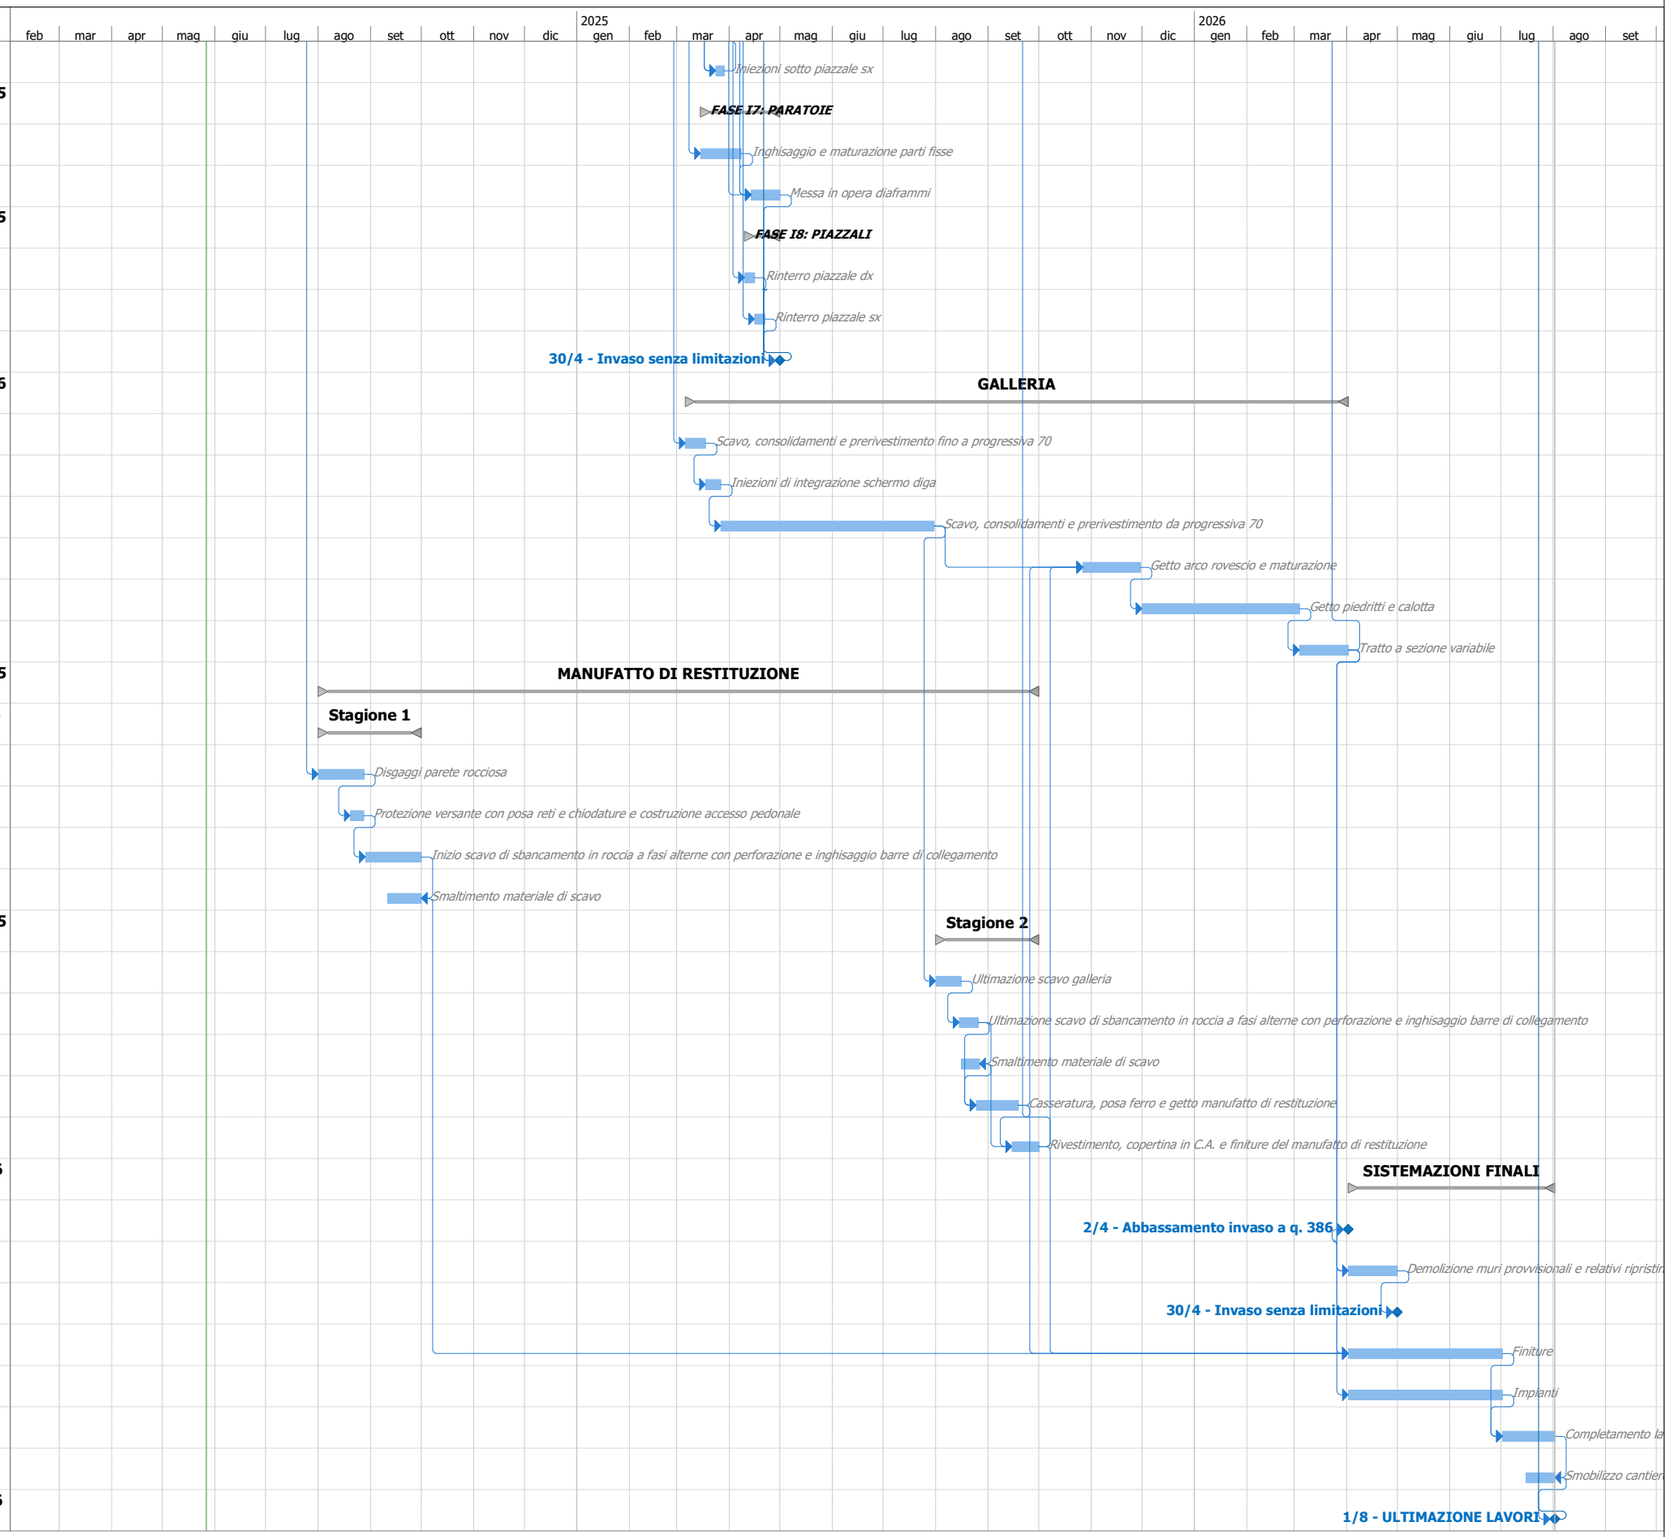

Progetto: Diga di Barcis - Prog
Data: lun 27/05/24

Attività | Cardine | Riepilogo | Avanzamento
