COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ALTA SORVEGLIANZA:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

GENERAL CONTRACTOR:

COCIV
Consorzio Collegamenti Integrati Veloci

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01

TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
PROGETTO ESECUTIVO

CA 20 - CANTIERE OPERATIVO MORIASSI E RADIMERO COP4

PLANIMETRIA CON INDICAZIONE OPERE DI MITIGAZIONE AMBIETALE

GENERAL CONTRACTOR	DIRETTORE LAVORI	SCALA:
Consorzio Cociv Ing. A. Pellicola		1:500

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
I G 5 1	0 0	E	C V	P 8	C A 2 0 B 1	0 1 2	A

PROGETTAZIONE

Rev.	Descrizione emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista Integratore	Data	IL PROGETTISTA
A00	Prima Emissione	COCIV	10/11/2014	COCIV	10/11/2014	A. Palomba	10/11/2014	Dott. Ing. Aldo Maccarella Ordine Ingegneri Prov. TO n. 6271 R

n. Elab.

Nome File: IG51E0VPS0CA2040001A00

CUP: F81H92000000008

Scala di plot: 1:

PART. MURO IN OPERA PER BARRIERA ANTIRUMORE

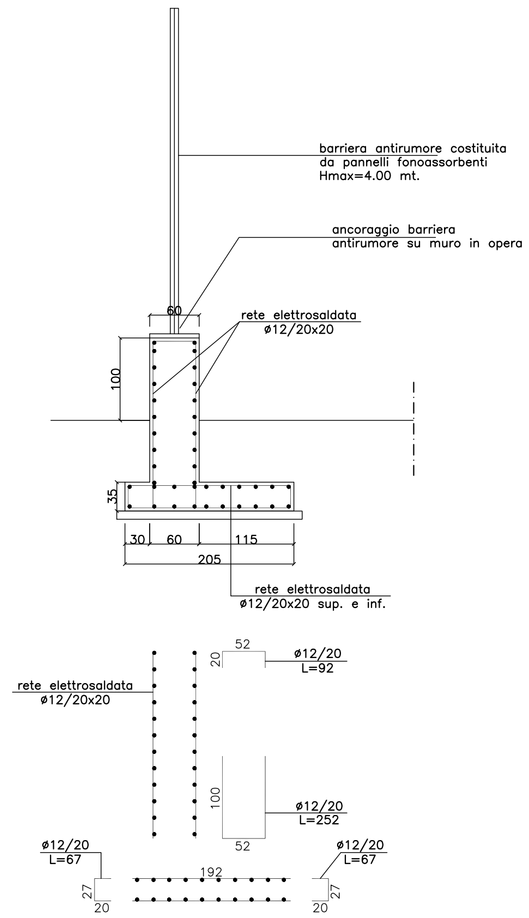

SETTORI CARATTERIZZAZIONE
Installazione di n.1 ugello irrigatore dinamici di abbattimento polveri
raggio: 25 mt.
pressione: 4.00 bar
portata: 300.00 lt./min

RETE ANTIPOLVERE DI ALTEZZA 2 MT

SETTORE CARATTERIZZAZIONE
Confinamento del depositi mediante pannelli prefabbricati di altezza utile 3,00 m per proteggere i cumuli dall'azione erosiva del vento

SETTORI CARATTERIZZAZIONE
Installazione di n.1 ugello irrigatore dinamici di abbattimento polveri
raggio: 25 mt.
pressione: 4.00 bar
portata: 300.00 lt./min

SETTORE STOCCAGGIO INERTI
Confinamento del depositi mediante pannelli prefabbricati di altezza utile 3,00 m per proteggere i cumuli dall'azione erosiva del vento

RETE ANTIPOLVERE DI ALTEZZA 2 MT

RETE ANTIPOLVERE DI ALTEZZA 2 MT

RETE ANTIPOLVERE DI ALTEZZA 2 MT

BARRIERA ACUSTICA DI ALTEZZA 5 MT E LUNGHEZZA CIRCA 195 M

USCITA DEL CANTIERE
Installazione di impianto lavaruote

BARRIERA ACUSTICA DI ALTEZZA 5 MT E LUNGHEZZA CIRCA 97 M

GENOVA

PLANIMETRIA 1:500
