D'APPOLONIA

Nome attività	Durata	Inizio
BRINDISI NORD	**1902 g**	**mer 15/10/03**
Autorizzazioni	**126 g**	**ven 28/11/03**
Presentazione istanza VIA	1 g	ven 28/11/03
Decreto VIA	1 g	gio 01/04/04
CCGT1	**820 g**	**gio 01/04/04**
Assegnazione contratto	0 g	gio 01/04/04
Inizio cantiere	0 g	mar 01/02/05
Fondazioni / opere civili	60 g	mar 01/02/05
Montaggi	296 g	sab 02/04/05
Collaudi e prove	157 g	lun 23/01/06
Marcia commerciale	0 g	sab 01/07/06
CCGT 2	**1062 g**	**mer 01/02/06**
Bando di gara e specifiche	1 g	mer 01/02/06
Assegnazione contratto	0 g	ven 01/09/06
Inizio cantiere	0 g	lun 30/04/07
Fondazioni / opere civili	60 g	lun 30/04/07
Montaggi	402 g	ven 29/06/07
Collaudi e prove	147 g	lun 04/08/08
Marcia commerciale	0 g	dom 28/12/08
SPOSTAMENTO SOTTOSTAZIONE	**475 g**	**mer 15/10/03**
Bando di gara	1 g	mer 15/10/03
Specifiche per offerta	1 g	lun 15/12/03
Assegnazione contratto	0 g	lun 01/03/04
Fornitura	210 g	lun 01/03/04
Inizio cantiere	0 g	dom 26/09/04
Fondazioni / opere civili	120 g	dom 30/05/04
Montaggi	90 g	lun 27/09/04
Collaudi e prove	30 g	dom 26/12/04
Impianto operativo	0 g	mar 01/02/05
CARBONILE E NASTRI CARBONE	**717 g**	**mer 15/10/03**
Bando di gara	1 g	mer 15/10/03
Specifiche per offerta	1 g	lun 15/12/03
Assegnazione contratto	0 g	gio 01/04/04
Ingegneria	90 g	ven 02/04/04
Fornitura materiali	90 g	mar 01/06/04
Inizio cantiere	0 g	dom 29/08/04
Fondazioni / opere civili	90 g	lun 30/08/04
Montaggi	240 g	dom 28/11/04
Collaudi e prove	30 g	mar 26/07/05
Impianto operativo	0 g	sab 01/10/05
MODIFICA DELL'OPERA DI PRESA	**277 g**	**lun 19/09/05**
Assegnazione contratto	0 g	lun 19/09/05
Ingegneria	90 g	lun 19/09/05
Fornitura materiali	90 g	ven 18/11/05
Inizio cantiere	0 g	mer 15/02/06
Scavi / opere civili	90 g	gio 16/02/06
Montaggi	30 g	mer 17/05/06
Collaudi e prove	7 g	ven 16/06/06
Impianto operativo	0 g	gio 22/06/06
Revamping gruppo a carbone 1	**570 g**	**lun 03/07/06**
Assegnazione contratti	0 g	lun 03/07/06
Ingegneria	90 g	lun 03/07/06
Fornitura materiali	90 g	ven 01/09/06
Opere civili	90 g	gio 30/11/06
Montaggio Denox	270 g	mer 28/02/07
Montaggio Desox	300 g	mer 28/02/07
Collaudi e prove	30 g	mar 25/12/07
Impianto operativo	0 g	mer 23/01/08
Smantellamento gruppo carbone 2	**360 g**	**lun 13/02/06**
Smantellamento strutture metalliche	49 g	lun 13/02/06
Rimozione amianto	360 g	lun 13/02/06
Bonifica del terreno	180 g	lun 03/04/06

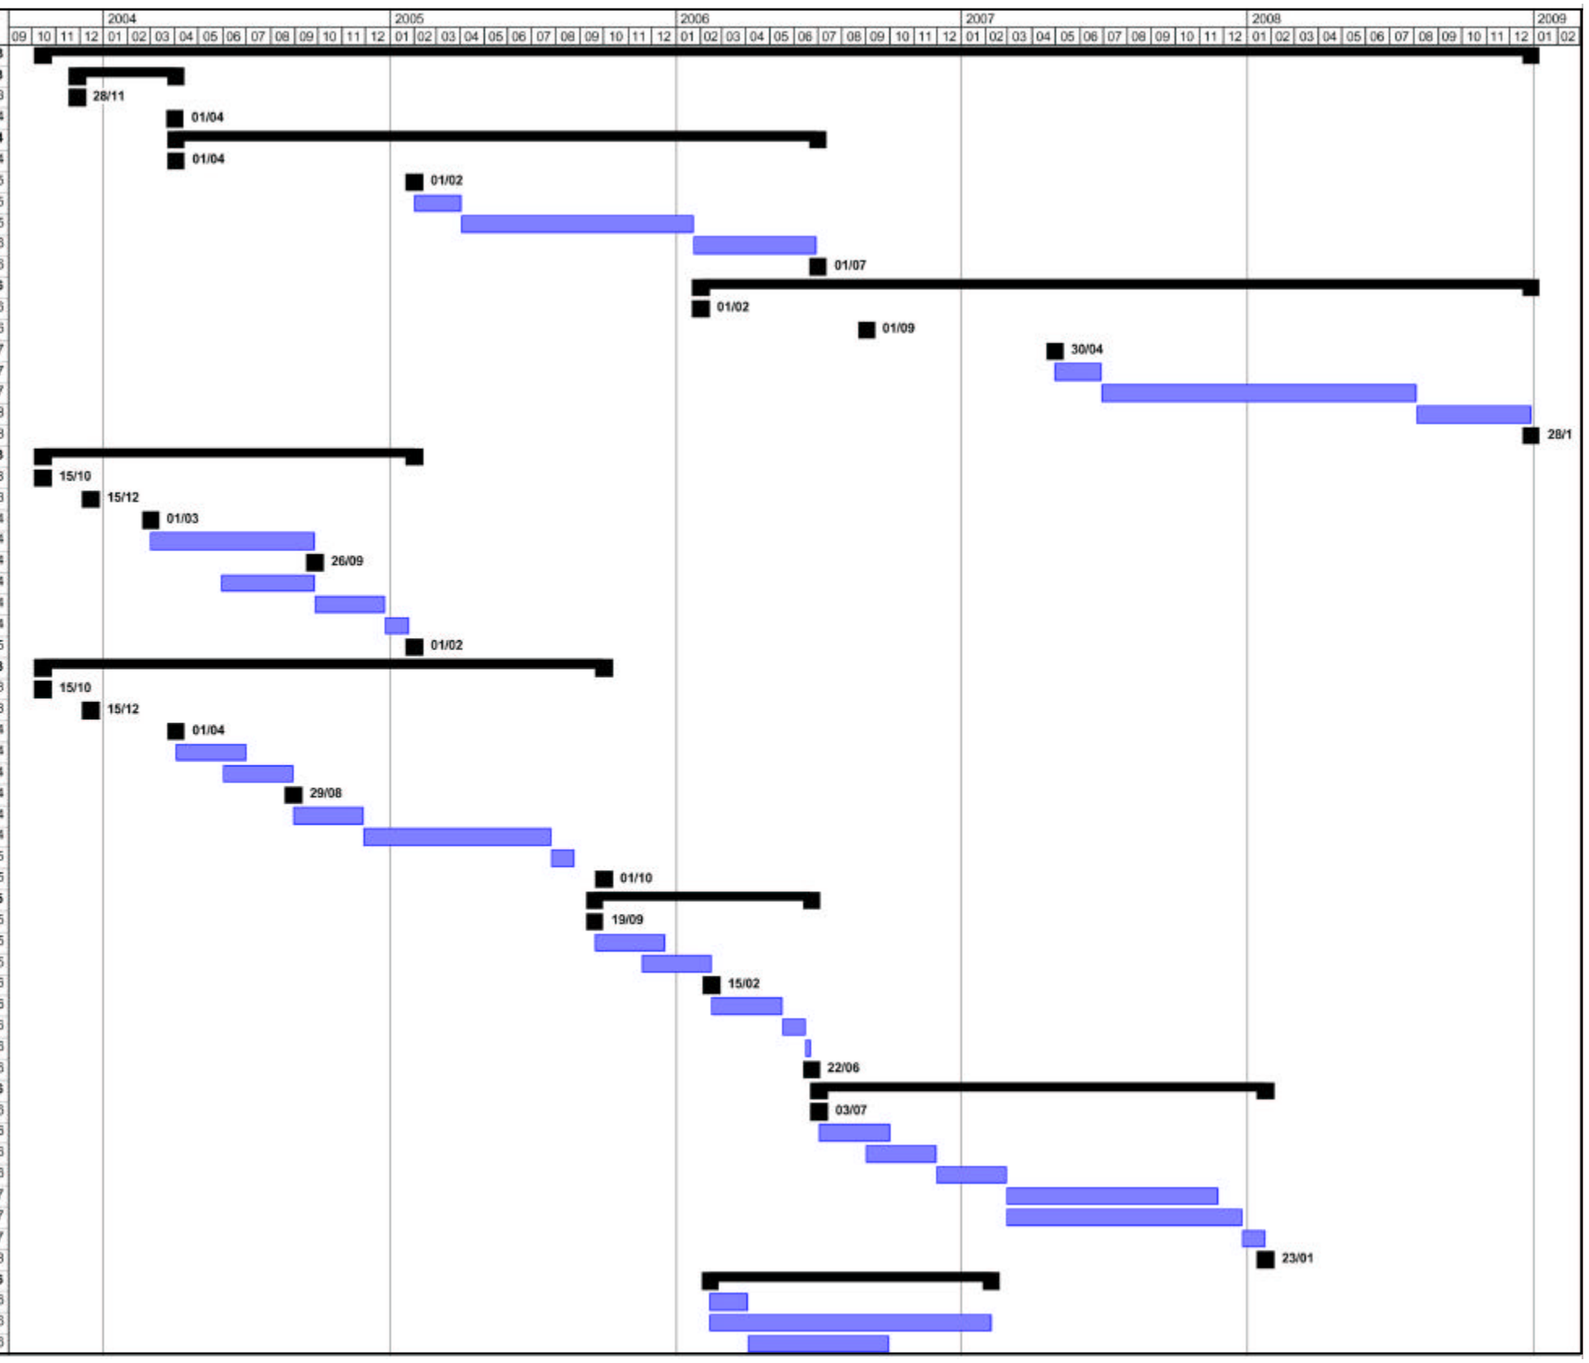

FIGURA 9.1

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
RIPOTENZIAMENTO CTE DI BRINDISI
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

PREPARATO PER

EDIPOWER S.p.A.
MILANO
