TUBAZIONE INTERRATA

SEZIONE SU STRADA BITUMATA 1:10

SEZIONE SU PAVIMENTAZIONE DRENANTE 1:10

IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO

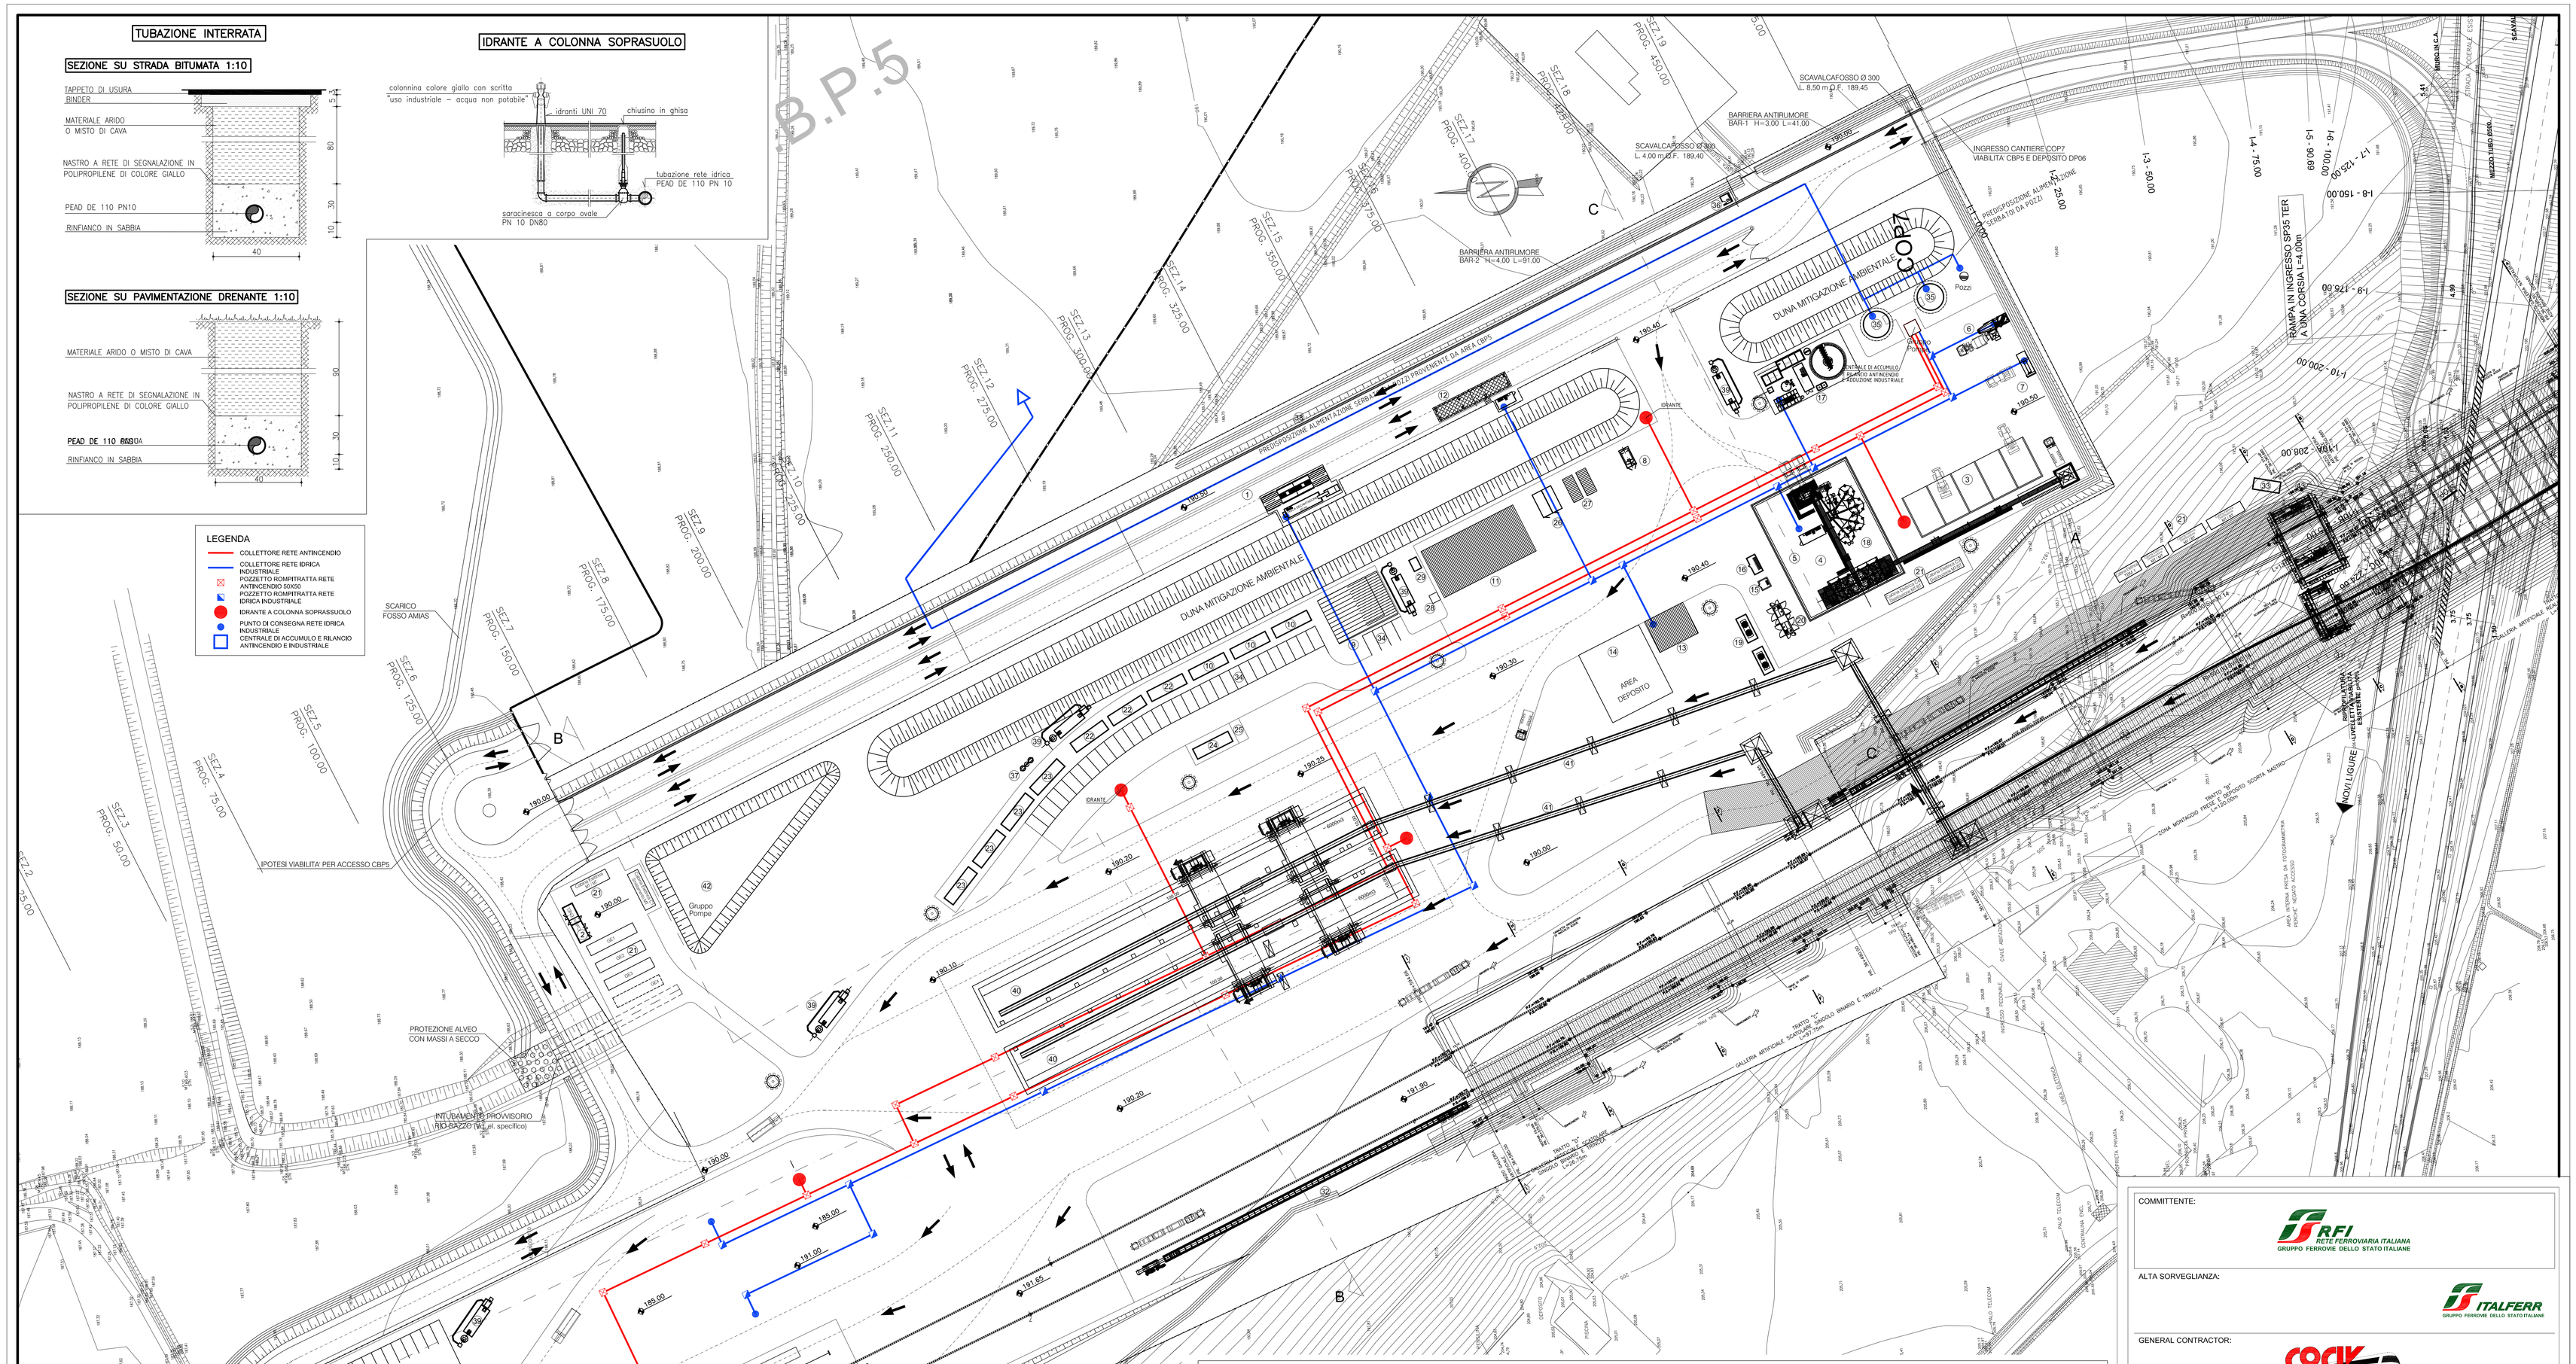

LEGENDA

Pos.	Q.TA'	DESCRIZIONE	MQ.	P.P.	Pos.	Q.TA'	DESCRIZIONE	MQ.	P.P.
①	1	Impianto lavaruote	-	-	㉓	4	Uffici a 1 piani	-	-
②	1	Punto di consegna ENEL	-	-	㉔	1	Locale primo soccorso	-	-
③	1	Area di stoccaggio inerti	-	-	㉕	1	Parcheggio ambulanza	-	-
④	1	Impianto di betonaggio	-	-	㉖	1	Deposito olii usati/nuovi	-	-
⑤	1	Impianto riscaldamento inerti (eventuale)	-	-	㉗	1	Box attrezzature	-	-
⑥	1	Impianto lavaggio autobetoniere	-	-	㉘	1	Compressore officina	-	-
⑦	1	Trattamento acque impianto di betonaggio	-	-	㉙	1	Disoleatore per officina	-	-
⑧	1	Distributore gasolio	-	-	㉚	1	Area stoccaggio conci	-	-
⑨	1	Laboratorio e box provini materiali	-	-	㉛	1	Gru a portale Brunnhuber 35t	-	-
⑩	3	Servizi igienici e docce	-	-	㉜	2	Magazzino nastro (Capacità 500 ml.)	-	-
⑪	1	Officina	-	-	㉝	2	Impianto ventilazione e container inverter	-	-
⑫	1	Pesa a raso L= 18m e cabina operatore	-	-	㉞	50	Parcheggi	-	-
⑬	1	Magazzino	-	-	㉟	2	Serbatoio antincendio+acqua industriale completo di gruppo di pompaggio	-	-
⑭	1	Area deposito magazzino	-	-	㊱	1	Guardiania	-	-
⑮	1	Deposito bombole acetilene	-	-	㊲	1	Fossa biologica imoff	-	-
⑯	1	Deposito bombole ossigeno	-	-	㊳	1	Barriere antirumore (eventuali)	-	-
⑰	1	Impianto trattamento acque di galleria	-	-	㊴	5	Vasche di prima pioggia	-	-
⑱	1	Serbatoio additivo	-	-	㊵	2	Vasche di smarino capacità = 6000mc	-	-
⑲	2	Torri evaporative	-	-	㊶	2	Nastri di smarino	-	-
⑳	1	Gruppo elettrocompressori con serbatoi A.C. (Pmax.12 bar)	-	-	㊷	1	Vasca di laminazione	-	-
㉑	9+1	Cabine di trasformazione e gruppi elettrogeni	-	-	㊸	1	Gru a portale 80+80 t s= 11.50 m (nuova)	-	-
㉒	3	Spogliatoi	-	-	←		Percorso smarino su nastro trasportatore		
					○		Torre faro H. 20m proiettori asimmetrici 1000W		

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ALTA SORVEGLIANZA:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

GENERAL CONTRACTOR:

Consorzio Cooperativo Costruzioni Integrati Veloci

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01

TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
PROGETTO ESECUTIVO

CAMPO NOVI LIGURE COP7

PLANIMETRIA RETA ANTINCENDIO/INDUSTRIALE
E PARTICOLARI

GENERAL CONTRACTOR	DIRETTORE LAVORI	SCALA:
Consorzio Cociv, Ing. E. Pagani		VARIE

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
I G 5 1	0 0	E	C V	A Z	C A 2 3 0 1	0 0 3	B

PROGETTAZIONE								
Rev.	Descrizione emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista Integratore	Data	IL PROGETTISTA
A00	Prima Emissione	COCIV	29/10/2014	COCIV	29/10/2014	A. Palomba	31/10/2014	
B00	Revisione generale	COCIV	08/07/2015	COCIV	08/07/2015	A. Mancarella	08/07/2015	Dott. Ing. Alessandro Mancarella Ordine degli Ingegneri Prov. TO n. 6271 R

n. Elab.	Nome File: IS1A0C0D0000H0048
	CUP: F81H92000000008

Scala di plot: 1: 1
