Figura 2.b **Cronoprogramma opere civili piazzale e strade di accesso**
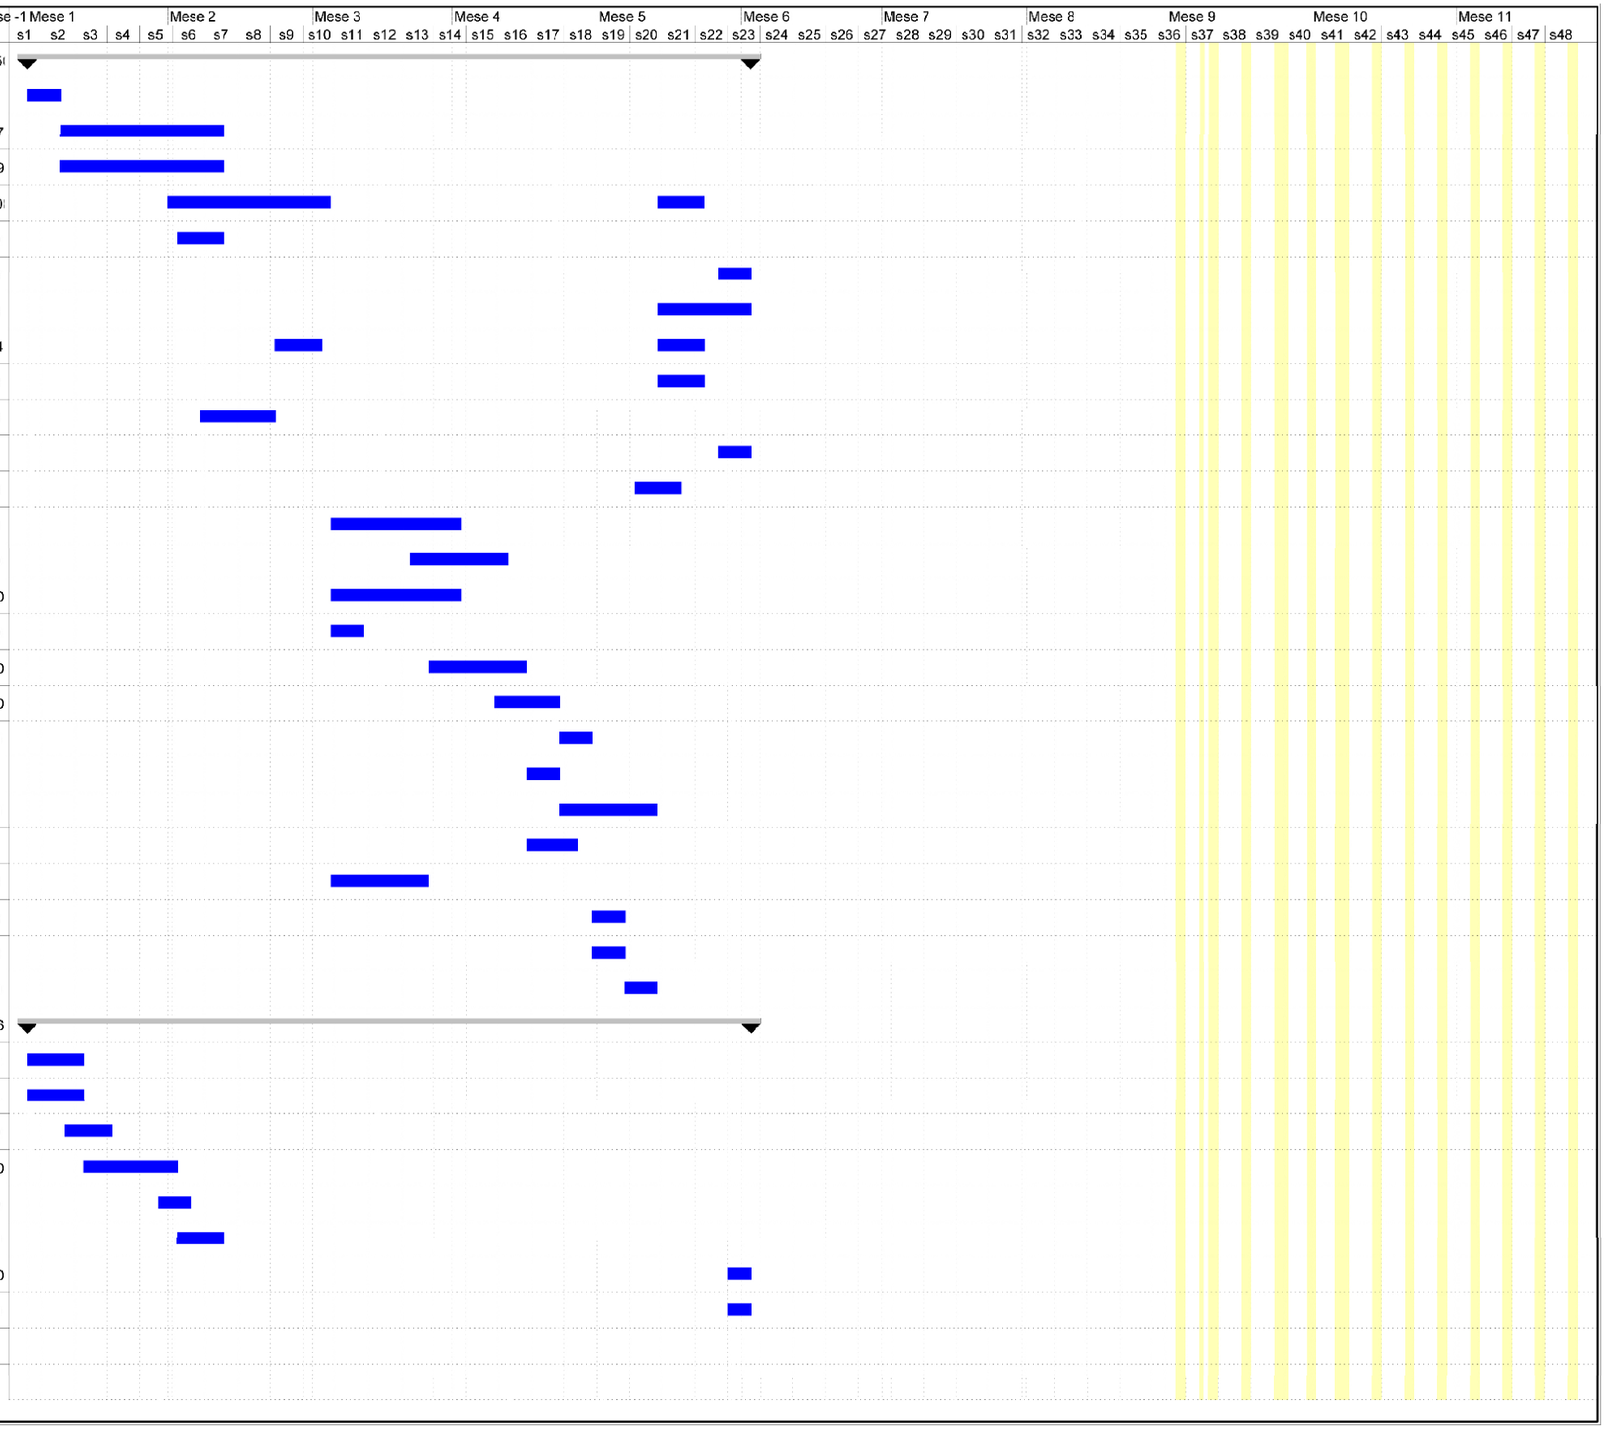
ID	Nome attività	Durata	Importo
1	PIAZZALE DI PERFORAZIONE GG-3	155 g	´989´668,5
2	Allestimento Cantiere	7 g	0,00
3	Scavi e sistemazione rilevato	35 g	665´065,47
4	Trasporto materiale di risulta	35 g	216´786,39
5	Drenaggio e Impermeabilizzazione	45 g	´016´700,0
6	Gabbionate di contenimento	10 g	70´126,00
7	Idrosemina delle scarpate	7 g	17´488,50
8	Recinzione e cancelli metallici	20 g	76´282,40
9	Pavimentazione in misto stabilizzato	20 g	184´241,14
10	Pavimentazione in ghiaietto	10 g	47´279,60
11	Fosso di guardia + canalette	16 g	50´375,00
12	Staccionata in legno	7 g	8´920,00
13	Opere varie di mitigazione	10 g	20´000,00
14	Vasca corral, vasca fango	28 g	55´650,00
15	Vasca carburanti	21 g	50´000,00
16	Cantina in c.a. e basamento RIG	28 g	100´500,00
17	Perforazione e posa in opera di tubo guida	7 g	11´500,00
18	Piattaforme di lavorazione in cls	21 g	109´760,00
19	Canalette con grigliato metallico	14 g	125´400,00
20	Basamento per termocombustori	7 g	15´600,00
21	Basamento per per torre faro	7 g	5´880,00
22	Basamento per Area Campo	21 g	30´000,00
23	Basamenti per prodotti chimici	11 g	3´150,00
24	Vasca di raccolta acqua di perforazione	21 g	40´150,00
25	Attraversamenti casing 9 5/8"	7 g	13´000,00
26	Impianto di messa a terra	7 g	40´814,00
27	Impianto di smaltimento acque nere	7 g	15´000,00
28	SISTEMAZIONE STRADE DI ACCESSO	155 g	531´529,16
29	Scavi e rilevati	12 g	28´342,52
30	Trasporto materiale da risulta	12 g	16´078,34
31	Gabbionate di contenimento	10 g	60´000,00
32	Cunette, zanelle e sist. fossi	20 g	163´150,00
33	Tombini stradali	7 g	20´000,00
34	Fondazione in misto stabilizzato	10 g	59´965,80
35	Pavime. stradale (Bynder e tappetino)	5 g	167´992,50
36	Segnaletica stradale	5 g	16´000,00
