Allegato C13

# Cronoprogramma

| ID | WBS | Nome attività | Inizio | Fine | Azione a cura | % ompletamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **1** | **INTERCONNESSIONE RETI FUEL GAS N/S - P.12/191** | **gio 31/05/12** | **ven 20/12/13** | | **93%** |
| 2 | 1.1 | **APERTURA COMMESSA A SAP** | mar 10/07/12 | mar 10/07/12 | SVILRAF | 100% |
| 3 | **1.2** | **INGEGNERIA + DOC. PERMITTING** | **gio 31/05/12** | **ven 06/09/13** | | **100%** |
| 4 | 1.2.1 | INGEGNERIA MR CHIAVI IN MANO GRUPPO DI ESSICCAMENTO | gio 31/05/12 | mar 31/07/12 | NCOSTR | 100% |
| 5 | 1.2.2 | INGEGNERIA PRO T/A N/S | lun 03/09/12 | lun 04/02/13 | PPC | 100% |
| 6 | 1.2.3 | INGEGNERIA DI DETTAGLIO N/S | lun 10/09/12 | ven 29/03/13 | PPC | 100% |
| 7 | 1.2.4 | PERMITTING N/S | lun 18/02/13 | ven 06/09/13 | COMART-T | 100% |
| 8 | 1.2.5 | EMISSIONE MR, MTO | lun 01/10/12 | ven 10/05/13 | PPC | 100% |
| 9 | **1.3** | **PROCUREMENT MATERIALI ED APPARECCHIATURE** | **mer 01/08/12** | **ven 29/11/13** | **NCOSTR** | **93%** |
| 10 | **1.3.1** | **CHIAVI IN MANO GRUPPO DI ESSICCAMENTO** | **mer 01/08/12** | **lun 12/08/13** | | **100%** |
| 11 | 1.3.1.1 | EMISSIONE MR PER GARA | mer 01/08/12 | mar 30/10/12 | NCOSTR | 100% |
| 12 | 1.3.1.2 | Procurement (FINO AD ARRIVO C/O RAFFINERIA) | mer 24/10/12 | lun 12/08/13 | ACQUISTI | 100% |
| 13 | **1.3.2** | **MATERIALI - APPARECCHIATURE (MECC. +STR.+ PIPING)** | lun 05/11/12 | ven 30/08/13 | NCOSTR + ACQUISTI | 80% |
| 14 | 1.3.2.1 | MATERIALI PRO T/A N/S | lun 26/11/12 | ven 08/03/13 | NCOSTR + | 100% |
| 15 | 1.3.2.3 | MATERIALI NORD | lun 28/01/13 | ven 05/07/13 | NCOSTR + | 100% |
| 16 | 1.3.2.4 | MATERIALI SUD | lun 28/01/13 | ven 29/11/13 | NCOSTR + | 90% |
| 17 | 1.3.2.5 | GRUPPO DI ESSICCAMENTO construction scopo COMART | mar 23/04/13 | ven 30/08/13 | NCOSTR | 100% |
| 18 | **1.4** | **COSTRUZIONE** | **lun 11/03/13** | **lun 09/12/13** | **NCOSTR** | **84%** |
| 19 | 1.4.1 | ASS. LAVORI MAIN CONTRACTOR | ven 22/03/13 | gio 30/05/13 | NCOSTR | 100% |
| 20 | 1.4.2 | TIE-INS T/A 2013 NORD | lun 11/03/13 | ven 29/03/13 | NCOSTR | 100% |
| 21 | 1.4.3 | TIE-INS T/A 2013 SUD | lun 11/03/13 | ven 29/03/13 | NCOSTR | 100% |
| 22 | 1.4.4 | INTERCONNESSIONE NORD | ven 31/05/13 | mar 26/11/13 | NCOSTR | 80% |
| 23 | 1.4.5 | INTERCONNESSIONE SUD | ven 31/05/13 | mar 26/11/13 | NCOSTR | 80% |
| 24 | 1.4.6 | ASSEMBLAGGIO GRUPPO DI ESSICCAMENTO | mar 03/09/13 | mar 22/10/13 | COMART | 100% |
| 25 | 1.4.5 | Mechanical Completion | mer 27/11/13 | mer 27/11/13 | | 0% |
| 26 | 1.4.8 | Preocommissioning | gio 28/11/13 | lun 09/12/13 | NCOS+ESE | 0% |
| 27 | 1.5 | **COLLAUDO ISTITUZIONALE EX ART 48** | mar 10/12/13 | mer 11/12/13 | NCOSTR + RELIST | 0% |
| 28 | **1.6** | **COMMISSIONING** | gio 12/12/13 | gio 19/12/13 | ESERCIZIC | 0% |
| 29 | **1.7** | **START UP** | ven 20/12/13 | ven 20/12/13 | ESERCIZIC | 0% |

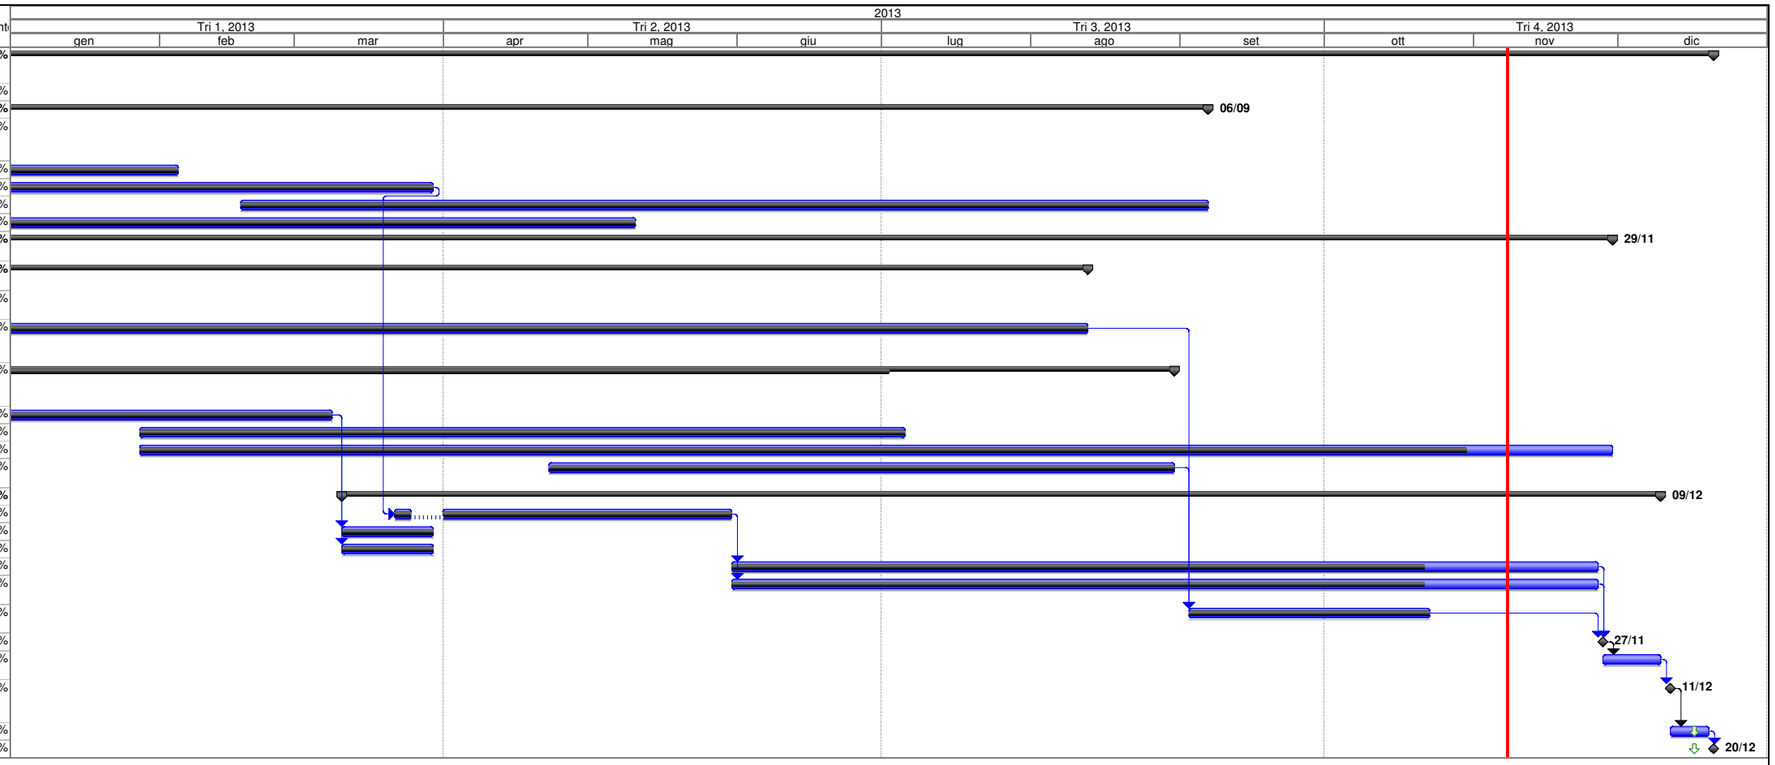


Progetto: INTERCONN. RETI FUEL
Data: ven 08/11/13

Attività | Divisione | Avanzamento | Cardine | Riepilogo | Riepilogo progetto | Attività esterne | Cardine esterno | Scadenza
