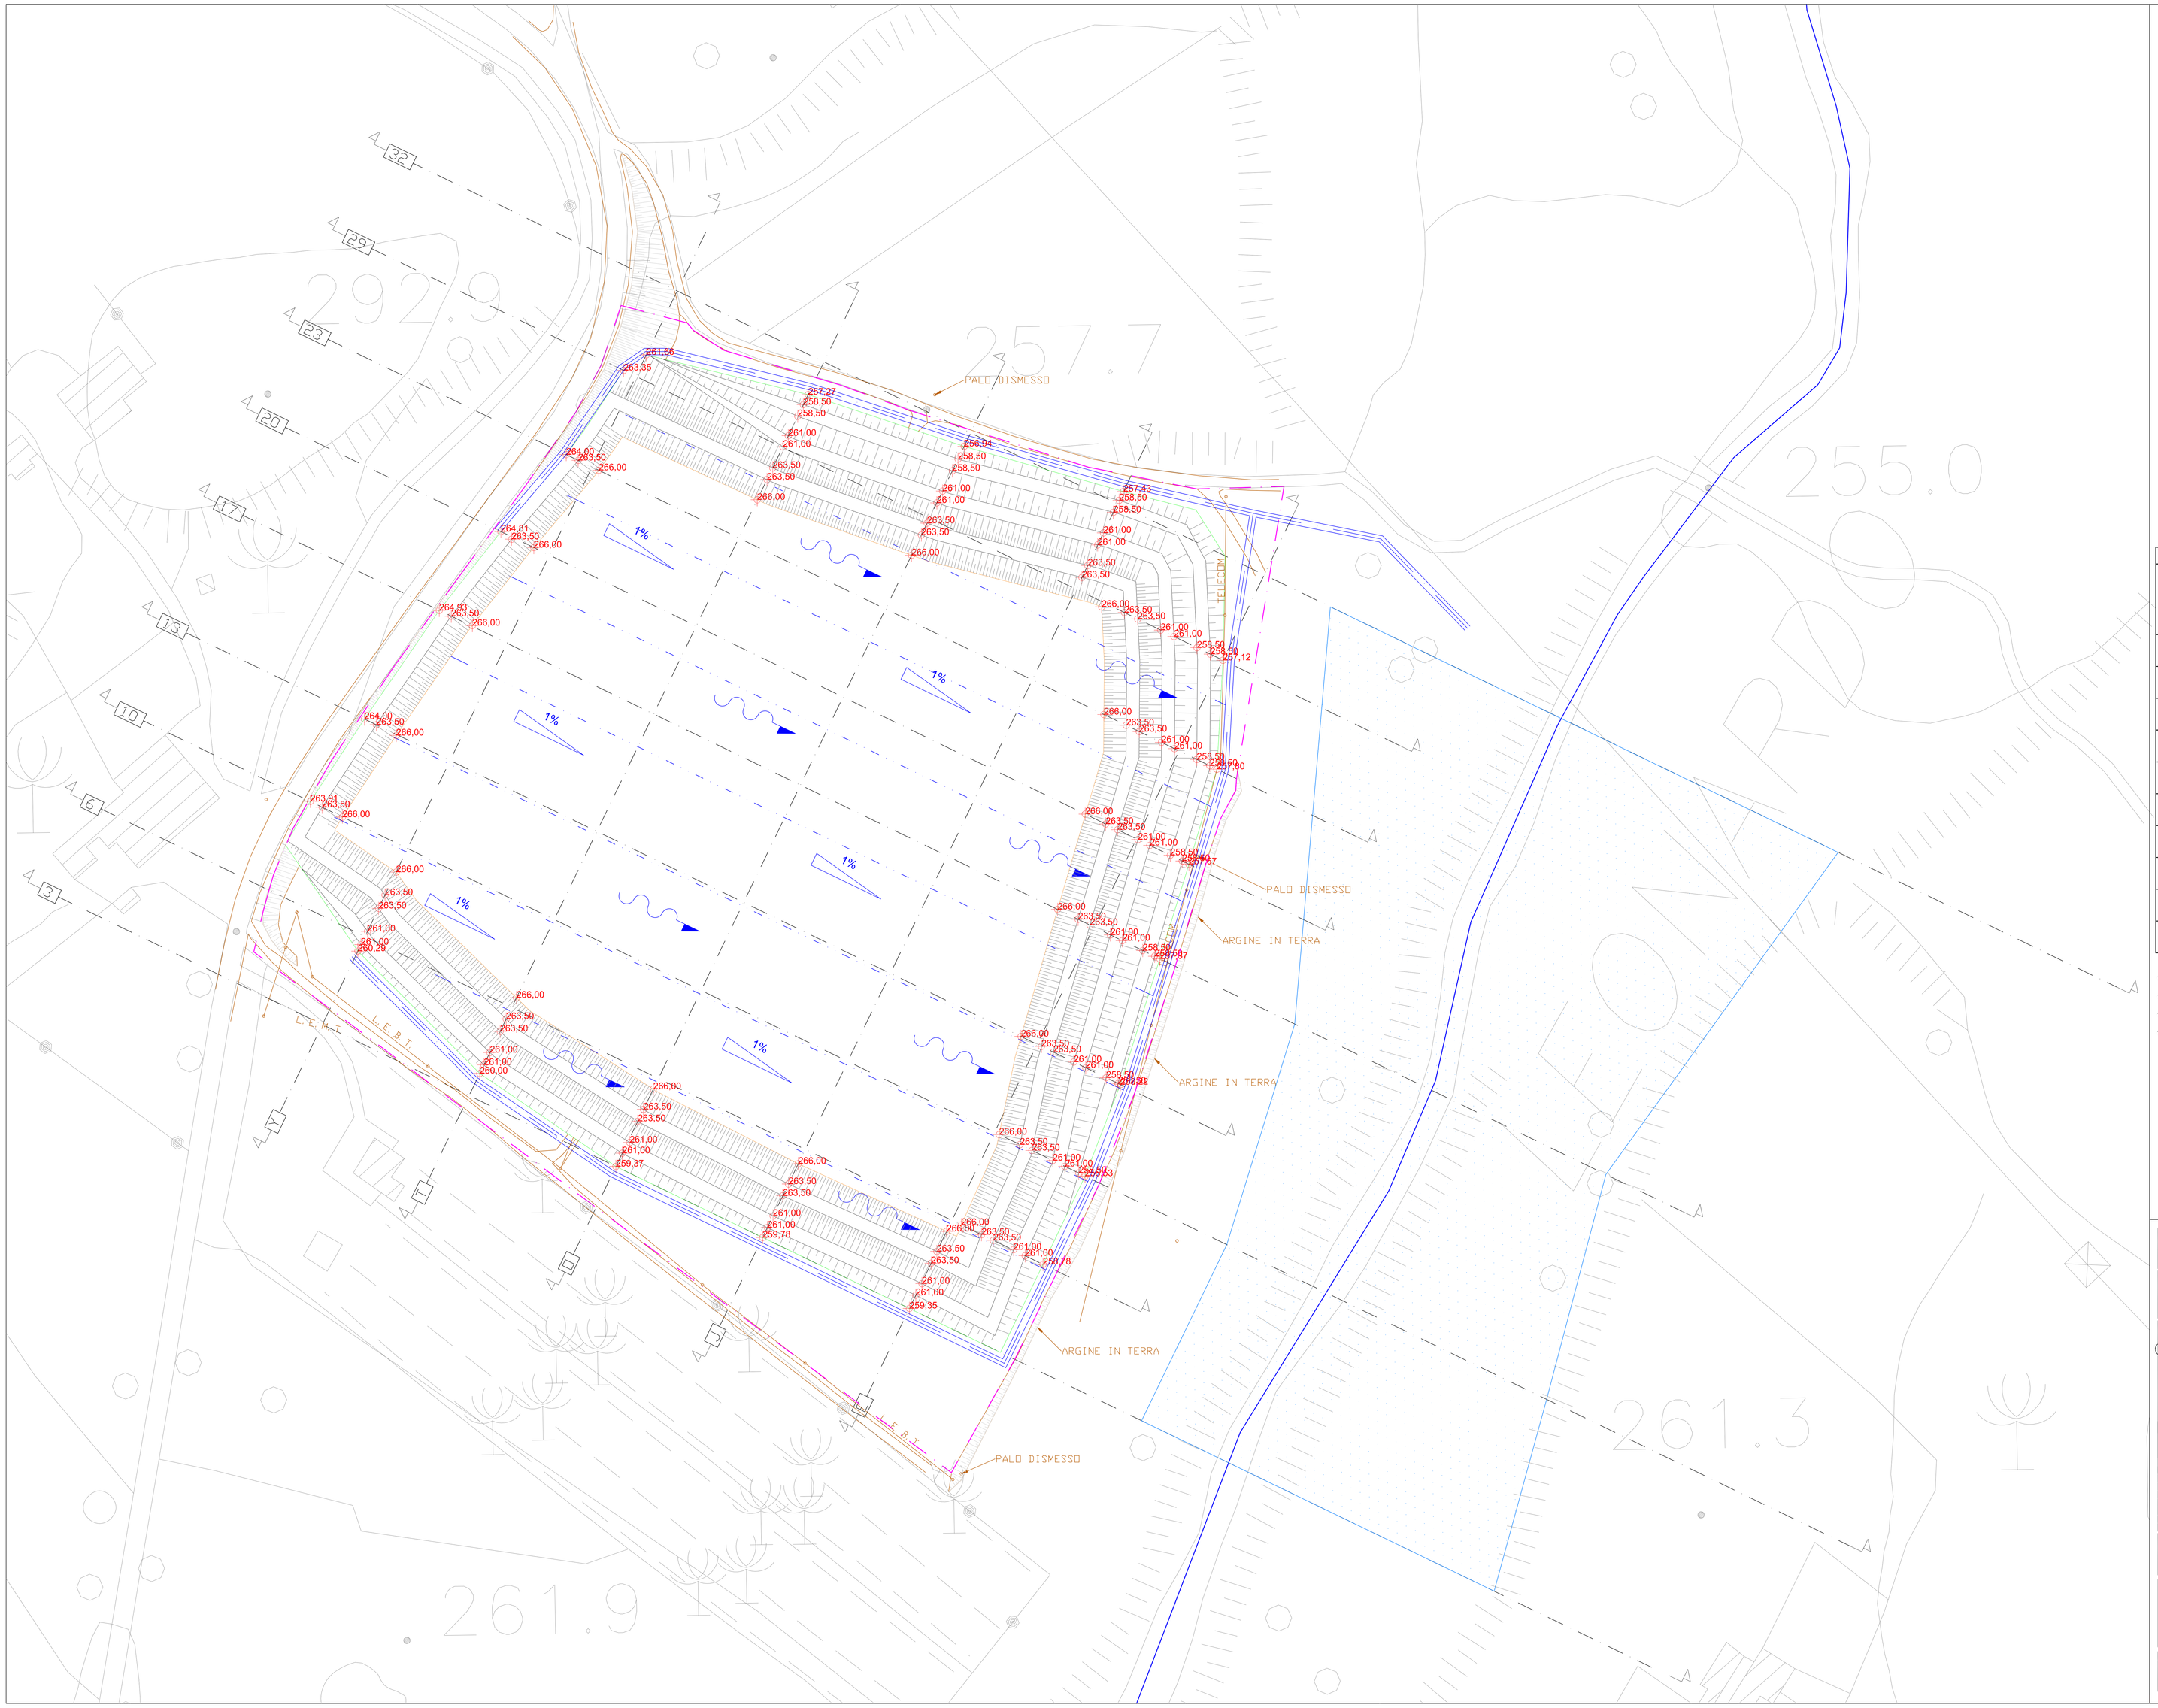

LEGENDA

- LIMITE AMMINISTRATIVO AREA OCCUPATA
- AREE SOGGETTE AD ESONDAZIONE
- PRINCIPALI CORSI D'ACQUA
- TRACCIA DELLE SEZIONI
- PIEDE DEL RILEVATO DI PROGETTO
- CAMBI DI PENDENZA DELLE BANCHE DEL RILEVATO DI PROGETTO
- TESTA DEL RILEVATO DI PROGETTO
- GEOTESSUDO DRENANTE s=30 cm INTERASSE = 30 m ALLE BASE DEL RILEVATO
- OPERE IDRAULICHE - CANALETTA PREFABBRICATA IN CLS
- 261. 775 QUOTATURA DEL RILEVATO DI PROGETTO

CALCOLO DEI VOLUMI DI TERRENO

AREA CP5				
Numero Sezione	Area della sezione i (Si) [m²]	Area media tra le sezioni i ed i+1 Sm = (Si+Si+1)/2 [m²]	Distanza tra le sezioni i ed i+1 (D) [m]	Volume medio tra le sezioni i ed i+1 Vm = Sm x D [m³]
Start	0,00			
		550,07	30,00	16502,10
6	1100,14			
		1424,485	30,00	42734,55
10	1748,83			
		1754,89	30,00	52646,70
13	1760,95			
		1879,56	40,00	75182,40
17	1998,17			
		1992,41	30,00	59772,30
20	1986,65			
		1850,065	30,00	55501,95
23	1713,48			
		1602,945	31,00	49691,30
29	1492,41			
		790,275	29,00	22917,98
32	88,14			
		44,07	8,77	386,49
End	0,00			

Volume rilevato temporaneo esistente (V1)	-	m^3
Volume di terre ancora da conferire (V2)	**375 335,76**	m^3
Volume terreno di scotico superficiale (V3)	**28 413,50**	m^3
Volume totale rilevato (V4)=(V1)+(V2)+(V3)	**403 749,26**	m^3

SCALA 1:500

ANAS S.p.A.
DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA

PA17/08
Affidamento a Contraente Generale dei "Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara F/ddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi raccordi con le attuali SS n.189 e SS n.121

Bolognetta S.c.p.a.

Consorzio Stabile Consorzio Stabile Ing. Pietro Pizzarotti & C. S.p.A.
Il Responsabile Ambientale: Dott. Massimo Frangiello

- PERIZIA DI VARIANTE -

CANTIERIZZAZIONE E GESTIONE MATERIE
Variante al piano di gestione delle terre e rocce da scavo e progettazione di n. 4 nuovi siti di deposito definitivo in ottemperanza alla prescrizione n. 2 della determina direttoriale del MATTM - Prot. DVA.REGISTRO DECRETI.R.0000001 del 08/01/2018
AREA CP5
Planimetria di progetto

Codice Unico Progetto (CUP) : F41B03000230001

Codice elaborato: PA17/08	OPERA	ARGOMENTO	DOC. E PROG.	FASE	REVISIONE
	P V	C A	X 0 2 0	5	0

CARTELLA:	11 -	FILE NAME: PVCA0020_00_4137	NOTE: 1=1	PROT: 4 1 3 7	SCALA:

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
4					
3					
2					
1					
0	PRIMA EMISSIONE	Maggio 2018	G. Anselmo	S. Fortino	D. Trovo

Progettisti :

Il Progettista Responsabile Ing. Gianluca Connesi	Il Geologo Dott. Geologo Stefano Nicolosi	Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione Ing. Francesco Cocciarde	Il Direttore dei Lavori Ing. Sandro Favero
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania Ing. Gianluca Connesi Sez. A Settore Civile e Ambientale N. 5237	Ordine dei Geologi della Sicilia Dott. Geologo Stefano Nicolosi Sez. A N. 577	Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione Ing. Francesco Cocciarde	Il Direttore dei Lavori Ing. Sandro Favero

ANAS S.p.A.

DATA:	PROTOCOLLO:	VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
CODICE PROGETTO	L0 4 1 0 C E 1 1 0 1	Dott. Ing. Ettore de Cesbron de la Grennelais
