bruno teodoro

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

ID	Nome attività	Durata
1	**Completamento del molo di sottoflutto Del Porto di Termini Imerese (PA) - PROGETTO ESECUTIVO GENERALE**	**846 g**
2	**FASE 1**	**380 g**
3	Accantieramento	30 g
4	Salpamento dei massi artificiali della mantellata della diga esistente	20 g
5	Demolizione del massiccio e del muro paraonde in corrispondenza della progr. 55,00 m e della progr. 532,00	15 g
6	Intervento di Vibroflottazione da mare dalla progr. 260 alla progr. 570 della diga di sottoflutto	45 g
7	Costruzione dei Cassoni cellulari in c.a.	330 g
8	Realizzazione della chiusura in pali di fondazione tra la prog. 0,00 e la prog. 260,00 e cordolo di testata	150 g
9	**FASE 2**	**285 g**
10	Realizzazione dell'opera di chiusura a difesa del piazzale da prog. 260,00 a 570,00 m	90 g
11	Dragaggio e Refluimento del materiale nella colmata che costiuirà il piazzale commerciale	90 g
12	Intervento di Vibroflottazione dei fondali di fondazione dei primi cassoni cellulari in c.a.	40 g
13	**FASE 3**	**110 g**
14	Intervento di vibroflottazione in avanzamento da terra sulla colmata fino a raggiungere la profondità di -4,00 m dal fondale preesistente 1 PARTE	30 g
15	Realizzazione dello scanno di imbasamento in pietrame, trasporto e posa dei primi cassoni cellulari	80 g
16	Intervento di vibroflottazione da mare del secondo tratto dei fondali fino a raggiungere la profondità -8,0 m a partire dalla quota fondale dragato	30 g
17	**FASE 4**	**681 g**
18	Realizzazione intervento di vibroflottazione in avanzamento da terra della seonda parte della colmata fino a raggiungere la profondità di - 4,00 m dal fondale preesistente 2 PARTE	30 g
19	Riempimento del piazzale commerciale	30 g
20	Precarica itinerante mediante la posa di massi cubici provenienti dal salpamento della diga esistente sulla colmata	50 g
21	Demolizione muro paraonde e e realizzazione della rampa di collegamento alla banchina	10 g
22	Intervento di vibroflottazione da mare del restante tratto del prolungamento del sottoflutto dei fondali fino a raggiungere la profondità di - 8,00 m a partire dalla quota del fondale dragato	21 g
23	Realizzazione dello scanno di imbasamento in pietrame nel secondo tratto, trasporto e posa in opera dei cassoni cellulari e realizzazione della zona di raccordo mediante pali secanti CFA	150 g
24	Riempimento Cassoni	120 g
25	Realizzazione Piazzale integrativo	280 g
26	Salpamento degli scogli della banchina turistica e spostamento in corrispondenza dell'opera provvisionale e della futura opera di chiusura a difesa del piazzale commerciale	15 g
27	Prefabbricazione massi per rifiorimento diga di sottoflutto	150 g
28	Intervento di vibroflottazione dei fondali di fondazione della banchina turistica	30 g
29	Prefabbricazione massi in cemento per la banchina turistica	120 g
30	Posa delle pile di massi e rinfianco in pietrame per la banchina turistica	120 g
31	**FASE 5**	**150 g**
32	Realizzazione del massiccio e del muro paraonde da prog. 260,00 a 570,00 m	60 g
33	Realizzazione delle opere impiantistiche e della pavimentazione	30 g
34	Rifiorimento della diga di sottoflutto con massi naturali ed artificiali	30 g
35	Posa in Opera arredi di banchina	30 g
36	disimpianto aree di cantiere	30 g

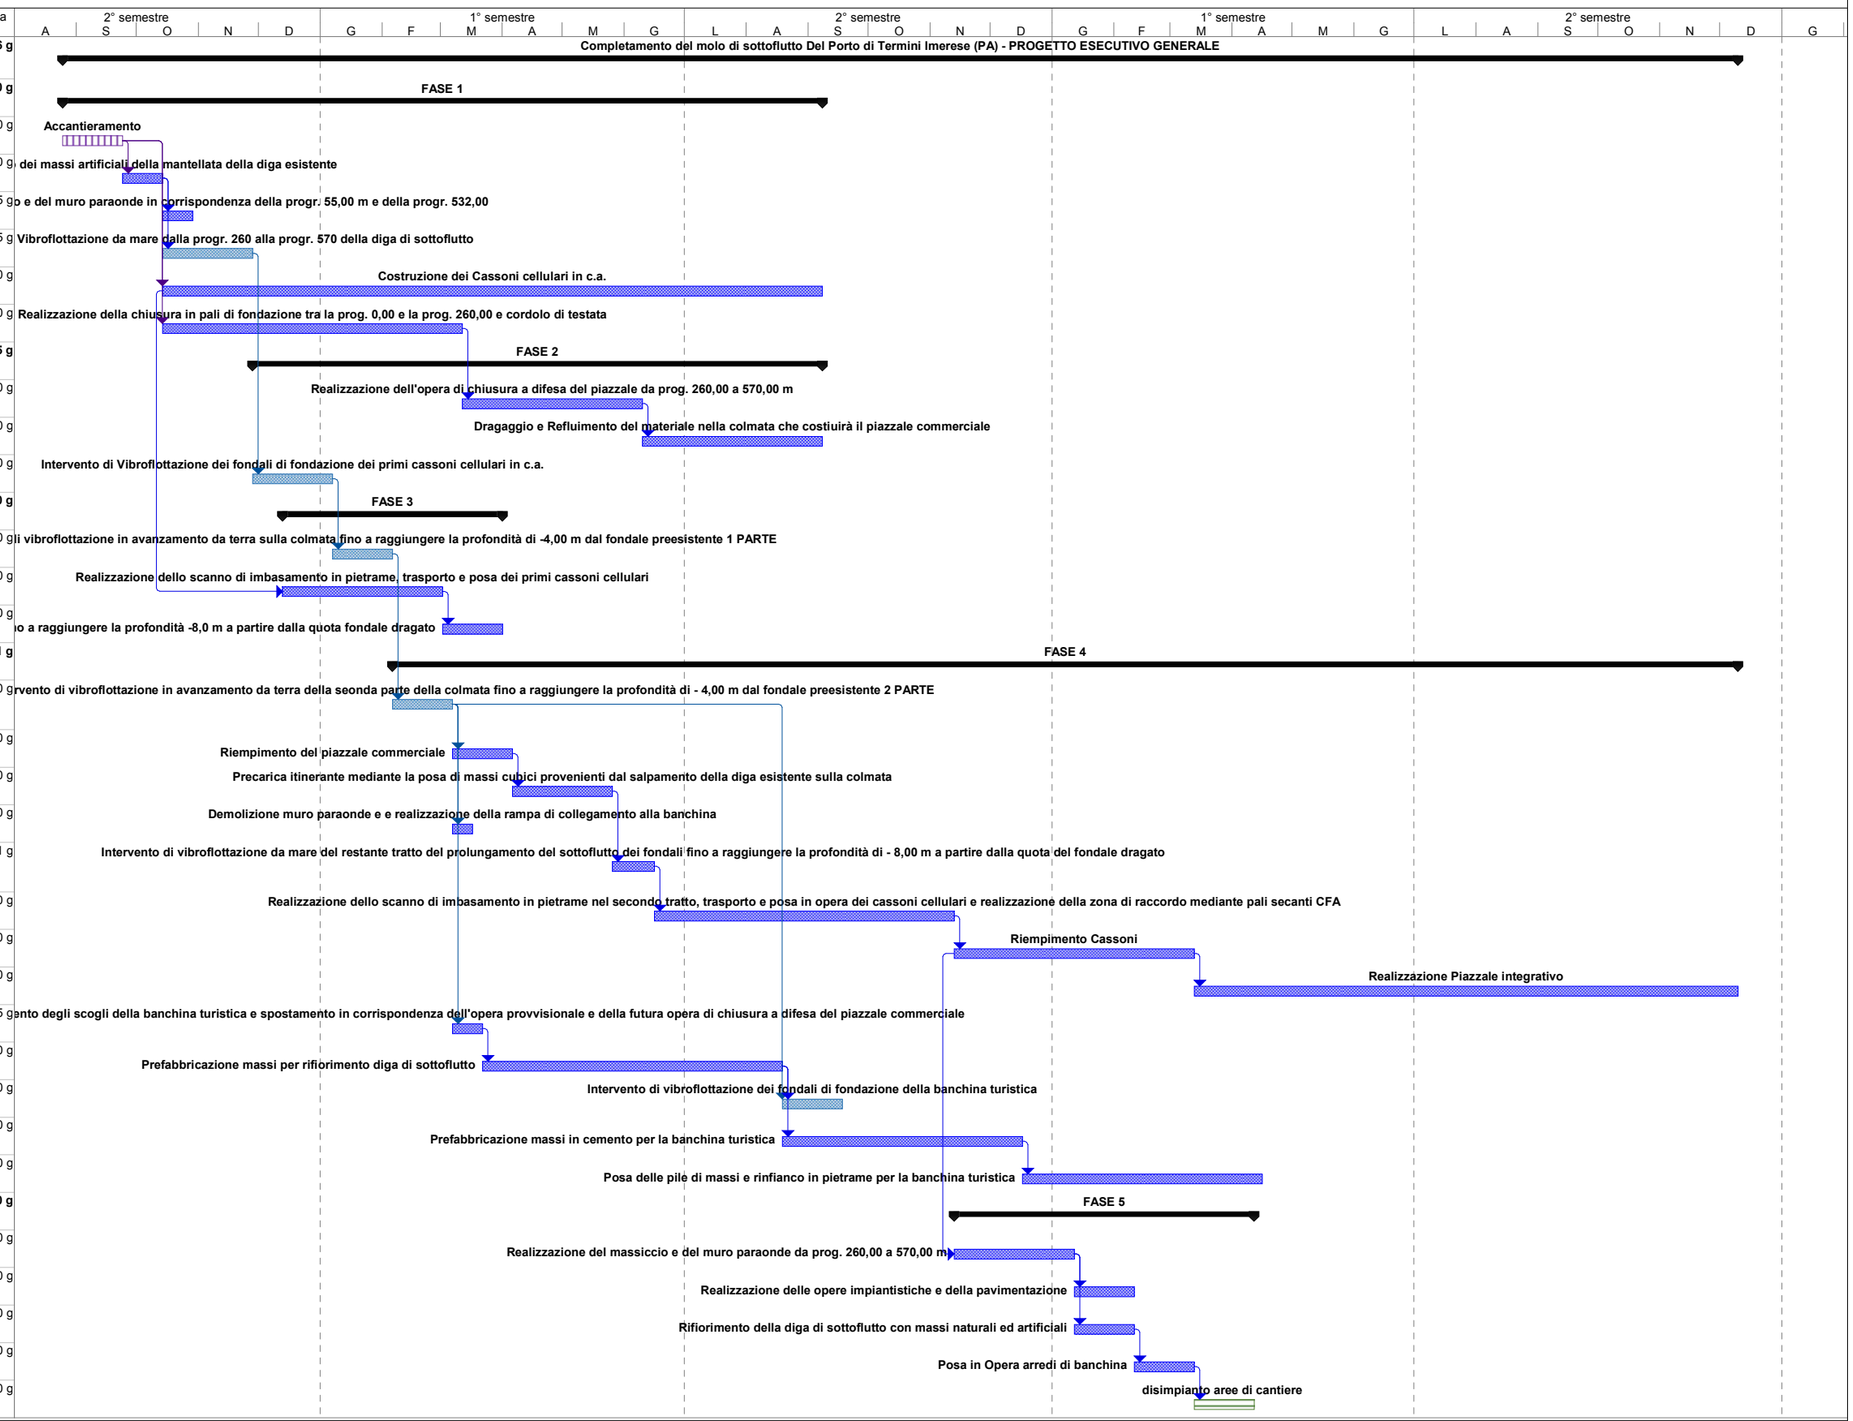

Attività		Riepilogo		Cardine esterno		Cardine inattiva		Solo-durata		Solo inizio		Scadenza	
Divisione		Riepilogo progetto		Attività inattiva		Riepilogo inattiva		Riporto riepilogo manuale		Solo-fine			
Cardine		Attività esterne		Attività inattiva		Attività manuale		Riepilogo manuale		Avanzamento			
