P0012790-7 - H2 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ID	Nome attività	Durata	Predec
1	**IMPIANTO LGN - ORISTANO PORTO**	**414 g**	
2	**INIZIO LAVORI**	1 g	
3	REALIZZAZIONE ACCESSI	4 g	2
4	POSIZIONAMENTO RECINZIONE DI CANTIERE	5 g	3
5	ASPORTAZIONE VEGETAZIONE ARBUSTIVA	9 g	3
6	POSIZIONAMENTO PROVVISORIO SERVIZI DI CANTIERE	1 g	7
7	SCOTICO 30 CM E SCAVO TRACCIAMENTO VIABILITA'	40 g	3
8	RICARICO CON MATERIALE ESTERNO (QUOTA 2.20 mslm)	44 g	7
9	RICARICO CON MATERIALE ESTERNO (QUOTA 2.55 mslm) - 1ª PARTE	10 g	8
10	RICARICO CON MATERIALE ESTERNO (QUOTA 2.55 mslm) - 2ª PARTE	10 g	9
11	RICARICO CON MATERIALE ESTERNO (QUOTA 2.78 mslm)	10 g	10
12	TRACCIAMENTO VIABILITA' DI CANTIERE	3 g	11
13	SPOSTAMENTO SERVIZI DI CANTIERE	3 g	12
14	ALLACCIO RETE IDRICA E RETE ELETTRICA DI CANTIERE	15 g	13
15	ALLESTIMENTO AREE STOCCAGGIO MATERIALI	7 g	13
16	REALIZZAZIONE PLATEA DI APPOGGIO GRU E MATURAZIONE	14 g	11
17	POSIZIONAMENTO GRU	2 g	16
18	SCAVO VASCA RACCOLTA ACQUE METEORICHE	5 g	13
19	REALIZZAZIONE VASCA RACCOLTA ACQUE METEORICHE	15 g	18
20	REALIZZAZIONE PALI ZONA TORCIA	20 g	8
21	REALIZZAZIONE PALI ZONA SERBATOI DI STOCCAGGIO	36 g	20
22	REALIZZAZIONE PALI ZONA SKID	20 g	21
23	REALIZZAZIONE PALI SERBATOIO ANTINCENDIO	20 g	22
24	ARMATURA PLATEE DI APPOGGIO SERBATOI	10 g	21
25	GETTO PLATEE DI APPOGGIO SERBATOI	12 g	24
26	MATURAZIONE PLATEE DI APPOGGIO SERBATOI	20 g	25
27	PREDISPOSIZIONE ARMATURE VASCHE ZONA SERBATOI DI STOCCAGGIO	12 g	24
28	GETTO VASCHE ZONA SERBATOI DI STOCCAGGIO	10 g	27
29	PREDISPOSIZIONE ARMATURE PLATEA ZONA VAPORIZZATORI E SALA SKID	10 g	27,22
30	GETTO PLATEA ZONA VAPORIZZATORI E SALA SKID	10 g	29
31	MATURAZIONE PLATEA ZONA VAPORIZZATORI E SALA SKID	20 g	30
32	POSA ARMATURA PLATEA ZONA TORCIA	10 g	17
33	GETTO PLATEA ZONA TORCIA	10 g	32
34	PREDISPOSIZIONE ARMATURE DI FONDAZIONE AREA CARICO TRUCK	10 g	29
35	GETTO PLATEA AREA CARICO TRUCK	10 g	34
36	PREDISPOSIZIONE ARMATURE AREA UTILITIES	10 g	34
37	GETTO PLATEA AREA UTILITIES	10 g	36
38	PREDISPOSIZIONE ARMATURE PLATEA SERBATOIO ANTINCENDIO	10 g	34
39	GETTO PLATEA SERBATOIO ANTINCENDIO	10 g	37
40	PREDISPOSIZIONE ARMATURE PLATEA AREA SALA ELETTRICA	10 g	35
41	GETTO PLATEA SALA ELETTRICA	10 g	40
42	MATURAZIONE PLATEA SALA ELETTRICA	10 g	41
43	POSIZIONAMENTO SERBATOI DI STOCCAGGIO	20 g	26
44	REALIZZAZIONE FIRE WALL	33 g	40
45	REALIZZAZIONE EDIFICIO SKID	45 g	31
46	REALIZZAZIONE EDIFICIO SALA ELETTRICA	35 g	42
47	POSIZIONAMENTO IMPIANTI ZONA SERBATOI	35 g	44
48	POSIZIONAMENTO IMPIANTI PRODUZIONE ARIA / AZOTO	10 g	II+35 g
49	REALIZZAZIONE SUPERFICIE STRADA AREA CARICO TRUCK	22 g	44
50	MONTAGGIO POMPE - VAPORIZZATORI - SKID	65 g	45
51	MONTAGGIO PENSILINA CARICO TRUCK	23 g	49
52	MONTAGGIO ZONA TORCIA	35 g	49
53	POSIZIONAMENTO PIPE RACKS	43 g	51
54	MONTAGGIO GENERATORE DIESEL DI EMERGENZA E POMPE ANTINCENDIO	8 g	52
55	ALLESTIMENTO SALA SKID	33 g	II+10 g
56	ALLESTIMENTO SALA ELETTRICA	23 g	50
57	PREDISPOSIZIONE RETE DRENAGGIO ACQUE METEORICHE	30 g	53
58	RIMOZIONE GRU	10 g	53
59	POSIZIONAMENTO RECINZIONI ESTERNE	20 g	58
60	POSIZIONAMENTO RECINZIONI INTERNE	13 g	59
61	ASFALTATURA STRADE	23 g	II+20 g
62	RIMOZIONE SERVIZI DI CANTIERE	10 g	60
63	MODELLAZIONE E FINITURA AREE	20 g	60
64	DEMOLIZIONE BASE GRU	10 g	62
65	**PRE COMMISSIONING**	34 g	II+10 g
66	**COMMISSIONING**	10 g	65
67	**AVVIAMENTO**	20 g	66

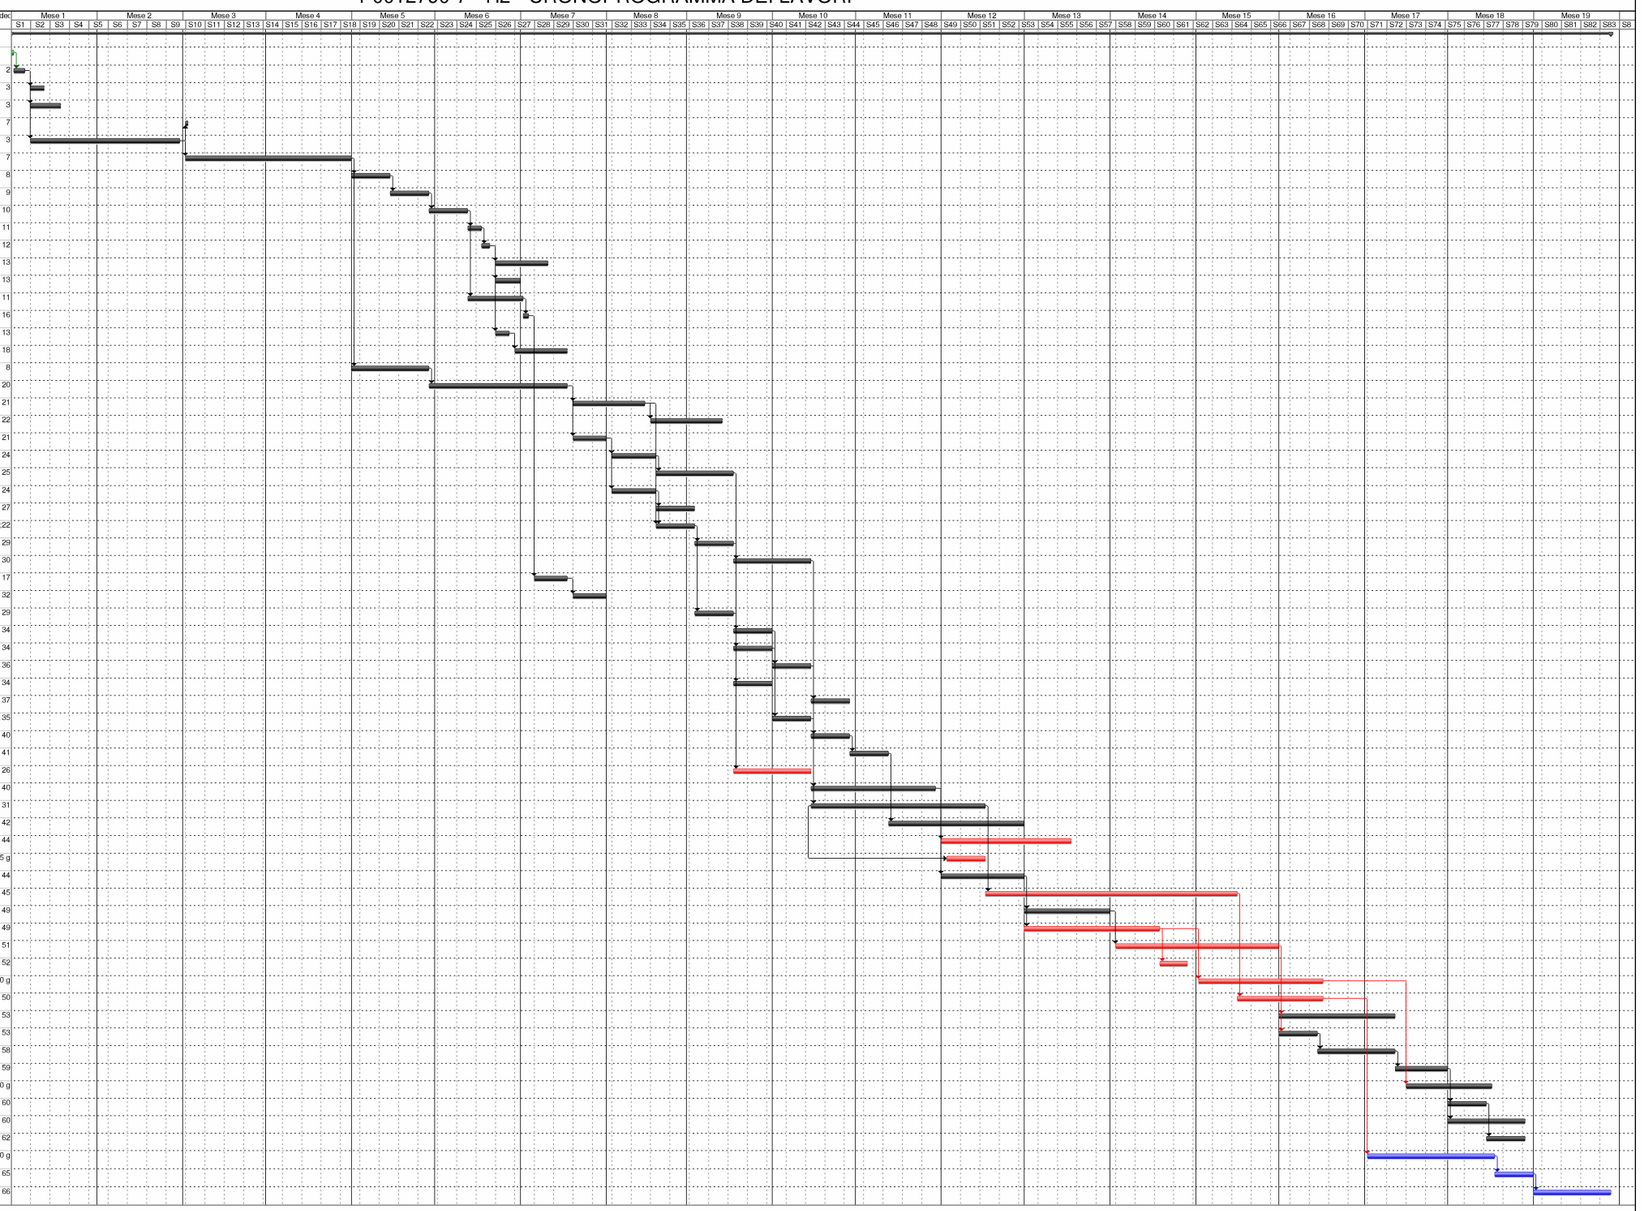

Progetto: Cronoprogramma lavori
Data: lun 05/08/19

Attività | Divisione | Avanzamento | Cardine | Riepilogo | Riepilogo progetto | Attività esterne | Cardine esterno | Scadenza

Pagina 1

RIFERIMENTO

FIGURA 3.6

RINA CONSULTING S.p.A., 2019, "CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI", DOC. No. P0012790-7-H2

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
