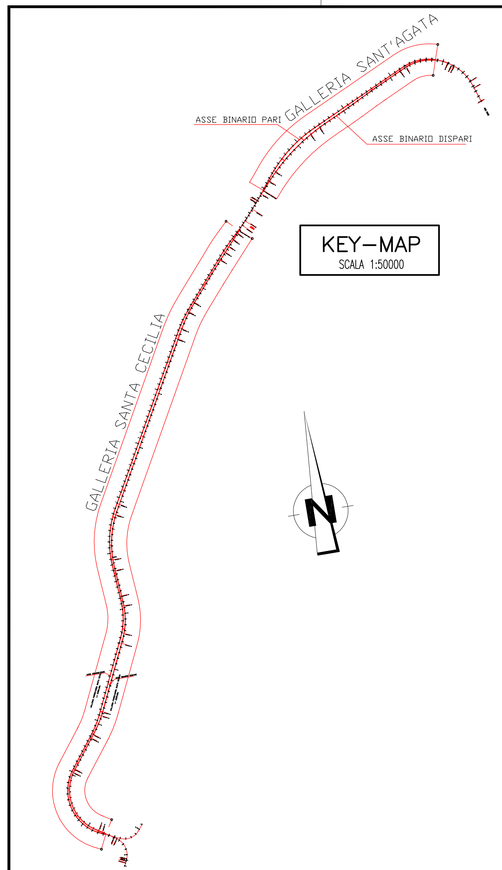

Tabella schematica piezometri/inclinometri Sicilia

Sondaggio	Piezometro/Inclinometro	Profondità (m)	Livello falda da p.c. al 14/02/2011
S407	Tubo aperto	30	Assente
S408bis	Inclinometro	40	-
S409	Casagrande	30	Assente
S409bis	Inclinometro	40	-
S410	Inclinometro	75	-
S411	Casagrande	35	Assente
S412	Tubo aperto	65	Assente
S412bis	Inclinometro	60	-
S414bis	Casagrande	30	Assente
S415	Tubo aperto	35	Assente
S416	Tubo aperto	40	Non accessibile
S417	Casagrande	30	Assente
S419	Casagrande	60	Assente
S420	Casagrande	65	Assente
S421	Tubo aperto	80	Assente
S422	Inclinometro	70	-
S423	Casagrande	30	Demolito
S425	Casagrande	50	Demolito
S427	Casagrande	45	Assente
S428	Casagrande	102	Assente
S429	Inclinometro	65	-
S429bis	Inclinometro	90	-
S430	Tubo aperto	39.5	-10.79 (gennaio 2011)
S431	Casagrande	24	-8.90 (gennaio 2011)
S432	Casagrande	20	-17.98 (gennaio 2011)
S433	Tubo aperto	90	ass. (gennaio 2011)
S434	Casagrande	22	-20.58 (gennaio 2011)
S435	Inclinometro	30	-
S436	Casagrande	21	-13.97 (gennaio 2011)
S437	Casagrande	24	-16.86 (gennaio 2011)
S441	Tubo aperto	42	-4.36 (gennaio 2011)
S445	Casagrande	50	assente
S445bis	Tubo aperto	50	assente
S446	Tubo aperto	55	-52.35
S448	Casagrande	30	assente
S449	Casagrande	30	assente
S450	Tubo aperto	125	-115.03 (gennaio 2011)
S451	Casagrande	97	-51.25
S452bis	Casagrande	22	-20.51
S453	Casagrande	17	-11.20
S454bis	Casagrande	34	-30.53
S455	Tubo aperto	49	-12.03
S456	Casagrande	49	-5.39
S457	Casagrande	42	-3.33
S459	Casagrande	40	-38.31
S459bis	Casagrande	59	-12.08
S460	Tubo aperto	45	-44.01 (gennaio 2011)
S461	Casagrande	35	assente
S462	Casagrande	51	assente
S463	Tubo aperto	60	-55.86
S464bis	Casagrande	65	-63.62
S465	Casagrande	20	-13.90
S466	Tubo aperto	45	-33.97
I1	Inclinometro	45	-
I2	Inclinometro	60	-
I3	Inclinometro	60	-

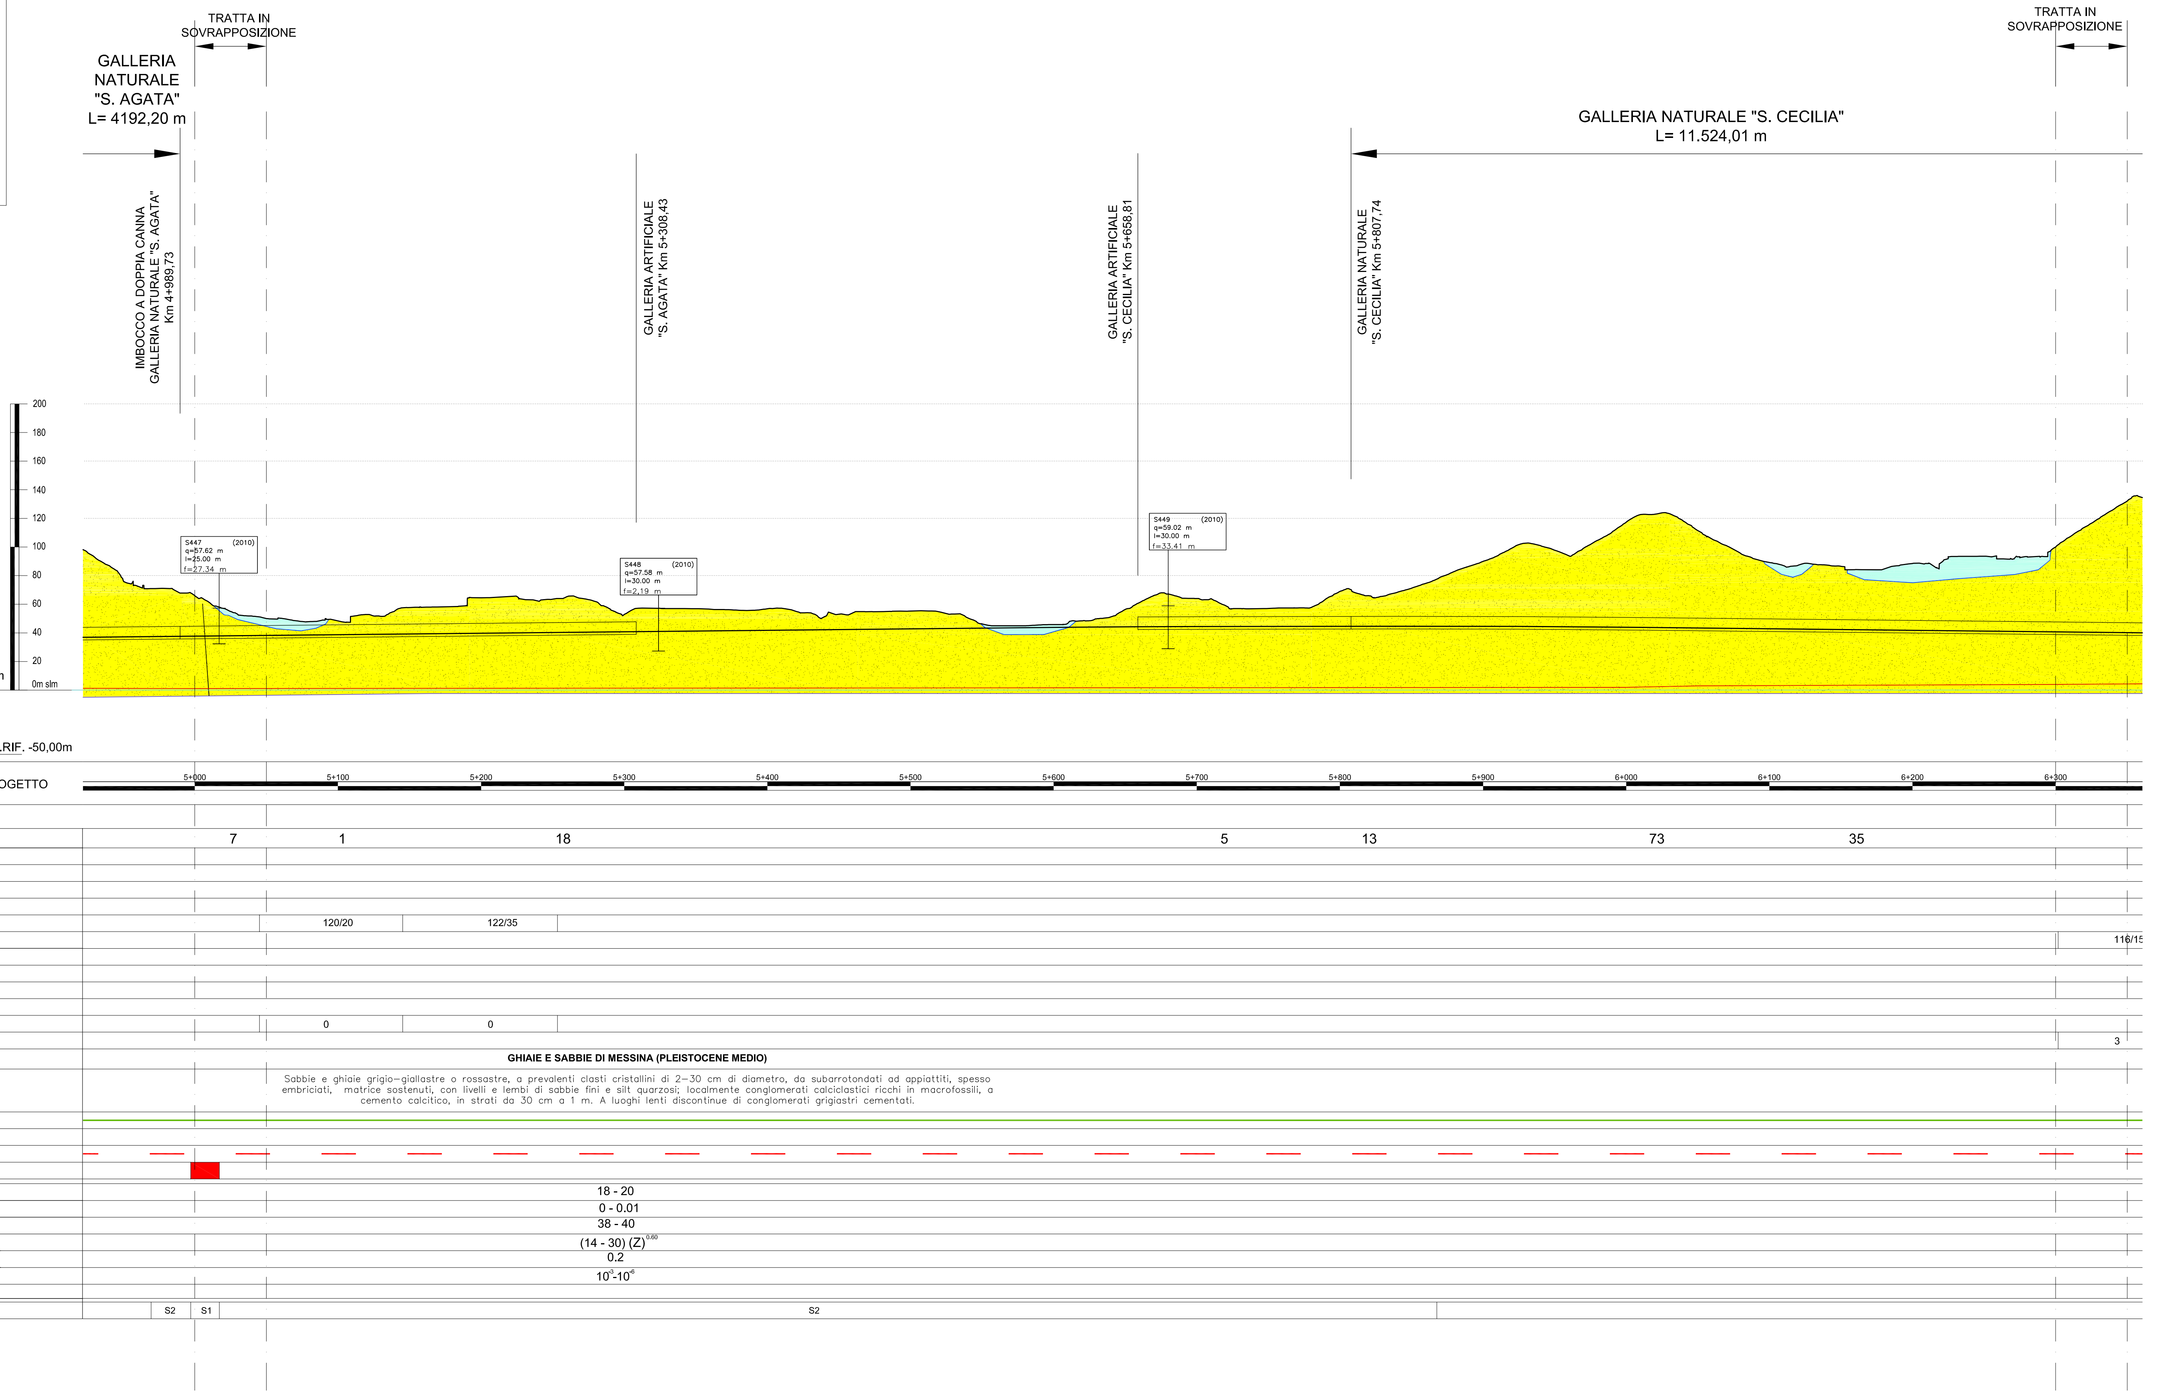

FASE CONOSCITIVA

STUDIO GEOLOGICO

STRATIFICAZIONE

| | | |
