COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE:
CONSORZIO:

HirpiniaAV

SOCI:

salini impregilo

ASTALDI

PROGETTAZIONE:
MANDATARIA:

ROCKSOIL S.p.A.

MANDANTI:

NET ENGINEERING

Alpina S.p.A.

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA
I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA

PARTE GENERALE

GENERALE

Programma operativo

APPALTATORE	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE	PROGETTISTA
Consorzio HIRPINIA AV Il Direttore Tecnico Ing. Vincenzo Moriello 07/08/2020	Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Cassani	Ing. Vincenzo Moriello

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF28	01	E	ZZ	PH	CA0000	004	E	-

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
B	Emissione per consegna	A. Cametti	10/03/2020	F.Carriero	10/03/2020	V. Moriello	10/03/2020	Ing. V. Moriello
C	Emissione per consegna	A. Cametti	28/03/2020	F.Carriero	28/03/2020	V. Moriello	28/03/2020	
D	Recepimento istruttoria	A.Cametti	20/06/2020	F.Carriero	20/06/2020	V. Moriello	20/06/2020	
E	Recepimento istruttoria	A.Cametti	07/08/2020	F.Carriero	07/08/2020	V. Moriello	07/08/2020	07/08/2020

File: IF2801EZZPHCA0000004E | n. Elab.: -

Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria dell'itinerario Napoli - Bari
Raddoppio tratta Apice - Orsara, I lotto funzionale Apice – Hirpinia

Programma Operativo dei Lavori Rev. E

HirpiniaAV

ID	Nome attività	Inizio	Fine	Durata gg solari
1	**Raddoppio Tratta Apice-Orsara - I Lotto Funzionale Apice-Hirpinia**	**27/08/2019**	**02/12/2025**	**2290**
2	**GENERALE**	**27/08/2019**	**02/12/2025**	**2290**
3	**Generale**	**27/08/2019**	**02/12/2025**	**2290**
4	**INTERO PROGETTO**	**27/08/2019**	**02/12/2025**	**2290**
5	**Intero Progetto**	**27/08/2019**	**02/12/2025**	**2290**
6	**Intera Opera**	**27/08/2019**	**02/12/2025**	**2290**
7	**G000 - Intera Opera**	**27/08/2019**	**02/12/2025**	**2290**
8	**GEN - Generale**	**27/08/2019**	**02/12/2025**	**2290**
9	Consegna delle Prestazioni	27/08/2019	27/08/2019	0
10	Consegna dei lavori	09/11/2020	09/11/2020	0
11	Durata dei lavori di Costruzione	09/11/2020	02/12/2025	1850
12	Ultimazione Lavori	02/12/2025	02/12/2025	0
13	**Termini Utili Parziali**	**19/12/2021**	**02/09/2025**	**1354**
14	**INTERO PROGETTO**	**19/12/2021**	**02/09/2025**	**1354**
15	**Intero Progetto**	**19/12/2021**	**02/09/2025**	**1354**
16	**Intera Opera**	**19/12/2021**	**02/09/2025**	**1354**
17	**G000 - Intera Opera**	**19/12/2021**	**02/09/2025**	**1354**
18	**GEN - Generale**	**19/12/2021**	**02/09/2025**	**1354**
19	TUP 1 - Inizio scavo meccanizzato galleria Naturale Rocchetta	19/12/2021	19/12/2021	0
20	TUP 2 - Fine scavo galleria Rocchetta (GN03)	15/09/2023	15/09/2023	0
21	TUP 3 - Disponibilità fabbricati (FA04-FA05-FA06) e area di cantiere presso la nuova Stazion	06/11/2024	06/11/2024	0
22	TUP 4 - Disponibilità opere di linea per sovrastruttura e fabbricati (FA01-FA03-FA07 – loc. te	24/05/2025	24/05/2025	0
23	TUP 5 - Disponibilità sede per attrezzaggio a cura appalto tecnologico	02/09/2025	02/09/2025	0
24	**PROGETTAZIONE**	**27/08/2019**	**20/02/2025**	**2005**
25	**Progetto Esecutivo**	**27/08/2019**	**22/02/2020**	**180**
32	**Iter approvativo Progetto Esecutivo e PUT**	**23/02/2020**	**08/11/2020**	**260**
33	**INTERO PROGETTO**	**23/02/2020**	**08/11/2020**	**260**
34	**Intero Progetto**	**23/02/2020**	**08/11/2020**	**260**
35	**Intera Opera**	**23/02/2020**	**08/11/2020**	**260**
36	**G000 - Intera Opera**	**23/02/2020**	**08/11/2020**	**260**
37	**GEN - Generale**	**23/02/2020**	**08/11/2020**	**260**
38	Iter approvativo Progetto Esecutivo	23/02/2020	10/08/2020	170
39	Iter approvativo PUT	11/08/2020	08/11/2020	90
40	Approvazione Progetto Esecutivo	10/08/2020	10/08/2020	0
41	**Progetto Esecutivo di Dettaglio**	**24/01/2020**	**20/02/2025**	**1855**
48	**APPROVVIGIONAMENTI ED AFFIDAMENTI**	**11/08/2020**	**07/07/2025**	**1792**
49	**Opere di Sede**	**11/08/2020**	**19/06/2022**	**678**
50	**VIADOTTI**	**12/09/2020**	**29/08/2021**	**352**
51	**VIADOTTI**	**12/09/2020**	**29/08/2021**	**352**
52	**Viadotti**	**12/09/2020**	**29/08/2021**	**352**
53	**Benne pesanti**	**12/09/2020**	**10/03/2021**	**180**
58	**Casseri Plinti**	**18/09/2020**	**14/02/2021**	**150**
63	**Casseri Pile Standard**	**17/12/2020**	**15/04/2021**	**120**
68	**Casseri Pile Rastremate**	**02/05/2021**	**29/08/2021**	**120**
73	**Casseri Pulvini**	**27/12/2020**	**25/04/2021**	**120**
78	**GALLERIE**	**11/08/2020**	**19/06/2022**	**678**
79	**GALLERIE TBM**	**11/08/2020**	**18/12/2021**	**495**
80	**Gallerie TBM**	**11/08/2020**	**18/12/2021**	**495**
81	**TBM**	**11/08/2020**	**04/09/2021**	**390**
89	**Impianto Nastri**	**24/03/2021**	**18/12/2021**	**270**
95	**Impianti Ventilazione**	**23/05/2021**	**18/12/2021**	**210**
101	**Torri Refrigerative**	**23/05/2021**	**18/12/2021**	**210**
107	**Impianti Bicomponente**	**22/06/2021**	**18/12/2021**	**180**
113	**Impianti trattamento acque**	**23/05/2021**	**18/12/2021**	**210**
119	**GALLERIE NATURALI**	**02/04/2021**	**19/06/2022**	**444**
120	**Gallerie Naturali**	**02/04/2021**	**19/06/2022**	**444**
121	**Casseri calotta cunicoli carrabili**	**02/04/2021**	**28/10/2021**	**210**
126	**Casseri calotta cunicoli pedonali**	**22/11/2021**	**19/06/2022**	**210**
131	**Generale**	**17/08/2020**	**07/07/2025**	**1786**
132	**INTERO PROGETTO**	**17/08/2020**	**07/07/2025**	**1786**
133	**Intero Progetto**	**17/08/2020**	**07/07/2025**	**1786**
134	**Intera Opera**	**17/08/2020**	**07/07/2025**	**1786**
135	**G000 - Intera Opera**	**17/08/2020**	**07/07/2025**	**1786**
138	**COSTRUZIONE**	**11/08/2020**	**02/12/2025**	**1940**
139	**Opere di Sede**	**11/08/2020**	**02/12/2025**	**1940**
140	**BONIFICA ORDIGNI BELLICI**	**25/08/2020**	**07/09/2022**	**744**
141	**BB01 - Bonifica Ordigni Esplosivi**	**25/08/2020**	**07/09/2022**	**744**
142	**BB01A - Bonifica Ordigni Esplosivi**	**25/08/2020**	**07/09/2022**	**744**
143	**BB01.N1A**	**27/08/2020**	**21/10/2020**	**56**
144	**MLS - Milestones Generali**	**27/08/2020**	**27/08/2020**	**0**

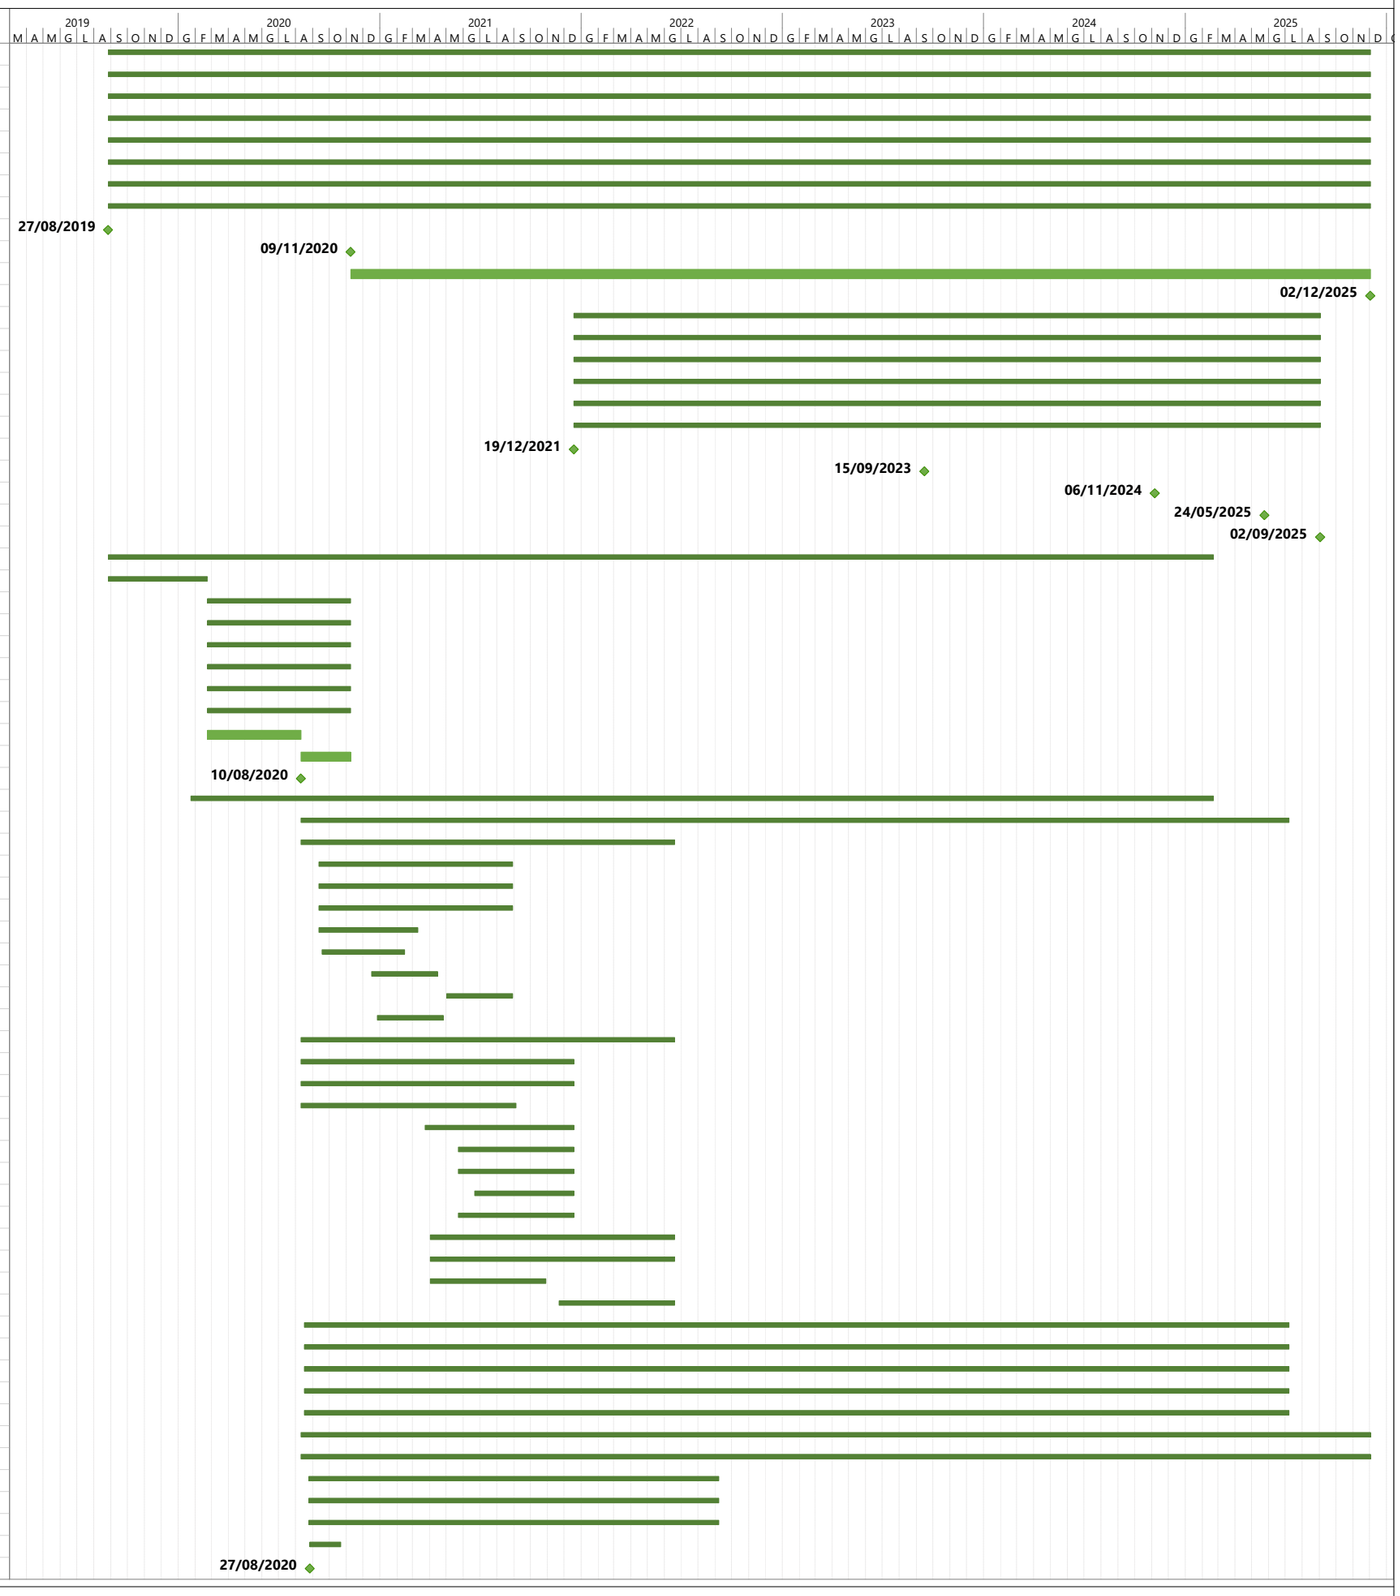

Attività Milestones Riepilogo

ID	Nome attività	Inizio	Fine	Durata gg solari
147	**BB1 - Bonifica bellica superficiale**	**27/08/2020**	**11/09/2020**	**16**
149	**BB2 - Bonifica bellica profonda**	**03/09/2020**	**21/09/2020**	**19**
151	**BB3 - Bonifica bellica - Collaudo GM e acquisiz. Certificazione**	**22/09/2020**	**21/10/2020**	**30**
153	**BB01.CB1**	**25/08/2020**	**27/09/2020**	**34**
154	**MLS - Milestones Generali**	**25/08/2020**	**25/08/2020**	**0**
156	**BB1 - Bonifica bellica superficiale**	**25/08/2020**	**26/08/2020**	**2**
158	**BB2 - Bonifica bellica profonda**	**27/08/2020**	**28/08/2020**	**2**
160	**BB3 - Bonifica bellica - Collaudo GM e acquisiz. Certificazione**	**29/08/2020**	**27/09/2020**	**30**
162	**BB01.R01**	**29/09/2020**	**06/12/2020**	**69**
163	**MLS - Milestones Generali**	**29/09/2020**	**29/09/2020**	**0**
166	**BB1 - Bonifica bellica superficiale**	**29/09/2020**	**12/10/2020**	**14**
168	**BB2 - Bonifica bellica profonda**	**16/10/2020**	**06/11/2020**	**22**
171	**BB3 - Bonifica bellica - Collaudo GM e acquisiz. Certificazione**	**07/11/2020**	**06/12/2020**	**30**
173	**BB01.FV1**	**24/09/2020**	**14/11/2020**	**52**
174	**MLS - Milestones Generali**	**24/09/2020**	**24/09/2020**	**0**
177	**BB1 - Bonifica bellica superficiale**	**24/09/2020**	**28/09/2020**	**5**
179	**BB2 - Bonifica bellica profonda**	**08/10/2020**	**15/10/2020**	**8**
181	**BB3 - Bonifica bellica - Collaudo GM e acquisiz. Certificazione**	**16/10/2020**	**14/11/2020**	**30**
183	**BB01.R02**	**14/09/2020**	**28/10/2020**	**45**
184	**MLS - Milestones Generali**	**14/09/2020**	**14/09/2020**	**0**
187	**BB1 - Bonifica bellica superficiale**	**14/09/2020**	**16/09/2020**	**3**
189	**BB2 - Bonifica bellica profonda**	**22/09/2020**	**28/09/2020**	**7**
192	**BB3 - Bonifica bellica - Collaudo GM e acquisiz. Certificazione**	**29/09/2020**	**28/10/2020**	**30**
194	**BB01.V01**	**17/09/2020**	**06/11/2020**	**51**
195	**MLS - Milestones Generali**	**17/09/2020**	**17/09/2020**	**0**
198	**BB1 - Bonifica bellica superficiale**	**17/09/2020**	**23/09/2020**	**7**
200	**BB2 - Bonifica bellica profonda**	**29/09/2020**	**07/10/2020**	**9**
203	**BB3 - Bonifica bellica - Collaudo GM e acquisiz. Certificazione**	**08/10/2020**	**06/11/2020**	**30**
205	**BB01.G1A**	**25/08/2020**	**30/09/2020**	**37**
206	**MLS - Milestones Generali**	**25/08/2020**	**25/08/2020**	**0**
209	**BB1 - Bonifica bellica superficiale**	**25/08/2020**	**27/08/2020**	**3**
211	**BB2 - Bonifica bellica profonda**	**25/08/2020**	**31/08/2020**	**7**
214	**BB3 - Bonifica bellica - Collaudo GM e acquisiz. Certificazione**	**01/09/2020**	**30/09/2020**	**30**
216	**BB01.G1B**	**03/11/2020**	**29/01/2021**	**88**
217	**MLS - Milestones Generali**	**03/11/2020**	**03/11/2020**	**0**
220	**BB1 - Bonifica bellica superficiale**	**03/11/2020**	**17/11/2020**	**15**
222	**BB2 - Bonifica bellica profonda**	**07/12/2020**	**30/12/2020**	**24**
224	**BB3 - Bonifica bellica - Collaudo GM e acquisiz. Certificazione**	**31/12/2020**	**29/01/2021**	**30**
226	**BB01.G07**	**20/10/2020**	**17/12/2020**	**59**
227	**MLS - Milestones Generali**	**20/10/2020**	**20/10/2020**	**0**
230	**BB1 - Bonifica bellica superficiale**	**20/10/2020**	**21/10/2020**	**2**
232	**BB2 - Bonifica bellica profonda**	**13/11/2020**	**17/11/2020**	**5**
235	**BB3 - Bonifica bellica - Collaudo GM e acquisiz. Certificazione**	**18/11/2020**	**17/12/2020**	**30**
237	**BB01.V02**	**24/09/2020**	**28/11/2020**	**66**
238	**MLS - Milestones Generali**	**24/09/2020**	**24/09/2020**	**0**
241	**BB1 - Bonifica bellica superficiale**	**24/09/2020**	**07/10/2020**	**14**
243	**BB2 - Bonifica bellica profonda**	**12/10/2020**	**29/10/2020**	**18**
246	**BB3 - Bonifica bellica - Collaudo GM e acquisiz. Certificazione**	**30/10/2020**	**28/11/2020**	**30**
248	**BB01.G08**	**09/12/2020**	**28/02/2021**	**82**
249	**MLS - Milestones Generali**	**09/12/2020**	**09/12/2020**	**0**
252	**BB1 - Bonifica bellica superficiale**	**09/12/2020**	**11/12/2020**	**3**
254	**BB2 - Bonifica bellica profonda**	**26/01/2021**	**29/01/2021**	**4**
257	**BB3 - Bonifica bellica - Collaudo GM e acquisiz. Certificazione**	**30/01/2021**	**28/02/2021**	**30**
259	**BB01.G09**	**22/10/2020**	**01/01/2021**	**72**
260	**MLS - Milestones Generali**	**22/10/2020**	**22/10/2020**	**0**
263	**BB1 - Bonifica bellica superficiale**	**22/10/2020**	**30/10/2020**	**9**
265	**BB2 - Bonifica bellica profonda**	**20/11/2020**	**02/12/2020**	**13**
268	**BB3 - Bonifica bellica - Collaudo GM e acquisiz. Certificazione**	**03/12/2020**	**01/01/2021**	**30**
270	**BB01.G10**	**14/12/2020**	**05/03/2021**	**82**
271	**MLS - Milestones Generali**	**14/12/2020**	**14/12/2020**	**0**
274	**BB1 - Bonifica bellica superficiale**	**14/12/2020**	**15/12/2020**	**2**
276	**BB2 - Bonifica bellica profonda**	**01/02/2021**	**03/02/2021**	**3**
279	**BB3 - Bonifica bellica - Collaudo GM e acquisiz. Certificazione**	**04/02/2021**	**05/03/2021**	**30**
281	**BB01.V03**	**03/09/2020**	**08/11/2020**	**67**
282	**MLS - Milestones Generali**	**03/09/2020**	**03/09/2020**	**0**
285	**BB1 - Bonifica bellica superficiale**	**03/09/2020**	**23/09/2020**	**21**
287	**BB2 - Bonifica bellica profonda**	**10/09/2020**	**09/10/2020**	**30**
290	**BB3 - Bonifica bellica - Collaudo GM e acquisiz. Certificazione**	**10/10/2020**	**08/11/2020**	**30**
292	**BB01.G11**	**02/11/2020**	**06/01/2021**	**66**
293	**MLS - Milestones Generali**	**02/11/2020**	**02/11/2020**	**0**

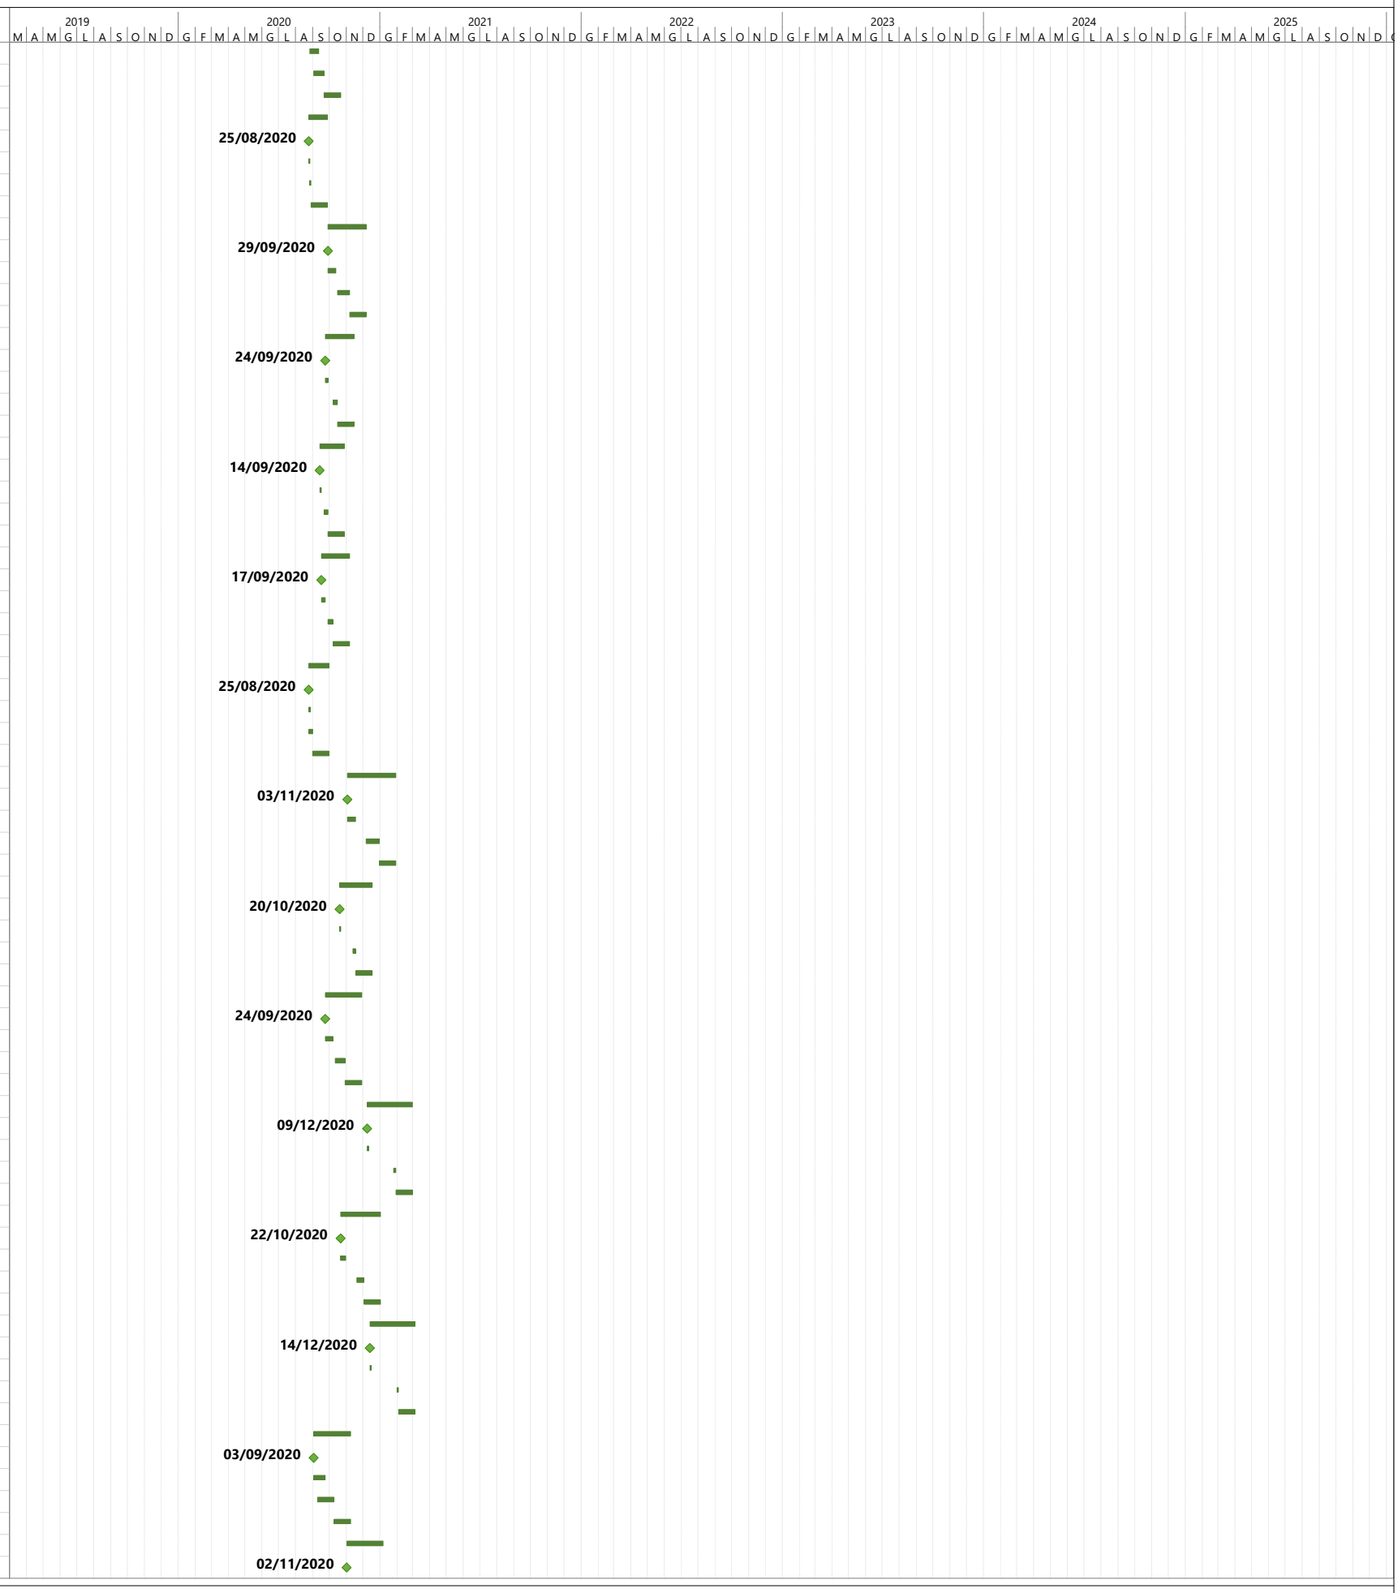

Attività Milestones Riepilogo

ID	Nome attività	Inizio	Fine	Durata gg solari
296	**BB1 - Bonifica bellica superficiale**	**02/11/2020**	**03/11/2020**	**2**
298	**BB2 - Bonifica bellica profonda**	**03/12/2020**	**07/12/2020**	**5**
301	**BB3 - Bonifica bellica - Collaudo GM e acquisiz. Certificazione**	**08/12/2020**	**06/01/2021**	**30**
303	**BB01.G12**	**13/10/2020**	**19/12/2020**	**68**
304	**MLS - Milestones Generali**	**13/10/2020**	**13/10/2020**	**0**
307	**BB1 - Bonifica bellica superficiale**	**13/10/2020**	**21/10/2020**	**9**
309	**BB2 - Bonifica bellica profonda**	**09/11/2020**	**19/11/2020**	**11**
312	**BB3 - Bonifica bellica - Collaudo GM e acquisiz. Certificazione**	**20/11/2020**	**19/12/2020**	**30**
314	**BB01.G13**	**04/11/2020**	**10/01/2021**	**68**
315	**MLS - Milestones Generali**	**04/11/2020**	**04/11/2020**	**0**
318	**BB1 - Bonifica bellica superficiale**	**04/11/2020**	**05/11/2020**	**2**
320	**BB2 - Bonifica bellica profonda**	**09/12/2020**	**11/12/2020**	**3**
323	**BB3 - Bonifica bellica - Collaudo GM e acquisiz. Certificazione**	**12/12/2020**	**10/01/2021**	**30**
325	**BB01.G6A**	**28/08/2020**	**09/10/2020**	**43**
326	**MLS - Milestones Generali**	**28/08/2020**	**28/08/2020**	**0**
329	**BB1 - Bonifica bellica superficiale**	**28/08/2020**	**02/09/2020**	**6**
331	**BB2 - Bonifica bellica profonda**	**01/09/2020**	**09/09/2020**	**9**
334	**BB3 - Bonifica bellica - Collaudo GM e acquisiz. Certificazione**	**10/09/2020**	**09/10/2020**	**30**
336	**BB01.G6B**	**18/11/2020**	**24/02/2021**	**99**
337	**MLS - Milestones Generali**	**18/11/2020**	**18/11/2020**	**0**
340	**BB1 - Bonifica bellica superficiale**	**18/11/2020**	**07/12/2020**	**20**
342	**BB2 - Bonifica bellica profonda**	**31/12/2020**	**25/01/2021**	**26**
344	**BB3 - Bonifica bellica - Collaudo GM e acquisiz. Certificazione**	**26/01/2021**	**24/02/2021**	**30**
346	**BB01.V04**	**08/10/2020**	**12/12/2020**	**66**
347	**MLS - Milestones Generali**	**08/10/2020**	**08/10/2020**	**0**
350	**BB1 - Bonifica bellica superficiale**	**08/10/2020**	**19/10/2020**	**12**
352	**BB2 - Bonifica bellica profonda**	**30/10/2020**	**12/11/2020**	**14**
355	**BB3 - Bonifica bellica - Collaudo GM e acquisiz. Certificazione**	**13/11/2020**	**12/12/2020**	**30**
357	**BB01.R05**	**22/10/2020**	**23/12/2020**	**63**
358	**MLS - Milestones Generali**	**22/10/2020**	**22/10/2020**	**0**
361	**BB1 - Bonifica bellica superficiale**	**22/10/2020**	**23/10/2020**	**2**
363	**BB2 - Bonifica bellica profonda**	**18/11/2020**	**23/11/2020**	**6**
366	**BB3 - Bonifica bellica - Collaudo GM e acquisiz. Certificazione**	**24/11/2020**	**23/12/2020**	**30**
368	**BB01.FV2**	**26/10/2020**	**31/12/2020**	**67**
369	**MLS - Milestones Generali**	**26/10/2020**	**26/10/2020**	**0**
372	**BB1 - Bonifica bellica superficiale**	**26/10/2020**	**29/10/2020**	**4**
374	**BB2 - Bonifica bellica profonda**	**24/11/2020**	**01/12/2020**	**8**
377	**BB3 - Bonifica bellica - Collaudo GM e acquisiz. Certificazione**	**02/12/2020**	**31/12/2020**	**30**
379	**BB01.R06**	**30/10/2020**	**03/01/2021**	**66**
380	**MLS - Milestones Generali**	**30/10/2020**	**30/10/2020**	**0**
383	**BB1 - Bonifica bellica superficiale**	**30/10/2020**	**02/11/2020**	**4**
385	**BB2 - Bonifica bellica profonda**	**02/12/2020**	**04/12/2020**	**3**
387	**BB3 - Bonifica bellica - Collaudo GM e acquisiz. Certificazione**	**05/12/2020**	**03/01/2021**	**30**
389	**BB01.EE0**	**03/08/2022**	**07/09/2022**	**36**
390	**MLS - Milestones Generali**	**03/08/2022**	**03/08/2022**	**0**
393	**BB1 - Bonifica bellica superficiale**	**03/08/2022**	**04/08/2022**	**2**
395	**BB2 - Bonifica bellica profonda**	**05/08/2022**	**08/08/2022**	**4**
397	**BB3 - Bonifica bellica - Collaudo GM e acquisiz. Certificazione**	**09/08/2022**	**07/09/2022**	**30**
399	**NUOVA VIABILITA' E VIABILITA' INTERFERITA**	**11/08/2020**	**12/02/2025**	**1647**
400	**NV01 - Viabilità accesso Stazione Hirpinia**	**11/08/2020**	**10/08/2022**	**730**
401	**NV01 - Intera Opera**	**11/08/2020**	**10/08/2022**	**730**
402	**NV01 - Intera Opera**	**11/08/2020**	**10/08/2022**	**730**
403	**BOE - Bonifica da Ordigni Esplosivi (Collaudo Genio Militare)**	**21/10/2020**	**21/10/2020**	**0**
405	**RSN - Risoluzione interferenze SNAM**	**11/08/2020**	**10/08/2022**	**730**
406	NV01 - Metanodotto interrato DN150 75 bar (Interf. n.: 3-4-5-6-12-15-22) - Iter autorizzativ	11/08/2020	16/06/2021	310
407	NV01 - Metanodotto interrato DN150 75 bar (Interf. n.: 3-4-5-6-12-15) - Fase definitiva	17/06/2021	10/08/2022	420
408	NV01 - Metanodotto interrato DN150 75 bar (Interf. n.: 22) - Fase definitiva	17/06/2021	10/08/2022	420
409	**RTT - Risoluzione interferenze TELECOM/TIM**	**11/08/2020**	**03/12/2020**	**115**
410	NV01 - Risoluzione interferenze TIM (Interf. n.: 8-21-24) - Iter autorizzativo/progettuale	11/08/2020	24/09/2020	45
411	NV01 - Risoluzione interferenze TIM (Interf. n.: 8)	25/09/2020	03/12/2020	70
412	NV01 - Risoluzione interferenze TIM (Interf. n.: 21-24)	25/09/2020	03/12/2020	70
413	**RCU - Risoluzione interferenze Consorzio di Bonifica UFITA**	**11/08/2020**	**03/12/2020**	**115**
414	NV01 - Risoluzione interferenze Consorzio di bonifica UFITA - Iter autorizzativo/progettuale	11/08/2020	24/09/2020	45
415	NV01 - Risoluzione interferenze Consorzio di bonifica UFITA (Interf. n.: 9-11-14-19-29-31-36	25/09/2020	03/12/2020	70
416	**REN - Risoluzione interferenze E-Distribuzione**	**11/08/2020**	**03/12/2020**	**115**
417	NV01 - Risoluzione interferenze E-Distribuzione - Iter autorizzativo/progettuale	11/08/2020	24/09/2020	45
418	NV01 - Risoluzione interferenze E-Distribuzione (Interf. n.: 10-17-20-23-25-26-27-28-33-34-	25/09/2020	03/12/2020	70
419	**RPP - Risoluzione interferenze Pozzi Privati**	**17/08/2020**	**25/09/2020**	**40**
420	NV01 - Risoluzione interferenze Pozzi Privati - (Interferenza n. 30)	17/08/2020	28/08/2020	12
421	NV01 - Risoluzione interferenze Pozzi Privati - (Interferenza n. 32)	31/08/2020	11/09/2020	12

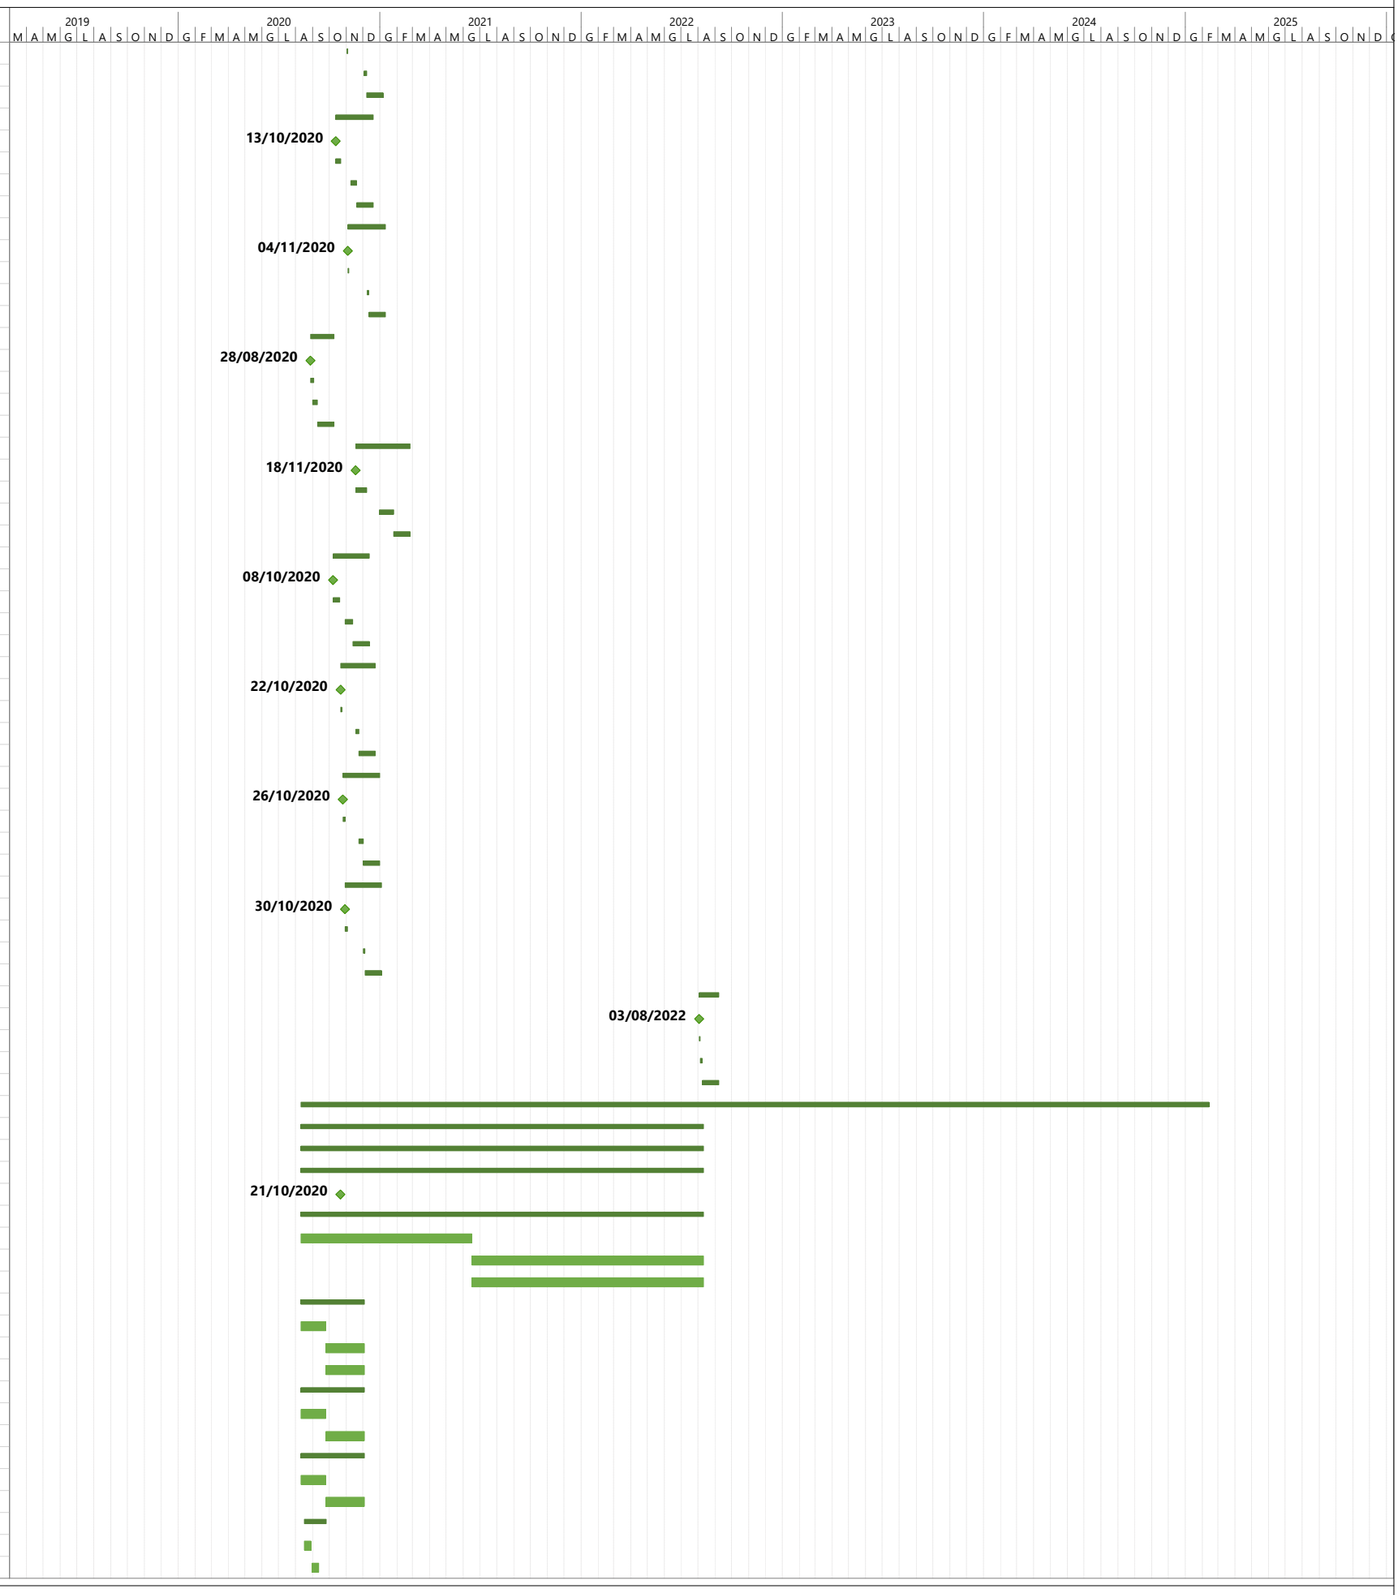

Attività Milestones Riepilogo

ID	Nome attività	Inizio	Fine	Durata gg solari
422	NV01 - Risoluzione interferenze Pozzi Privati - (Interferenza n. 38)	14/09/2020	25/09/2020	12
423	**CAN - Attività di Cantierizzazione**	**04/12/2020**	**11/12/2020**	**8**
425	**NV01A - Viabilità Stazione Irpinia - Rotatoria 1 R=50 m - Asse 1 - Adeguamento innesto rotatoria**	**14/12/2020**	**18/02/2021**	**67**
426	**NV01 - Rotatoria 1**	**14/12/2020**	**17/02/2021**	**66**
427	**RSN - Risoluzione interferenze SNAM**	**28/12/2020**	**01/02/2021**	**36**
430	**CAN - Attività di Cantierizzazione**	**14/12/2020**	**20/01/2021**	**38**
433	**NI3 - Movimenti di terra**	**16/12/2020**	**09/02/2021**	**56**
442	**NIA - Piattaforma stradale**	**08/01/2021**	**16/02/2021**	**40**
453	**NIB - Opere di finitura**	**15/01/2021**	**17/02/2021**	**34**
456	**NV01 - Asse 1**	**28/12/2020**	**18/02/2021**	**53**
457	**NI3 - Movimenti di terra**	**28/12/2020**	**10/02/2021**	**45**
464	**NIA - Piattaforma stradale**	**12/01/2021**	**17/02/2021**	**37**
473	**NIB - Opere di finitura**	**18/01/2021**	**18/02/2021**	**32**
476	**NV01B - Viabilità Stazione Irpinia - Rotatoria 2 R=20 m - Asse 2 - Adeguamento innesto rotatoria**	**29/12/2020**	**25/03/2021**	**87**
477	**NV01 - Asse 2**	**29/12/2020**	**19/02/2021**	**53**
478	**NI3 - Movimenti di terra**	**29/12/2020**	**11/02/2021**	**45**
485	**NIA - Piattaforma stradale**	**13/01/2021**	**18/02/2021**	**37**
494	**NIB - Opere di finitura**	**19/01/2021**	**19/02/2021**	**32**
497	**NV01 - Rotatoria 2**	**02/03/2021**	**25/03/2021**	**24**
498	**NI3 - Movimenti di terra**	**02/03/2021**	**12/03/2021**	**11**
503	**NIA - Piattaforma stradale**	**16/03/2021**	**22/03/2021**	**7**
509	**NIB - Opere di finitura**	**25/03/2021**	**25/03/2021**	**1**
511	**NV01C - Viabilità Stazione Irpinia - Asse 1 - Adeguamento innesto rotatoria**	**18/03/2021**	**07/04/2021**	**21**
512	**NV01 - Rotatoria 3**	**18/03/2021**	**07/04/2021**	**21**
513	**NI3 - Movimenti di terra**	**18/03/2021**	**29/03/2021**	**12**
518	**NIA - Piattaforma stradale**	**30/03/2021**	**06/04/2021**	**8**
524	**NIB - Opere di finitura**	**07/04/2021**	**07/04/2021**	**1**
526	**NV01D - Viabilità Stazione Irpinia - Asse 2 - Adeguamento innesto rotatoria**	**29/03/2021**	**15/04/2021**	**18**
527	**NV01 - Rotatoria 4**	**29/03/2021**	**15/04/2021**	**18**
528	**NI3 - Movimenti di terra**	**29/03/2021**	**07/04/2021**	**10**
533	**NIA - Piattaforma stradale**	**08/04/2021**	**14/04/2021**	**7**
539	**NIB - Opere di finitura**	**15/04/2021**	**15/04/2021**	**1**
541	**NV01E - Viabilità Stazione Irpinia - Asse 3 -Lung.=1216 m**	**26/01/2021**	**24/03/2021**	**58**
542	**NV01 - Asse 3**	**26/01/2021**	**24/03/2021**	**58**
543	**RSN - Risoluzione interferenze SNAM**	**02/02/2021**	**22/02/2021**	**21**
545	**NI3 - Movimenti di terra**	**26/01/2021**	**11/03/2021**	**45**
550	**NIA - Piattaforma stradale**	**12/03/2021**	**19/03/2021**	**8**
556	**NIB - Opere di finitura**	**22/03/2021**	**24/03/2021**	**3**
558	**NV01F - Viabilità Stazione Irpinia - Asse 4 -Lung.=325 m**	**09/03/2021**	**01/04/2021**	**24**
559	**NV01 - Asse 4**	**09/03/2021**	**01/04/2021**	**24**
560	**NI3 - Movimenti di terra**	**09/03/2021**	**24/03/2021**	**16**
565	**NIA - Piattaforma stradale**	**25/03/2021**	**31/03/2021**	**7**
571	**NIB - Opere di finitura**	**01/04/2021**	**01/04/2021**	**1**
573	**NV01G - Viabilità Stazione Irpinia - Asse 6 -Lung.=160 m**	**24/03/2021**	**12/04/2021**	**20**
574	**NV01 - Asse 6**	**24/03/2021**	**12/04/2021**	**20**
575	**NI3 - Movimenti di terra**	**24/03/2021**	**01/04/2021**	**9**
580	**NIA - Piattaforma stradale**	**02/04/2021**	**09/04/2021**	**8**
586	**NIB - Opere di finitura**	**12/04/2021**	**12/04/2021**	**1**
588	**NV01H - Viabilità Stazione Irpinia - Asse 8 -Lung.=167 m**	**02/04/2021**	**22/04/2021**	**21**
589	**NV01 - Asse 8**	**02/04/2021**	**22/04/2021**	**21**
590	**NI3 - Movimenti di terra**	**02/04/2021**	**14/04/2021**	**13**
595	**NIA - Piattaforma stradale**	**15/04/2021**	**21/04/2021**	**7**
601	**NIB - Opere di finitura**	**22/04/2021**	**22/04/2021**	**1**
603	**NV01I - Viabilità Stazione Irpinia - accesso ai fondi**	**14/12/2020**	**08/01/2021**	**26**
604	**NV01 - Viabilità di accesso ai fondi**	**14/12/2020**	**08/01/2021**	**26**
605	**NI3 - Movimenti di terra**	**14/12/2020**	**30/12/2020**	**17**
608	**NIA - Piattaforma stradale**	**31/12/2020**	**07/01/2021**	**8**
612	**NIB - Opere di finitura**	**08/01/2021**	**08/01/2021**	**1**
614	**NV02 - Viabilità accesso Stazione Hirpinia**	**04/11/2024**	**28/01/2025**	**86**
615	**NV02A - a servizio dei parcheggi di stazione - Asse 5 Larg.=9.50 m -Lung.=270 m**	**04/11/2024**	**27/11/2024**	**24**
629	**NV02B - a servizio di RFI e accesso a strada campestre - Asse 7 Larg.=9.50 m -Lung.=780 m**	**25/11/2024**	**21/01/2025**	**58**
643	**NV02C - a servizio di stazione - Asse 9 Larg.=6.50 m -Lung.=370 m**	**15/11/2024**	**09/12/2024**	**25**
658	**NV02D - strada campestre - Asse 10 Larg.=4.00 m -Lung.=430 m**	**16/12/2024**	**28/01/2025**	**44**
672	**NV03 -Viabilità di accesso RI51 L=6.5m**	**13/01/2025**	**12/02/2025**	**31**
673	**NV03A -Viabilità di accesso RI51 L=6.5m**	**13/01/2025**	**12/02/2025**	**31**
688	**NV04 -Viabilità di accesso RI52 L=6.5m**	**17/12/2020**	**28/05/2021**	**163**
689	**NI04 - Intera Opera**	**17/12/2020**	**08/03/2021**	**82**
690	**NI04 - Intera Opera**	**17/12/2020**	**08/03/2021**	**82**
691	**BOE - Bonifica da Ordigni Esplosivi (Collaudo Genio Militare)**	**17/12/2020**	**17/12/2020**	**0**
693	**RPP - Risoluzione interferenze Pozzi Privati**	**23/02/2021**	**08/03/2021**	**14**

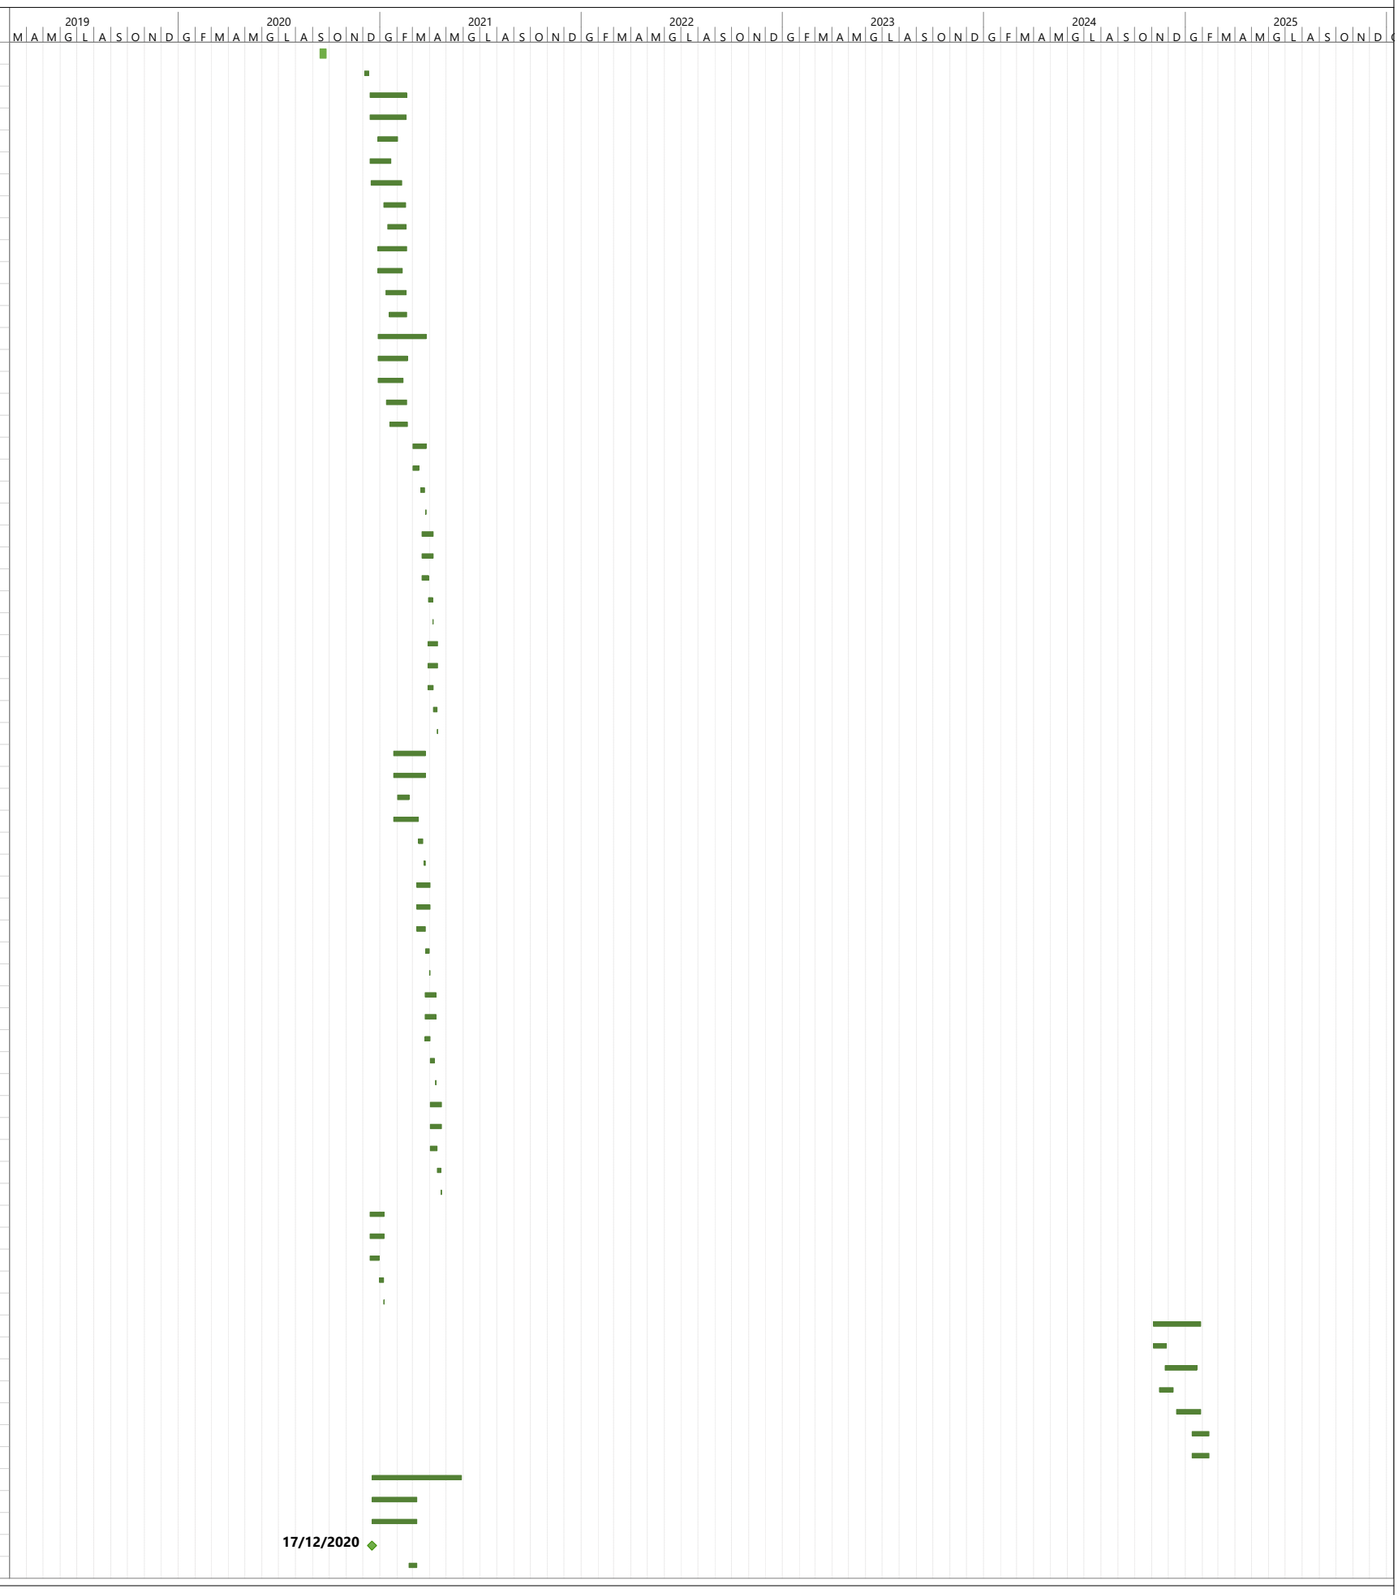

Attività Milestones Riepilogo

ID	Nome attività	Inizio	Fine	Durata gg solari
695	**NV04A -Viabilità di accesso RI52 L=6.5m**	**09/03/2021**	**28/05/2021**	**81**
696	**NV04A - Intero Tratto d'Opera Opera**	**09/03/2021**	**28/05/2021**	**81**
697	**NI3 - Movimenti di terra**	**09/03/2021**	**10/05/2021**	**63**
703	**NI7 - Opere di sostegno**	**11/03/2021**	**05/05/2021**	**56**
720	**NIA - Piattaforma stradale**	**11/05/2021**	**14/05/2021**	**4**
725	**NIB - Opere di finitura**	**17/05/2021**	**28/05/2021**	**12**
727	**NV05 - Viabilità di accesso RI53 L=6.5m**	**28/11/2020**	**18/12/2024**	**1482**
728	**NI05 - Intera Opera**	**28/11/2020**	**28/11/2020**	**0**
729	**NI05 - Intera Opera**	**28/11/2020**	**28/11/2020**	**0**
730	**BOE - Bonifica da Ordigni Esplosivi (Collaudo Genio Militare)**	**28/11/2020**	**28/11/2020**	**0**
732	**NV05A - Viabilità di accesso RI53 L=6.5m**	**08/02/2021**	**18/12/2024**	**1410**
733	**NV05A - Intero Tratto d'Opera Opera**	**08/02/2021**	**18/12/2024**	**1410**
777	**NV07 - Viabilità di accesso RI54 L=6.5m**	**28/02/2021**	**24/01/2022**	**331**
778	**NV07 - Intera Opera**	**28/02/2021**	**20/10/2021**	**235**
779	**NV07 - Intera Opera**	**28/02/2021**	**20/10/2021**	**235**
780	**BOE - Bonifica da Ordigni Esplosivi (Collaudo Genio Militare)**	**28/02/2021**	**28/02/2021**	**0**
782	**RTT - Risoluzione interferenze TELECOM/TIM**	**21/06/2021**	**20/10/2021**	**122**
785	**NV07A - Viabilità di accesso RI54 L=6.5m**	**21/10/2021**	**24/01/2022**	**96**
841	**NV08 - Viabilità di accesso RI55 L=6.5m**	**04/10/2020**	**30/03/2021**	**178**
842	**NV08 - Intera Opera**	**04/10/2020**	**05/02/2021**	**125**
843	**NV08 - Intero Tratto d'Opera Opera**	**04/10/2020**	**05/02/2021**	**125**
844	**BOE - Bonifica da Ordigni Esplosivi (Collaudo Genio Militare)**	**01/01/2021**	**01/01/2021**	**0**
846	**RTT - Risoluzione interferenze TELECOM/TIM**	**04/10/2020**	**05/02/2021**	**125**
847	NV08 - Risoluzione interferenze TIM (Interf. n.: 127) - Iter autorizzativo/progettuale	04/10/2020	17/11/2020	45
848	NV08 - Risoluzione interferenze TIM (Interf. n.: 127)	18/11/2020	05/02/2021	80
849	**REN - Risoluzione interferenze E-Distribuzione**	**04/10/2020**	**05/02/2021**	**125**
850	NV08 - Risoluzione interferenze E-Distribuzione - Iter autorizzativo/progettuale	04/10/2020	17/11/2020	45
851	NV08 - Risoluzione interferenze E-Distribuzione (Interf. n.: 130)	18/11/2020	05/02/2021	80
852	**NV08A - Viabilità di accesso RI55 L=6.5m**	**08/02/2021**	**30/03/2021**	**51**
853	**NV08A - Intero Tratto d'Opera Opera**	**08/02/2021**	**30/03/2021**	**51**
892	**NV09 - Viabilità di accesso RI56 L=6.5m**	**05/03/2021**	**04/07/2022**	**487**
893	**NV09 - Intera Opera**	**05/03/2021**	**15/06/2022**	**468**
894	**NV09 - Intera Opera**	**05/03/2021**	**15/06/2022**	**468**
895	**BOE - Bonifica da Ordigni Esplosivi (Collaudo Genio Militare)**	**05/03/2021**	**05/03/2021**	**0**
897	**REN - Risoluzione interferenze E-Distribuzione**	**18/02/2022**	**15/06/2022**	**118**
900	**NV09A - Viabilità di accesso RI56 L=6.5m**	**16/06/2022**	**04/07/2022**	**19**
914	**NV10 - Viabilità di accesso ai piazzali**	**08/02/2021**	**24/02/2021**	**17**
915	**NV10A - Viabilità di accesso ai piazzali**	**08/02/2021**	**24/02/2021**	**17**
916	**NV10A - Intero Tratto d'Opera Opera**	**08/02/2021**	**24/02/2021**	**17**
917	**NI3 - Movimenti di terra**	**08/02/2021**	**16/02/2021**	**9**
922	**NIA - Piattaforma stradale**	**17/02/2021**	**22/02/2021**	**6**
927	**NIB - Opere di finitura**	**23/02/2021**	**24/02/2021**	**2**
929	**NV11 - Viabilità di accesso RI57 L=6.5m**	**19/10/2020**	**21/07/2021**	**276**
930	**NV11 - Intera Opera**	**19/10/2020**	**22/02/2021**	**127**
931	**NV11 - Intera Opera**	**19/10/2020**	**22/02/2021**	**127**
932	**RTT - Risoluzione interferenze TELECOM/TIM**	**19/10/2020**	**22/02/2021**	**127**
933	NV11 - Risoluzione interferenze TIM (Interf. n.: 83Bis) - Iter autorizzativo/progettuale	19/10/2020	02/12/2020	45
934	NV11 - Risoluzione interferenze TIM (Interf. n.: 83Bis)	03/12/2020	22/02/2021	82
935	**NV11A - Viabilità di accesso RI57 L=6.5m**	**23/02/2021**	**21/07/2021**	**149**
936	**NV11A - Intero Tratto d'Opera Opera**	**23/02/2021**	**21/07/2021**	**149**
988	**NV12 - Viabilità di accesso RI58 L=6.5m**	**06/12/2020**	**19/04/2021**	**135**
989	**NV12 - Intera Opera**	**06/12/2020**	**30/03/2021**	**115**
990	**NV12 - Intero Tratto d'Opera Opera**	**06/12/2020**	**30/03/2021**	**115**
991	**BOE - Bonifica da Ordigni Esplosivi (Collaudo Genio Militare)**	**06/01/2021**	**06/01/2021**	**0**
993	**RTT - Risoluzione interferenze TELECOM/TIM**	**06/12/2020**	**30/03/2021**	**115**
994	NV12 - Risoluzione interferenze TIM (Interf. n.: 83) - Iter autorizzativo/progettuale	06/12/2020	19/01/2021	45
995	NV12 - Risoluzione interferenze TIM (Interf. n.: 83)	20/01/2021	30/03/2021	70
996	**REN - Risoluzione interferenze E-Distribuzione**	**06/12/2020**	**30/03/2021**	**115**
997	NV12 - Risoluzione interferenze E-Distribuzione - Iter autorizzativo/progettuale	06/12/2020	19/01/2021	45
998	NV12 - Risoluzione interferenze E-Distribuzione (Interf. n.: 80-81-82)	20/01/2021	30/03/2021	70
999	**NV12A - Viabilità di accesso RI58 L=6.5m**	**09/03/2021**	**19/04/2021**	**42**
1029	**NV13 - Viabilità di accesso RI59 L=6.5m**	**19/12/2020**	**26/02/2021**	**70**
1030	**NI13 - Intera Opera**	**19/12/2020**	**05/02/2021**	**49**
1031	**NI13 - Intera Opera**	**19/12/2020**	**05/02/2021**	**49**
1032	**BOE - Bonifica da Ordigni Esplosivi (Collaudo Genio Militare)**	**19/12/2020**	**19/12/2020**	**0**
1034	**RAL - Risoluzione interferenze arboree**	**25/01/2021**	**05/02/2021**	**12**
1035	NV13 - Risoluzione interferenze arboree - (Interferenza n. 91)	25/01/2021	05/02/2021	12
1036	**NV13A - Viabilità di accesso RI59 L=6.5m**	**08/02/2021**	**26/02/2021**	**19**
1050	**NV14 - Viabilità di accesso RI60 L=4m**	**10/01/2021**	**21/06/2021**	**163**
1051	**NI14 - Intera Opera**	**10/01/2021**	**08/03/2021**	**58**

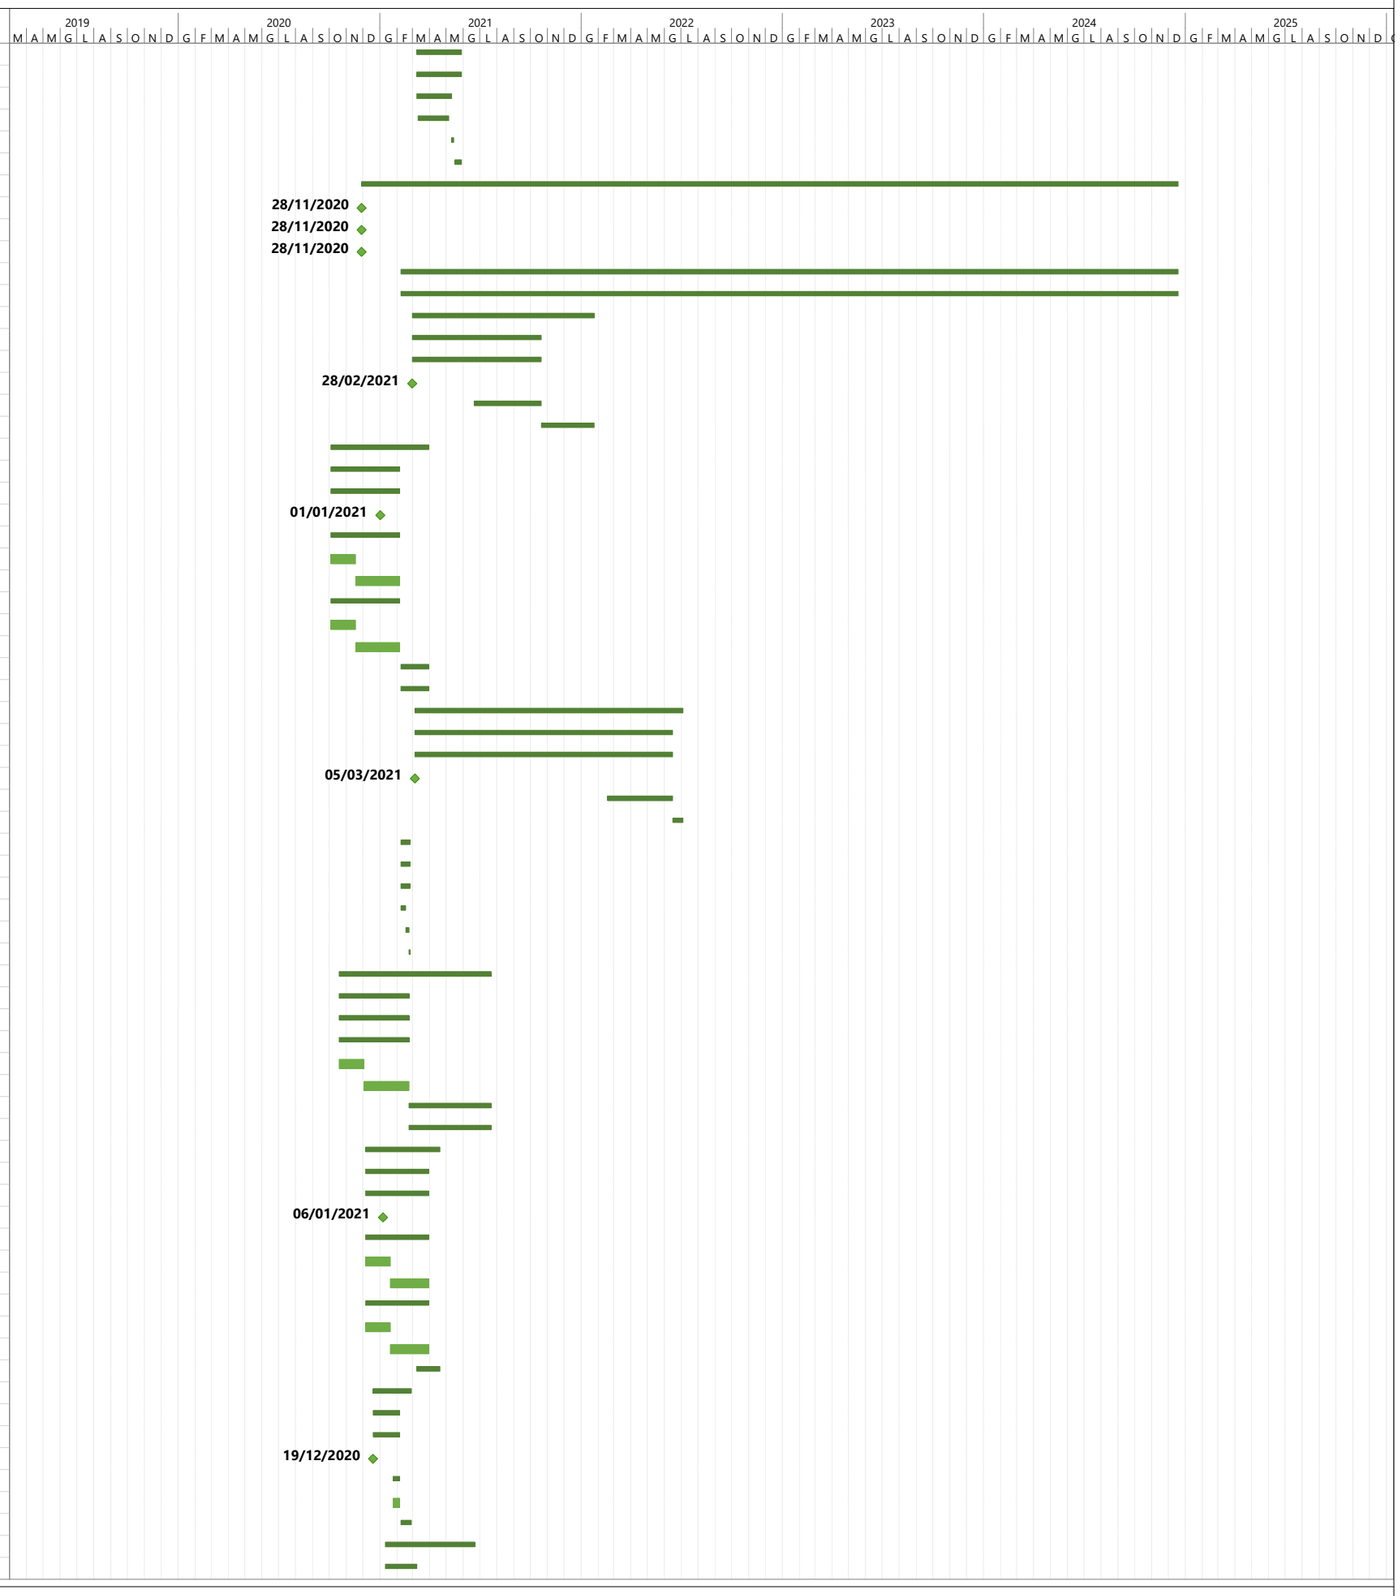

Attività Milestones Riepilogo

ID	Nome attività	Inizio	Fine	Durata gg solari
1052	**NI14 - Intera Opera**	**10/01/2021**	**08/03/2021**	**58**
1053	**BOE - Bonifica da Ordigni Esplosivi (Collaudo Genio Militare)**	**10/01/2021**	**10/01/2021**	**0**
1055	**RPP - Risoluzione interferenze Pozzi Privati**	**23/02/2021**	**08/03/2021**	**14**
1056	NV14 - Risoluzione interferenze Pozzi Privati - (Interferenza n. 125)	23/02/2021	08/03/2021	14
1057	**RCO - Risoluzione interferenze Consulsat**	**05/02/2021**	**08/03/2021**	**32**
1058	NV14 - Risoluzione interferenza Ripetitore Telefonico - (Interferenza n. 126)	05/02/2021	08/03/2021	32
1059	**NV14A - Viabilità di accesso RI60 L=4m**	**09/03/2021**	**21/06/2021**	**105**
1115	**NV15 - Viabilità di accesso RI61 L=6.5m**	**15/10/2024**	**04/11/2024**	**21**
1116	**NV15A - Viabilità di accesso RI61 L=6.5m**	**15/10/2024**	**04/11/2024**	**21**
1130	**NV16 - Viabilità fermata di Apice**	**11/08/2020**	**04/01/2024**	**1242**
1131	**NI16 - Intera Opera**	**11/08/2020**	**25/10/2023**	**1171**
1132	**NI16 - Intera Opera**	**11/08/2020**	**25/10/2023**	**1171**
1133	**RTT - Risoluzione interferenze TELECOM/TIM**	**11/08/2020**	**03/12/2020**	**115**
1134	NV16 - Risoluzione interferenze TIM (Interf. n.: 116) - Iter autorizzativo/progettuale	11/08/2020	24/09/2020	45
1135	NV16 - Risoluzione interferenze TIM (Interf. n.: 116)	25/09/2020	03/12/2020	70
1136	**RCM - Risoluzione interferenza contatori**	**17/08/2020**	**15/09/2020**	**30**
1137	NV16 - Risoluzione interferenza contatori - (Interferenza n. 118)	17/08/2020	15/09/2020	30
1138	**RIL - Risoluzione interferenze Illuminazione Pubblica**	**26/09/2023**	**25/10/2023**	**30**
1140	**NV16A - Viabilità fermata di Apice**	**26/10/2023**	**04/01/2024**	**71**
1178	**VIADOTTI**	**11/08/2020**	**02/12/2025**	**1940**
1179	**VI01 - VIADOTTO UFITA HIRPINIA - dal km 1+765,00 al km 2+420,00**	**11/08/2020**	**30/11/2023**	**1207**
1180	**VI01 - Intera Opera**	**11/08/2020**	**10/08/2022**	**730**
1181	**VI01 - Intera Opera**	**11/08/2020**	**10/08/2022**	**730**
1182	**BOE - Bonifica da Ordigni Esplosivi (Collaudo Genio Militare)**	**09/11/2020**	**09/11/2020**	**0**
1183	VI01 - BOE - Collaudo del Genio Militare - ACQUISITO	09/11/2020	09/11/2020	0
1184	**RSN - Risoluzione interferenze SNAM**	**11/08/2020**	**10/08/2022**	**730**
1185	VI01 - Metanodotto interrato DN150 75 bar (Interf. n.: 39-47-49-51-52-53-54) - Iter autoriz	11/08/2020	16/06/2021	310
1186	VI01 - Metanodotto interrato DN150 75 bar (Interf. n.: 39-47-49-51-52-53-54) - Fase definit	17/06/2021	10/08/2022	420
1187	**REN - Risoluzione interferenze E-Distribuzione**	**11/08/2020**	**03/12/2020**	**115**
1188	VI01 - Risoluzione interferenze E-Distribuzione - Iter autorizzativo/progettuale	11/08/2020	24/09/2020	45
1189	VI01 - Risoluzione interferenze E-Distribuzione (Interf. n.: 50)	25/09/2020	03/12/2020	70
1190	**CAN - Attività di Cantierizzazione**	**09/11/2020**	**13/11/2020**	**5**
1192	**VI01A - da spalla "A" a pila P11 (e n° 12 impalcati L=25m D.B. in C.A.P.)**	**16/11/2020**	**30/11/2023**	**1110**
1193	**VI01 - Da Spalla A a Pila 3**	**30/11/2020**	**10/12/2020**	**11**
1194	**VI3 - Fondazioni**	**30/11/2020**	**10/12/2020**	**11**
1196	**VI01 - Spalla A**	**16/11/2020**	**18/05/2021**	**184**
1197	**VI2 - Pali e pozzi**	**16/11/2020**	**14/12/2020**	**29**
1201	**VI3 - Fondazioni**	**22/02/2021**	**15/04/2021**	**53**
1207	**VI4 - Spalle**	**16/04/2021**	**13/05/2021**	**28**
1219	**VI7 - Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)**	**14/05/2021**	**18/05/2021**	**5**
1221	**VI01 - Pila 1**	**20/11/2020**	**14/05/2021**	**176**
1222	**VI2 - Pali e pozzi**	**20/11/2020**	**15/12/2020**	**26**
1226	**VI3 - Fondazioni**	**19/02/2021**	**04/04/2021**	**45**
1232	**VI5 - Pile**	**16/04/2021**	**24/04/2021**	**9**
1237	**VI6 - Pulvini**	**26/04/2021**	**11/05/2021**	**16**
1242	**VI7 - Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)**	**12/05/2021**	**14/05/2021**	**3**
1244	**VI01 - Pila 2**	**25/11/2020**	**14/05/2021**	**171**
1245	**VI2 - Pali e pozzi**	**25/11/2020**	**16/12/2020**	**22**
1249	**VI3 - Fondazioni**	**18/02/2021**	**28/03/2021**	**39**
1255	**VI5 - Pile**	**16/04/2021**	**24/04/2021**	**9**
1260	**VI6 - Pulvini**	**26/04/2021**	**11/05/2021**	**16**
1265	**VI7 - Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)**	**12/05/2021**	**14/05/2021**	**3**
1267	**VI01 - Pila 3**	**30/11/2020**	**07/06/2021**	**190**
1268	**VI2 - Pali e pozzi**	**30/11/2020**	**11/01/2021**	**43**
1277	**VI3 - Fondazioni**	**10/12/2020**	**21/03/2021**	**102**
1285	**VI5 - Pile**	**26/04/2021**	**16/05/2021**	**21**
1294	**VI6 - Pulvini**	**17/05/2021**	**01/06/2021**	**16**
1299	**VI7 - Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)**	**03/06/2021**	**07/06/2021**	**5**
1301	**VI01 - Pila 4**	**10/12/2020**	**07/06/2021**	**180**
1302	**VI2 - Pali e pozzi**	**10/12/2020**	**19/01/2021**	**41**
1311	**VI3 - Fondazioni**	**28/12/2020**	**13/03/2021**	**76**
1319	**VI5 - Pile**	**26/04/2021**	**16/05/2021**	**21**
1328	**VI6 - Pulvini**	**17/05/2021**	**02/06/2021**	**17**
1333	**VI7 - Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)**	**03/06/2021**	**07/06/2021**	**5**
1335	**VI01 - Pila 5**	**28/12/2020**	**30/06/2021**	**185**
1336	**VI2 - Pali e pozzi**	**28/12/2020**	**28/01/2021**	**32**
1345	**VI3 - Fondazioni**	**08/01/2021**	**05/03/2021**	**57**
1353	**VI5 - Pile**	**17/05/2021**	**09/06/2021**	**24**
1362	**VI6 - Pulvini**	**10/06/2021**	**27/06/2021**	**18**
1367	**VI7 - Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)**	**28/06/2021**	**30/06/2021**	**3**

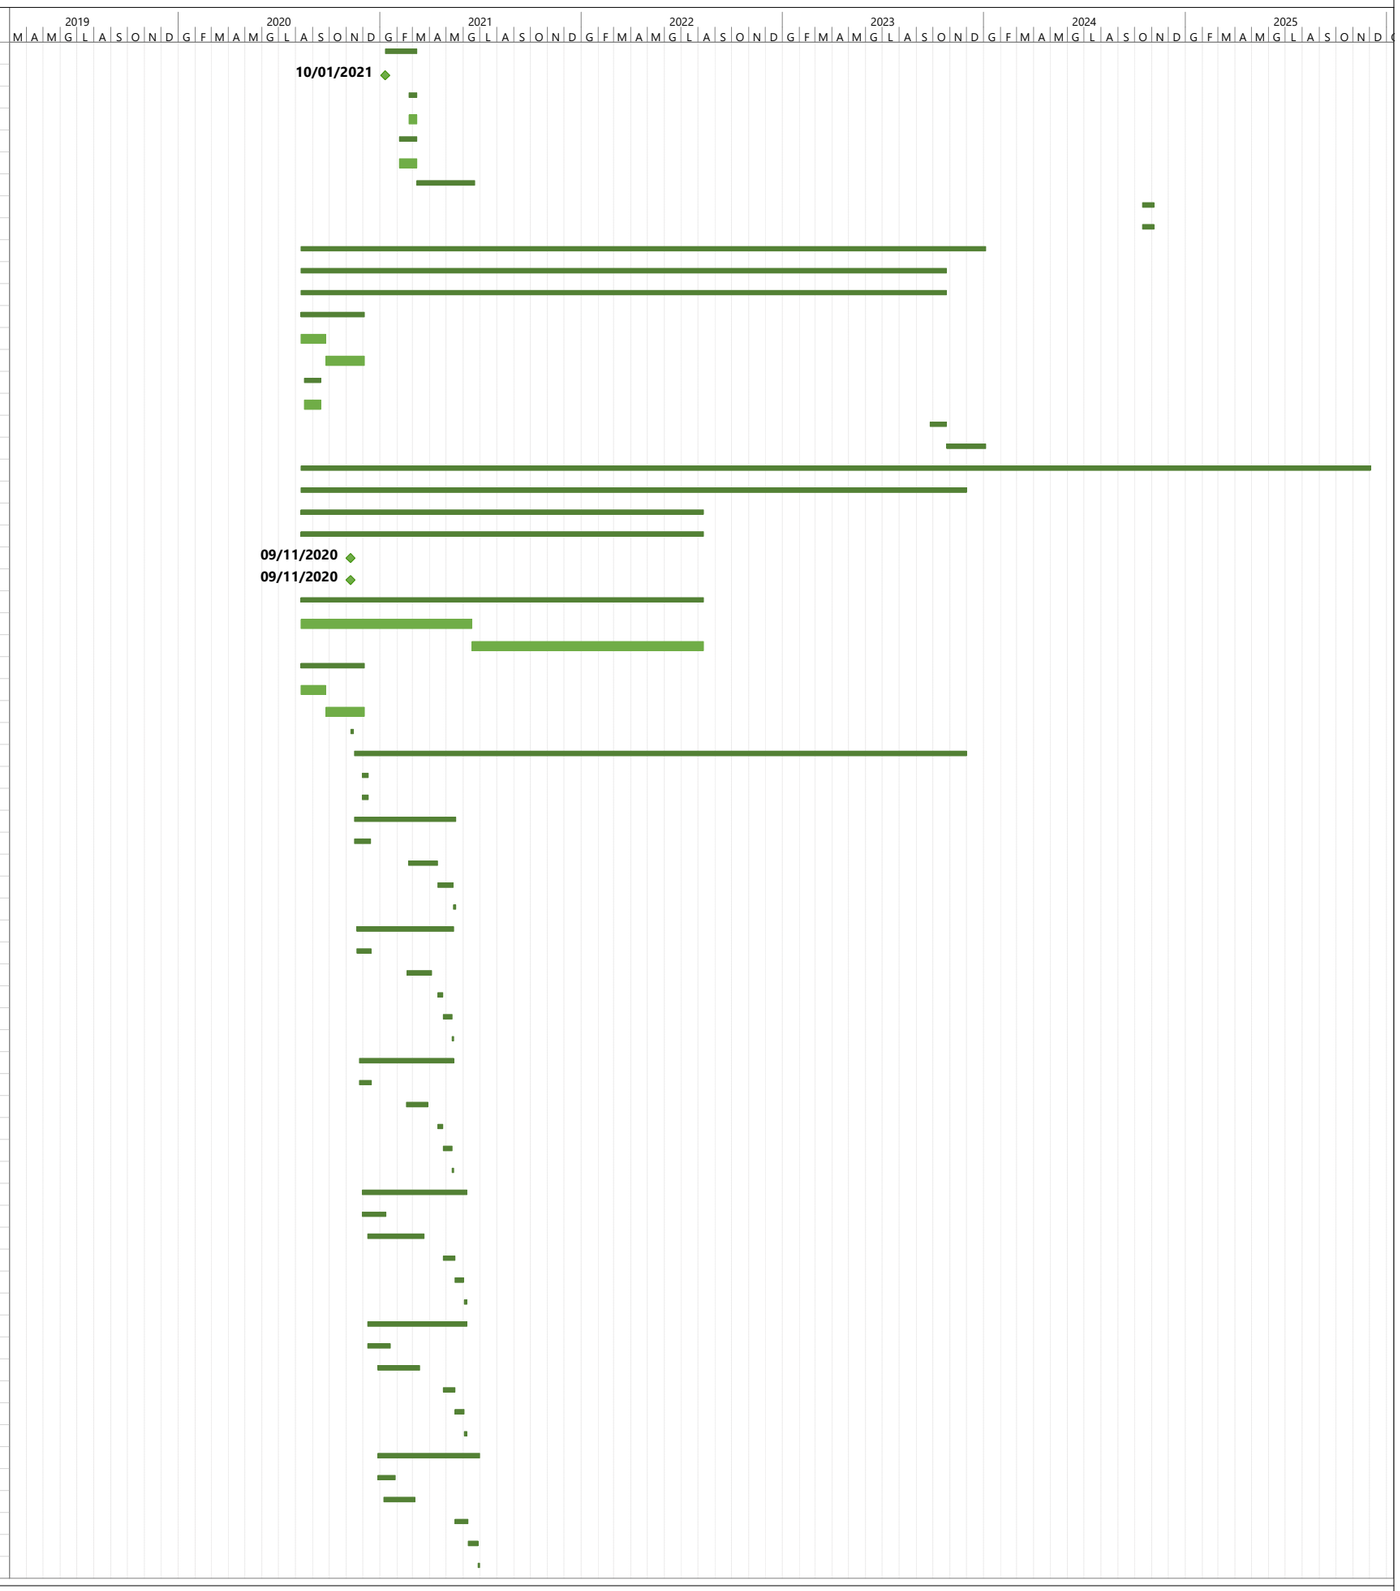

Attività Milestones Riepilogo

ID	Nome attività	Inizio	Fine	Durata gg solari
1369	**VI01 - Pila 6**	**08/01/2021**	**28/06/2021**	**172**
1370	**VI2 - Pali e pozzi**	**08/01/2021**	**11/02/2021**	**35**
1380	**VI3 - Fondazioni**	**22/01/2021**	**25/02/2021**	**35**
1388	**VI5 - Pile**	**17/05/2021**	**06/06/2021**	**21**
1397	**VI6 - Pulvini**	**08/06/2021**	**23/06/2021**	**16**
1402	**VI7 - Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)**	**24/06/2021**	**28/06/2021**	**5**
1404	**VI01 - Pila 7**	**11/08/2022**	**29/12/2022**	**141**
1405	**VI2 - Pali e pozzi**	**11/08/2022**	**12/09/2022**	**33**
1414	**VI3 - Fondazioni**	**24/08/2022**	**25/11/2022**	**94**
1422	**VI5 - Pile**	**28/11/2022**	**04/12/2022**	**7**
1427	**VI6 - Pulvini**	**05/12/2022**	**21/12/2022**	**17**
1432	**VI7 - Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)**	**27/12/2022**	**29/12/2022**	**3**
1434	**VI01 - Pila 8**	**24/08/2022**	**19/12/2022**	**118**
1435	**VI2 - Pali e pozzi**	**24/08/2022**	**16/09/2022**	**24**
1444	**VI3 - Fondazioni**	**30/08/2022**	**18/11/2022**	**81**
1452	**VI5 - Pile**	**21/11/2022**	**27/11/2022**	**7**
1457	**VI6 - Pulvini**	**28/11/2022**	**14/12/2022**	**17**
1462	**VI7 - Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)**	**15/12/2022**	**19/12/2022**	**5**
1464	**VI01 - Pila 9**	**30/08/2022**	**13/01/2023**	**137**
1465	**VI2 - Pali e pozzi**	**30/08/2022**	**29/09/2022**	**31**
1475	**VI3 - Fondazioni**	**09/09/2022**	**11/11/2022**	**64**
1483	**VI5 - Pile**	**14/11/2022**	**04/12/2022**	**21**
1493	**VI6 - Pulvini**	**19/12/2022**	**10/01/2023**	**23**
1498	**VI7 - Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)**	**11/01/2023**	**13/01/2023**	**3**
1500	**VI01 - Pila 10**	**05/09/2022**	**26/01/2023**	**144**
1501	**VI2 - Pali e pozzi**	**05/09/2022**	**04/10/2022**	**30**
1511	**VI3 - Fondazioni**	**14/09/2022**	**02/11/2022**	**50**
1519	**VI5 - Pile**	**05/12/2022**	**04/01/2023**	**31**
1529	**VI6 - Pulvini**	**05/01/2023**	**23/01/2023**	**19**
1534	**VI7 - Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)**	**24/01/2023**	**26/01/2023**	**3**
1536	**VI01 - Pila 11**	**09/09/2022**	**06/02/2023**	**151**
1537	**VI2 - Pali e pozzi**	**09/09/2022**	**10/10/2022**	**32**
1547	**VI3 - Fondazioni**	**20/09/2022**	**23/10/2022**	**34**
1555	**VI5 - Pile**	**05/12/2022**	**04/01/2023**	**31**
1565	**VI6 - Pulvini**	**16/01/2023**	**01/02/2023**	**17**
1570	**VI7 - Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)**	**02/02/2023**	**06/02/2023**	**5**
1572	**VI01 - Impalcato 1 - da Spalla A a Pila 1**	**19/05/2021**	**30/05/2021**	**12**
1573	**VI7 - Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)**	**19/05/2021**	**21/05/2021**	**3**
1576	**VI9 - Soletta di completamento**	**24/05/2021**	**30/05/2021**	**7**
1580	**VI01 - Impalcato 2 - da Pila 1 a Pila 2**	**17/05/2021**	**06/06/2021**	**21**
1581	**VI7 - Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)**	**17/05/2021**	**19/05/2021**	**3**
1584	**VI9 - Soletta di completamento**	**28/05/2021**	**06/06/2021**	**10**
1588	**VI01 - Impalcato 3 - da Pila 2 a Pila 3**	**08/06/2021**	**19/06/2021**	**12**
1589	**VI7 - Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)**	**08/06/2021**	**10/06/2021**	**3**
1592	**VI9 - Soletta di completamento**	**11/06/2021**	**19/06/2021**	**9**
1596	**VI01 - Impalcato 4 - da Pila 3 a Pila 4**	**11/06/2021**	**25/06/2021**	**15**
1597	**VI7 - Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)**	**11/06/2021**	**15/06/2021**	**5**
1600	**VI9 - Soletta di completamento**	**17/06/2021**	**25/06/2021**	**9**
1604	**VI01 - Impalcato 5 - da Pila 4 a Pila 5**	**01/07/2021**	**14/07/2021**	**14**
1605	**VI7 - Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)**	**01/07/2021**	**05/07/2021**	**5**
1608	**VI9 - Soletta di completamento**	**06/07/2021**	**14/07/2021**	**9**
1612	**VI01 - Impalcato 6 - da Pila 5 a Pila 6**	**06/07/2021**	**18/07/2021**	**13**
1613	**VI7 - Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)**	**06/07/2021**	**08/07/2021**	**3**
1616	**VI9 - Soletta di completamento**	**12/07/2021**	**18/07/2021**	**7**
1620	**VI01 - Impalcato 7 - da Pila 6 a Pila 7**	**30/12/2022**	**13/01/2023**	**15**
1621	**VI7 - Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)**	**30/12/2022**	**03/01/2023**	**5**
1624	**VI9 - Soletta di completamento**	**04/01/2023**	**13/01/2023**	**10**
1628	**VI01 - Impalcato 8 - da Pila 7 a Pila 8**	**04/01/2023**	**19/01/2023**	**16**
1629	**VI7 - Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)**	**04/01/2023**	**09/01/2023**	**6**
1632	**VI9 - Soletta di completamento**	**11/01/2023**	**19/01/2023**	**9**
1636	**VI01 - Impalcato 9 - da Pila 8 a Pila 9**	**16/01/2023**	**27/01/2023**	**12**
1637	**VI7 - Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)**	**16/01/2023**	**18/01/2023**	**3**
1640	**VI9 - Soletta di completamento**	**19/01/2023**	**27/01/2023**	**9**
1644	**VI01 - Impalcato 10 - da Pila 9 a Pila 10**	**27/01/2023**	**09/02/2023**	**14**
1645	**VI7 - Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)**	**27/01/2023**	**31/01/2023**	**5**
1648	**VI9 - Soletta di completamento**	**01/02/2023**	**09/02/2023**	**9**
1652	**VI01 - Impalcato 11 - da Pila 10 a Pila 11**	**07/02/2023**	**18/02/2023**	**12**
1653	**VI7 - Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)**	**07/02/2023**	**09/02/2023**	**3**
1656	**VI9 - Soletta di completamento**	**10/02/2023**	**18/02/2023**	**9**
1660	**VI01 - Impalcato 12 - da Pila 11 a Pila 12**	**10/02/2023**	**24/02/2023**	**15**

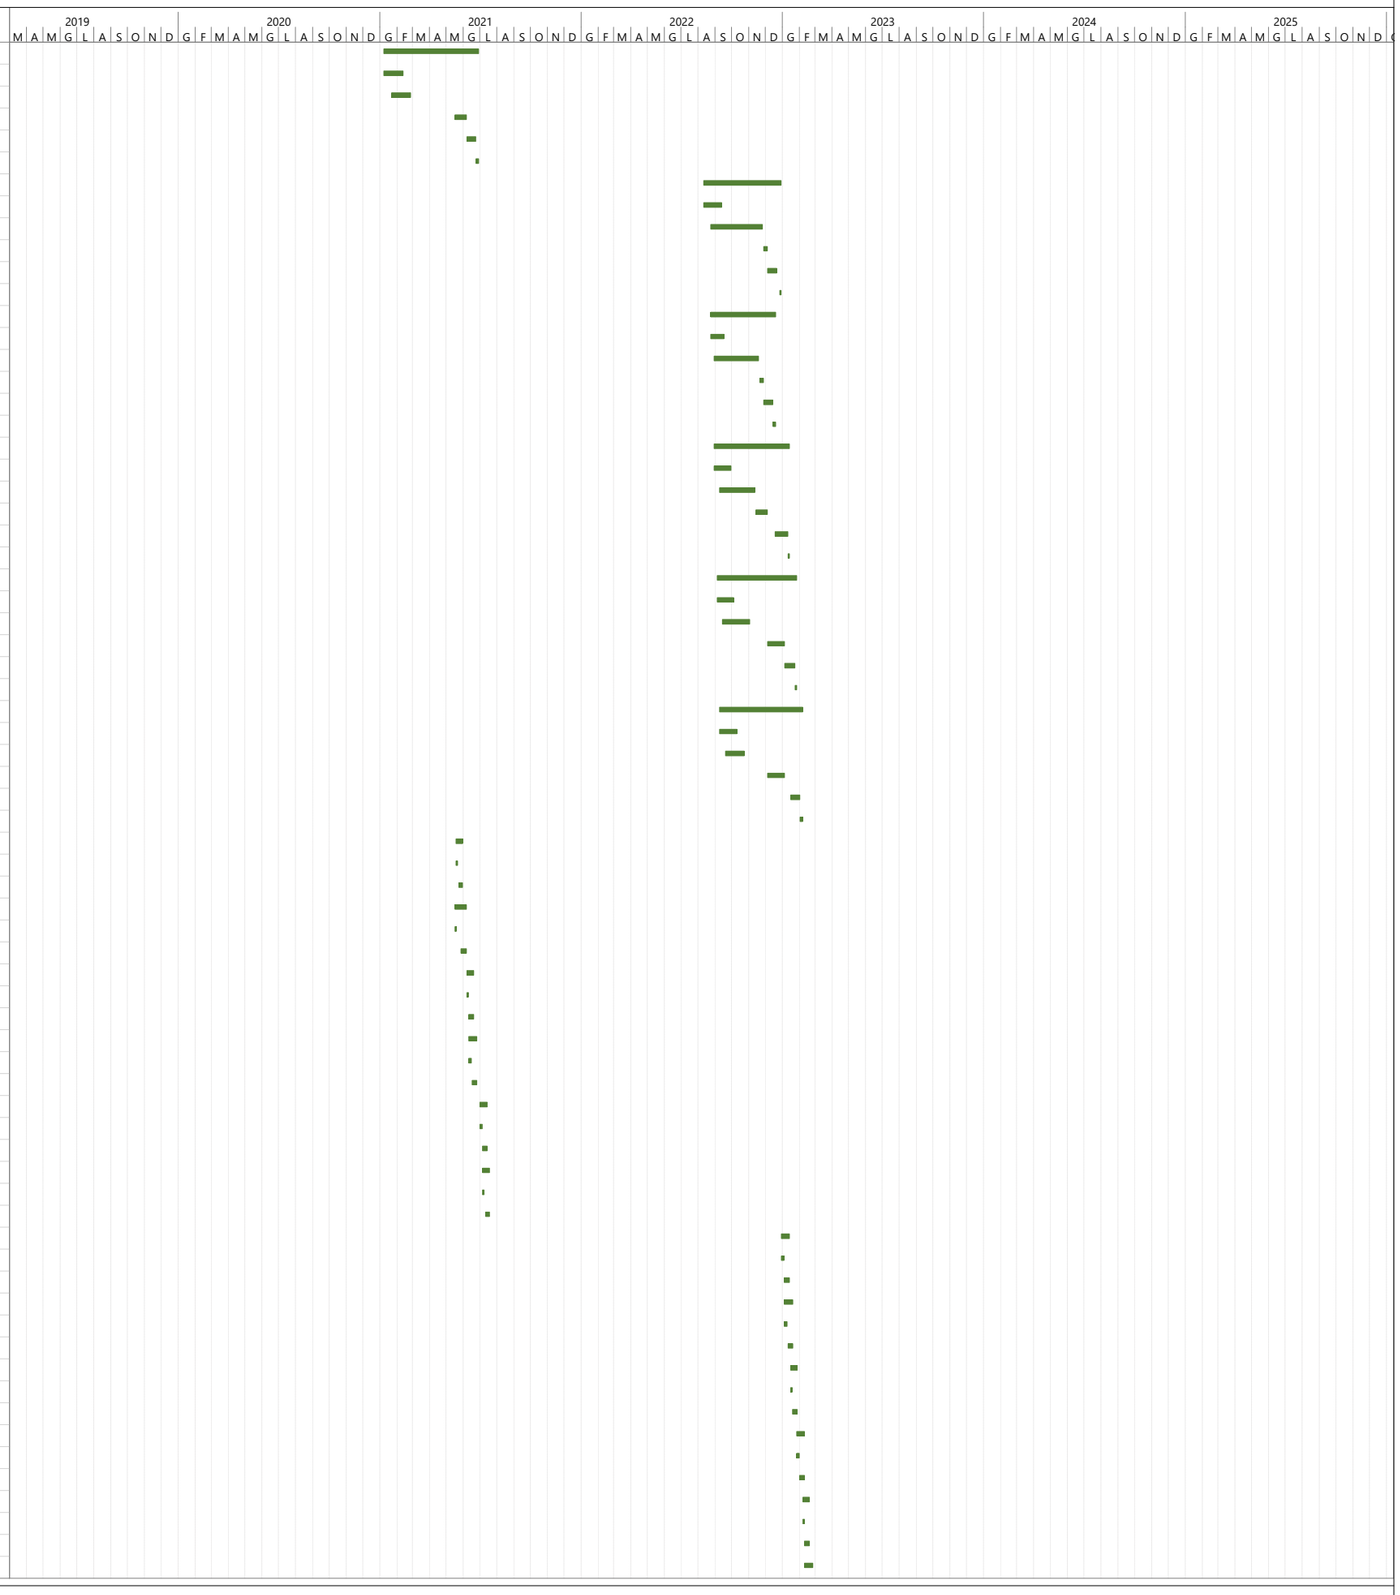

Attività Milestones Riepilogo

ID	Nome attività	Inizio	Fine	Durata gg solari
1661	VI7 - Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)	10/02/2023	14/02/2023	5
1664	VI9 - Soletta di completamento	16/02/2023	24/02/2023	9
1668	VI01 - Rinterri da Spalla A a Pila 11	20/11/2023	30/11/2023	11
1669	VI3 - Fondazioni	20/11/2023	30/11/2023	11
1671	VI01A - Intero Tratto d'Opera	16/11/2020	09/11/2023	1089
1672	VIB - Opere di finitura di Linea	14/09/2023	09/11/2023	57
1674	VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti	16/11/2020	10/10/2022	694
1676	VI01B - da pila P12 a pila P15 (e n° 3 impalcati L=45+65+45m D.B. Acc./Cls)	12/01/2021	17/11/2023	1040
1677	VI01 - Pila 12	26/01/2021	01/12/2021	310
1678	VI2 - Pali e pozzi	10/02/2021	24/06/2021	135
1697	VI3 - Fondazioni	26/01/2021	23/07/2021	179
1706	VI5 - Pile	14/10/2021	11/11/2021	29
1716	VI6 - Pulvini	12/11/2021	28/11/2021	17
1721	VI8 - Travi d'impalcato in acciaio	29/11/2021	01/12/2021	3
1723	VI01 - Sistemazione idraulica Pila 13	12/01/2021	16/02/2021	36
1724	VIC - Interferenze e Sistemazioni Idrauliche	12/01/2021	16/02/2021	36
1734	VI01 - Pila 13	19/01/2021	13/10/2021	268
1735	VI2 - Pali e pozzi	25/01/2021	07/06/2021	134
1754	VI3 - Fondazioni	19/01/2021	30/06/2021	163
1763	VI5 - Pile	30/08/2021	23/09/2021	25
1773	VI6 - Pulvini	24/09/2021	10/10/2021	17
1778	VI8 - Travi d'impalcato in acciaio	11/10/2021	13/10/2021	3
1780	VI01 - Pila 14	21/01/2021	08/09/2021	231
1781	VI2 - Pali e pozzi	02/02/2021	10/06/2021	129
1800	VI3 - Fondazioni	21/01/2021	15/07/2021	176
1809	VI5 - Pile	16/07/2021	19/08/2021	35
1819	VI6 - Pulvini	20/08/2021	05/09/2021	17
1824	VI8 - Travi d'impalcato in acciaio	06/09/2021	08/09/2021	3
1826	VI01 - Pila 15	11/08/2022	27/07/2023	351
1827	VI2 - Pali e pozzi	22/08/2022	15/11/2022	86
1846	VI3 - Fondazioni	11/08/2022	04/12/2022	116
1855	VI5 - Pile	19/06/2023	09/07/2023	21
1865	VI6 - Pulvini	10/07/2023	24/07/2023	15
1870	VI8 - Travi d'impalcato in acciaio	25/07/2023	27/07/2023	3
1872	VI01 - Impalcato 13 - da Pila 12 a Pila 13	15/02/2023	09/03/2023	23
1873	VI8 - Travi d'impalcato in acciaio	15/02/2023	23/02/2023	9
1876	VI9 - Soletta di completamento	24/02/2023	09/03/2023	14
1880	VI01 - Impalcato 14 - da Pila 13 a Pila 14	24/02/2023	29/03/2023	34
1881	VI8 - Travi d'impalcato in acciaio	24/02/2023	09/03/2023	14
1884	VI9 - Soletta di completamento	10/03/2023	29/03/2023	20
1888	VI01 - Impalcato 15 - da Pila 14 a Pila 15	28/07/2023	26/08/2023	30
1889	VI8 - Travi d'impalcato in acciaio	28/07/2023	07/08/2023	11
1892	VI9 - Soletta di completamento	08/08/2023	26/08/2023	19
1896	VI01 - Rinterri da Pila 12 a Pila 15	14/11/2023	17/11/2023	4
1897	VI3 - Fondazioni	14/11/2023	17/11/2023	4
1899	VI01B - Intero Tratto d'Opera	19/03/2021	09/11/2023	966
1900	VIB - Opere di finitura di Linea	14/09/2023	09/11/2023	57
1902	VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti	19/03/2021	14/10/2022	575
1904	VI01C - da pila P16 a spalla "B" (e n° 8 impalcati L=25m D.B. in C.A.P.)	29/01/2021	13/11/2023	1019
1905	VI01 - Pila 16	22/08/2022	17/02/2023	180
1906	VI2 - Pali e pozzi	25/08/2022	21/09/2022	28
1917	VI3 - Fondazioni	22/08/2022	14/12/2022	115
1924	VI5 - Pile	05/01/2023	28/01/2023	24
1934	VI6 - Pulvini	30/01/2023	14/02/2023	16
1939	VI7 - Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)	15/02/2023	17/02/2023	3
1941	VI01 - Pila 17	23/08/2022	27/02/2023	189
1942	VI2 - Pali e pozzi	31/08/2022	27/09/2022	28
1953	VI3 - Fondazioni	23/08/2022	21/12/2022	121
1960	VI5 - Pile	05/01/2023	28/01/2023	24
1970	VI6 - Pulvini	07/02/2023	22/02/2023	16
1975	VI7 - Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)	23/02/2023	27/02/2023	5
1977	VI01 - Pila 18	08/02/2021	10/09/2021	215
1978	VI2 - Pali e pozzi	13/04/2021	12/05/2021	30
1989	VI3 - Fondazioni	08/02/2021	21/07/2021	164
1996	VI5 - Pile	22/07/2021	20/08/2021	30
2006	VI6 - Pulvini	23/08/2021	07/09/2021	16
2011	VI7 - Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)	08/09/2021	10/09/2021	3
2013	VI01 - Pila 19	05/02/2021	08/09/2021	216
2014	VI2 - Pali e pozzi	01/04/2021	04/05/2021	34
2025	VI3 - Fondazioni	05/02/2021	28/07/2021	174

Attività Milestones Riepilogo

ID	Nome attività	Inizio	Fine	Durata gg solari
2032	**VI5 - Pile**	**29/07/2021**	**18/08/2021**	**21**
2037	**VI6 - Pulvini**	**19/08/2021**	**05/09/2021**	**18**
2042	**VI7 - Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)**	**06/09/2021**	**08/09/2021**	**3**
2044	**VI01 - Pila 20**	**04/02/2021**	**01/10/2021**	**240**
2045	**VI2 - Pali e pozzi**	**23/03/2021**	**22/04/2021**	**31**
2056	**VI3 - Fondazioni**	**04/02/2021**	**04/08/2021**	**182**
2063	**VI5 - Pile**	**23/08/2021**	**29/08/2021**	**7**
2068	**VI6 - Pulvini**	**13/09/2021**	**28/09/2021**	**16**
2073	**VI7 - Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)**	**29/09/2021**	**01/10/2021**	**3**
2075	**VI01 - Pila 21**	**03/02/2021**	**29/09/2021**	**239**
2076	**VI2 - Pali e pozzi**	**12/03/2021**	**14/04/2021**	**34**
2087	**VI3 - Fondazioni**	**03/02/2021**	**18/08/2021**	**197**
2094	**VI5 - Pile**	**23/08/2021**	**29/08/2021**	**7**
2099	**VI6 - Pulvini**	**09/09/2021**	**26/09/2021**	**18**
2104	**VI7 - Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)**	**27/09/2021**	**29/09/2021**	**3**
2106	**VI01 - Pila 22**	**02/02/2021**	**22/10/2021**	**263**
2107	**VI2 - Pali e pozzi**	**03/03/2021**	**02/04/2021**	**31**
2118	**VI3 - Fondazioni**	**02/02/2021**	**25/08/2021**	**205**
2125	**VI5 - Pile**	**30/08/2021**	**05/09/2021**	**7**
2130	**VI6 - Pulvini**	**04/10/2021**	**19/10/2021**	**16**
2135	**VI7 - Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)**	**20/10/2021**	**22/10/2021**	**3**
2137	**VI01 - Spalla B**	**29/01/2021**	**12/10/2021**	**257**
2138	**VI2 - Pali e pozzi**	**17/02/2021**	**01/04/2021**	**44**
2149	**VI3 - Fondazioni**	**29/01/2021**	**04/09/2021**	**219**
2156	**VI4 - Spalle**	**06/09/2021**	**07/10/2021**	**32**
2168	**VI7 - Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)**	**08/10/2021**	**12/10/2021**	**5**
2170	**VI01 - Impalcato 16 - da Pila 15 a Pila 16**	**08/08/2023**	**01/09/2023**	**25**
2171	**VI7 - Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)**	**08/08/2023**	**10/08/2023**	**3**
2174	**VI9 - Soletta di completamento**	**24/08/2023**	**01/09/2023**	**9**
2178	**VI01 - Impalcato 17 - da Pila 16 a Pila 17**	**11/08/2023**	**07/09/2023**	**28**
2179	**VI7 - Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)**	**11/08/2023**	**22/08/2023**	**12**
2182	**VI9 - Soletta di completamento**	**30/08/2023**	**07/09/2023**	**9**
2186	**VI01 - Impalcato 18 - da Pila 17 a Pila 18**	**23/08/2023**	**13/09/2023**	**22**
2187	**VI7 - Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)**	**23/08/2023**	**25/08/2023**	**3**
2190	**VI9 - Soletta di completamento**	**05/09/2023**	**13/09/2023**	**9**
2194	**VI01 - Impalcato 19 - da Pila 18 a Pila 19**	**13/09/2021**	**24/09/2021**	**12**
2195	**VI7 - Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)**	**13/09/2021**	**15/09/2021**	**3**
2198	**VI9 - Soletta di completamento**	**16/09/2021**	**24/09/2021**	**9**
2202	**VI01 - Impalcato 20 - da Pila 19 a Pila 20**	**04/10/2021**	**15/10/2021**	**12**
2203	**VI7 - Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)**	**04/10/2021**	**06/10/2021**	**3**
2206	**VI9 - Soletta di completamento**	**07/10/2021**	**15/10/2021**	**9**
2210	**VI01 - Impalcato 21 - da Pila 20 a Pila 21**	**07/10/2021**	**21/10/2021**	**15**
2211	**VI7 - Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)**	**07/10/2021**	**11/10/2021**	**5**
2214	**VI9 - Soletta di completamento**	**13/10/2021**	**21/10/2021**	**9**
2218	**VI01 - Impalcato 22 - da Pila 21 a Pila 22**	**25/10/2021**	**06/11/2021**	**13**
2219	**VI7 - Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)**	**25/10/2021**	**27/10/2021**	**3**
2222	**VI9 - Soletta di completamento**	**28/10/2021**	**06/11/2021**	**10**
2226	**VI01 - Impalcato 22 - da Pila 22 a Spalla B**	**28/10/2021**	**12/11/2021**	**16**
2227	**VI7 - Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)**	**28/10/2021**	**02/11/2021**	**6**
2230	**VI9 - Soletta di completamento**	**04/11/2021**	**12/11/2021**	**9**
2234	**VI01 - Rinterri da Pila 16 a Spalla B**	**10/11/2023**	**13/11/2023**	**4**
2235	**VI3 - Fondazioni**	**10/11/2023**	**13/11/2023**	**4**
2237	**VI01C - Intero Tratto d'Opera**	**17/02/2021**	**09/11/2023**	**996**
2238	**VIB - Opere di finitura di Linea**	**14/09/2023**	**09/11/2023**	**57**
2241	**VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti**	**17/02/2021**	**20/09/2022**	**581**
2243	**VI02 - VIADOTTO UFITA MELITO - dal km 4+825,00 al km 5+055,00**	**28/11/2020**	**02/12/2024**	**1466**
2244	**VI02 - Intera Opera**	**28/11/2020**	**24/03/2021**	**117**
2245	**VI02 - Intera Opera**	**28/11/2020**	**24/03/2021**	**117**
2246	**BOE - Bonifica da Ordigni Esplosivi (Collaudo Genio Militare)**	**28/11/2020**	**28/11/2020**	**0**
2248	**CAN - Attività di Cantierizzazione**	**08/02/2021**	**24/03/2021**	**45**
2250	**VI02A - Spalla "A" (e n° 1 impalcato L=25m D.B. in C.A.P.)**	**27/04/2021**	**21/11/2024**	**1305**
2296	**VI02B - da pila P1 a pila P4 (e n° 3 impalcati L=45+65+45m D.B. Acc./Cls)**	**29/03/2021**	**27/11/2024**	**1340**
2535	**VI02C - pila P4, spalla "B" (e n° 1 impalcato L=25m D.B. in C.A.P.) fino a muro ad "U"**	**11/05/2021**	**02/12/2024**	**1302**
2617	**VI03 - VIADOTTO UFITA ROCCHETTA - dal km 9+632,00 al km 10+047,00**	**08/11/2020**	**02/12/2025**	**1851**
2618	**VI03 - Intera Opera**	**08/11/2020**	**06/02/2021**	**91**
2619	**VI03 - Intera Opera**	**08/11/2020**	**06/02/2021**	**91**
2620	**BOE - Bonifica da Ordigni Esplosivi (Collaudo Genio Militare)**	**08/11/2020**	**08/11/2020**	**0**
2622	**CAN - Attività di Cantierizzazione**	**09/11/2020**	**06/02/2021**	**90**
2624	**VI03A - da spalla "A" a spalla "B" (e n° 7 impalcati L=45+(5x65)+45m D.B. Acc./Cls)**	**08/02/2021**	**02/12/2025**	**1759**
3256	**VI04 - VIADOTTO UFITA APICE - dal km 16+704,00 al km 17+409,00**	**11/08/2020**	**06/12/2024**	**1579**

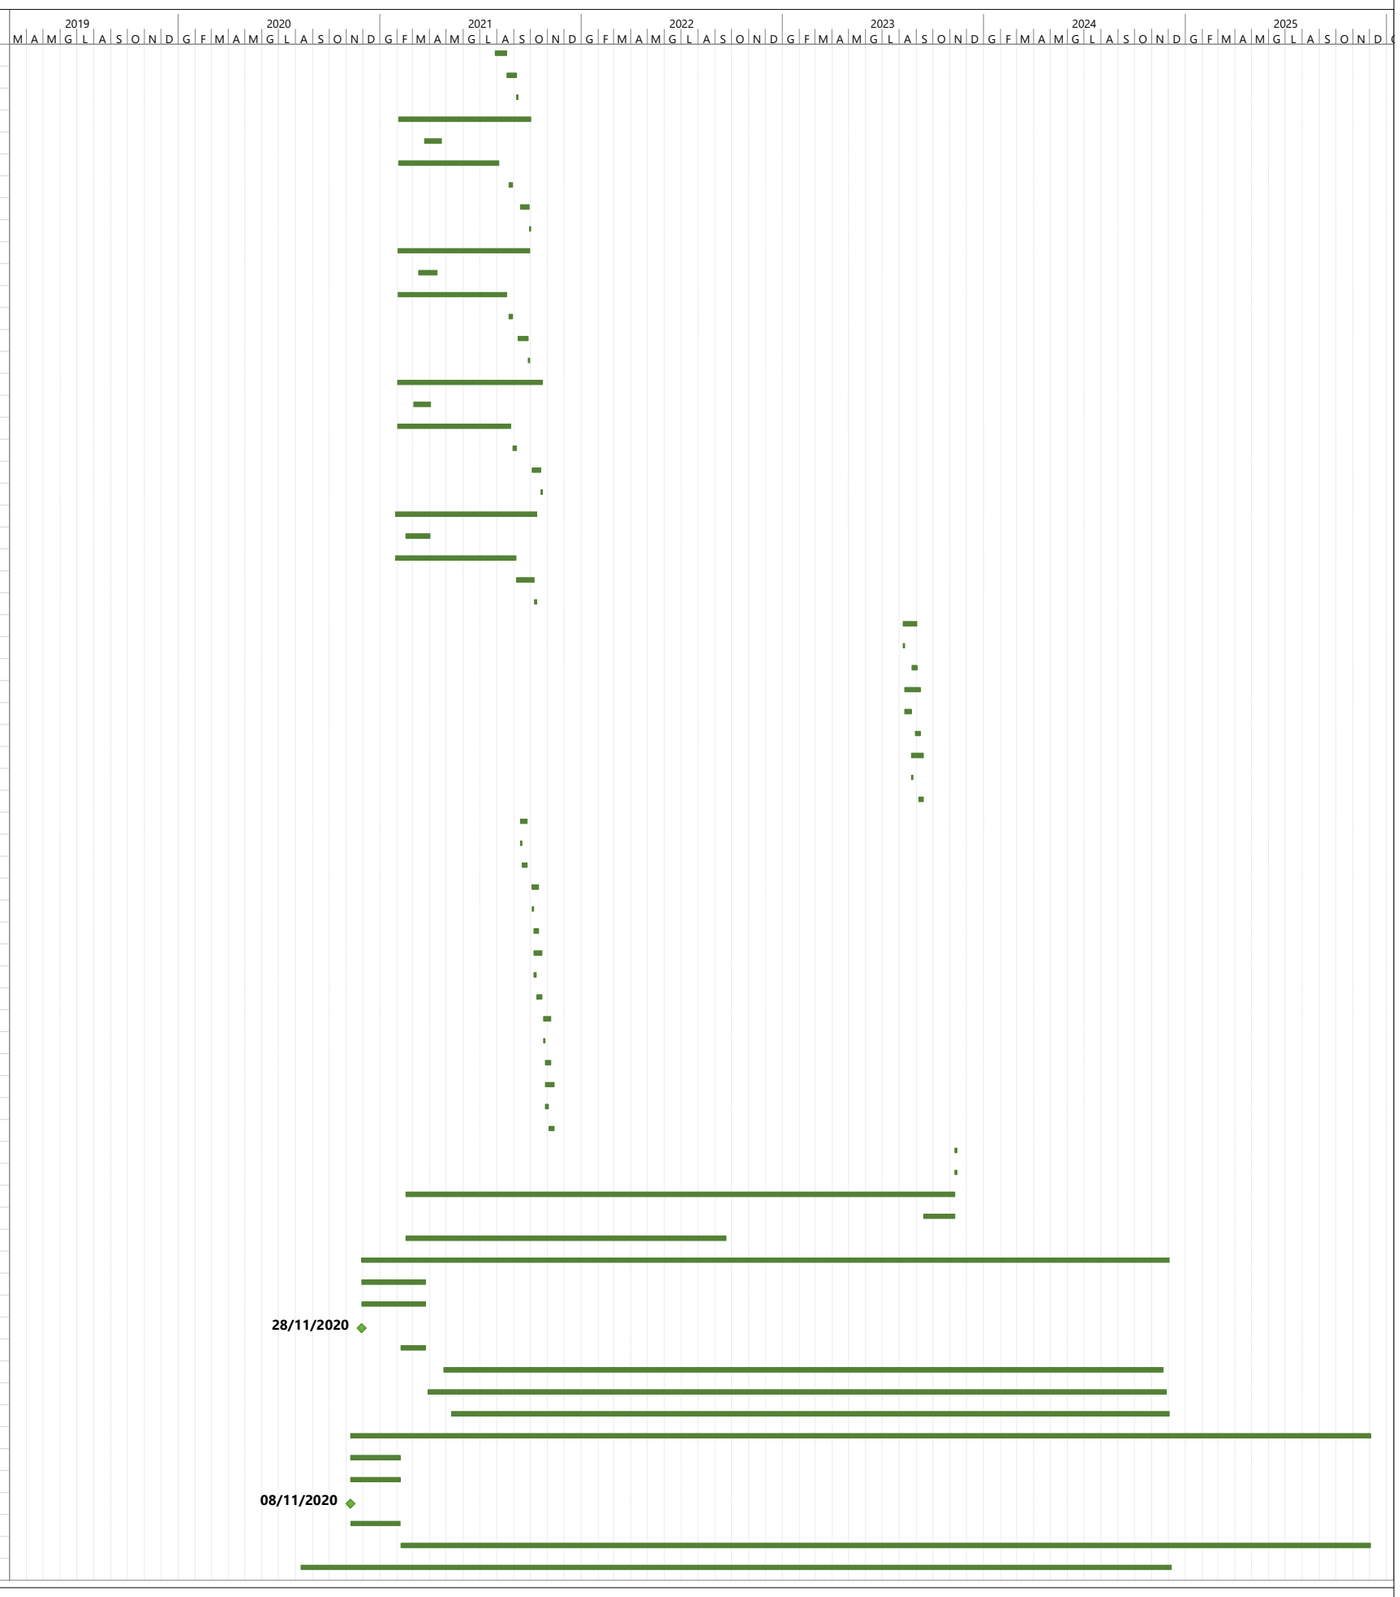

Attività Milestones Riepilogo

ID	Nome attività	Inizio	Fine	Durata gg solari
3257	**VI04 - Intera Opera**	**11/08/2020**	**10/01/2022**	**518**
3258	**VI04 - Intera Opera**	**11/08/2020**	**10/01/2022**	**518**
3259	**BOE - Bonifica da Ordigni Esplosivi (Collaudo Genio Militare)**	**09/10/2020**	**12/12/2020**	**65**
3262	**RAC - Risoluzione interferenze Acquedotto Alto Calore**	**11/08/2020**	**03/12/2020**	**115**
3263	VI04 - Risoluzione interferenze Acquedotto Alto Calore (Interf. n.: 114) - Iter autorizzativo	11/08/2020	24/09/2020	45
3264	VI04 - Risoluzione interferenze Acquedotto Alto Calore (Interf. n.: 114) - Risoluzione	25/09/2020	03/12/2020	70
3265	**RFO - Risoluzione interferenza Fognatura Comune Sant'Arcangelo Trimonte**	**31/05/2021**	**10/01/2022**	**225**
3268	**CAN - Attività di Cantierizzazione**	**09/11/2020**	**27/11/2020**	**19**
3270	**VI04A - da spalla "A" a pila P2 (e n° 3 impalcati L=25m D.B. in C.A.P.)**	**04/12/2020**	**06/12/2024**	**1464**
3271	**VI04 - Da Spalla A a Pila 3**	**04/12/2020**	**25/02/2021**	**84**
3272	**VI2 - Pali e pozzi**	**04/12/2020**	**19/02/2021**	**78**
3280	**VI3 - Fondazioni**	**22/02/2021**	**25/02/2021**	**4**
3282	**VI04 - Spalla A**	**26/02/2021**	**29/06/2021**	**124**
3283	**VI2 - Pali e pozzi**	**26/02/2021**	**04/03/2021**	**7**
3287	**VI3 - Fondazioni**	**21/05/2021**	**05/06/2021**	**16**
3293	**VI4 - Spalle**	**07/06/2021**	**24/06/2021**	**18**
3302	**VI7 - Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)**	**25/06/2021**	**29/06/2021**	**5**
3304	**VI04 - Pila 1**	**02/03/2021**	**20/10/2021**	**233**
3305	**VI2 - Pali e pozzi**	**02/03/2021**	**05/03/2021**	**4**
3309	**VI3 - Fondazioni**	**24/05/2021**	**13/06/2021**	**21**
3315	**VI5 - Pile**	**30/08/2021**	**18/09/2021**	**20**
3324	**VI6 - Pulvini**	**30/09/2021**	**17/10/2021**	**18**
3329	**VI7 - Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)**	**18/10/2021**	**20/10/2021**	**3**
3331	**VI04 - Pila 2**	**04/03/2021**	**15/11/2021**	**257**
3332	**VI2 - Pali e pozzi**	**04/03/2021**	**11/03/2021**	**8**
3336	**VI3 - Fondazioni**	**25/05/2021**	**24/06/2021**	**31**
3342	**VI5 - Pile**	**06/09/2021**	**25/09/2021**	**20**
3351	**VI6 - Pulvini**	**25/10/2021**	**10/11/2021**	**17**
3356	**VI7 - Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)**	**11/11/2021**	**15/11/2021**	**5**
3358	**VI04 - Impalcato 1 - da Spalla A a Pila 1**	**23/02/2024**	**07/03/2024**	**14**
3359	**VI7 - Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)**	**23/02/2024**	**27/02/2024**	**5**
3362	**VI9 - Soletta di completamento**	**28/02/2024**	**07/03/2024**	**9**
3366	**VI04 - Impalcato 2 - da Pila 1 a Pila 2**	**20/02/2024**	**02/03/2024**	**12**
3367	**VI7 - Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)**	**20/02/2024**	**22/02/2024**	**3**
3370	**VI9 - Soletta di completamento**	**23/02/2024**	**02/03/2024**	**9**
3374	**VI04 - Impalcato 3 - da Pila 2 a Pila 3**	**15/02/2024**	**28/02/2024**	**14**
3375	**VI7 - Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)**	**15/02/2024**	**19/02/2024**	**5**
3378	**VI9 - Soletta di completamento**	**20/02/2024**	**28/02/2024**	**9**
3382	**VI04 - Rinterri da Spalla A a Pila 3**	**22/11/2024**	**06/12/2024**	**15**
3383	**VI3 - Fondazioni**	**22/11/2024**	**06/12/2024**	**15**
3385	**VI04A - Intero Tratto d'Opera**	**04/12/2020**	**07/05/2024**	**1251**
3386	**VIB - Opere di finitura di Linea**	**08/03/2024**	**07/05/2024**	**61**
3389	**VIK - Gestione di Rifiuti e/o Sottoprodotti e/o Trattamenti**	**04/12/2020**	**11/03/2021**	**98**
3392	**VI04B - da pila P3 a pila P6 (e n° 3 impalcati L=45+65+45m D.B. Acc./Cls)**	**26/02/2021**	**21/11/2024**	**1365**
3640	**VI04C - da pila P7 a spalla "B" (e n° 19 impalcati L=25m D.B. in C.A.P.)**	**10/05/2021**	**20/11/2024**	**1291**
4462	**RILEVATI**	**11/08/2020**	**09/08/2024**	**1460**
4463	**RI01 - Rilevato Irpinia da progr. 0+310 a progr.0+870**	**06/12/2020**	**22/03/2024**	**1203**
4464	**RI01 - Intera Opera**	**06/12/2020**	**28/12/2020**	**23**
4465	**RI01 - Intera Opera**	**06/12/2020**	**28/12/2020**	**23**
4466	**BOE - Bonifica da Ordigni Esplosivi (Collaudo Genio Militare)**	**06/12/2020**	**06/12/2020**	**0**
4468	**RPP - Risoluzione interferenze Pozzi Privati**	**07/12/2020**	**28/12/2020**	**22**
4469	RI01 - Risoluzione interferenze Pozzi Privati - (Interferenza n. 42)	07/12/2020	28/12/2020	22
4470	**RI01A - Rilevato Irpinia da progr. 0+310 a progr.0+870**	**03/01/2024**	**22/03/2024**	**80**
4488	**RI02 - Rilevato Irpinia 2 da progr. 1+210 a progr. 1+765**	**11/08/2020**	**17/03/2022**	**584**
4489	**RI02 - Intera Opera**	**11/08/2020**	**13/11/2020**	**95**
4490	**RI02 - Intera Opera**	**11/08/2020**	**13/11/2020**	**95**
4491	**BOE - Bonifica da Ordigni Esplosivi (Collaudo Genio Militare)**	**28/10/2020**	**28/10/2020**	**0**
4493	**RCU - Risoluzione interferenze Consorzio di Bonifica UFITA**	**11/08/2020**	**16/10/2020**	**67**
4494	RI02 - Risoluzione interferenze Consorzio di bonifica UFITA - Iter autorizzativo/progettuale	11/08/2020	24/09/2020	45
4495	RI02 - Risoluzione interferenze Consorzio di bonifica UFITA (Interf. n.: 46-48)	25/09/2020	16/10/2020	22
4496	**CAN - Attività di Cantierizzazione**	**09/11/2020**	**13/11/2020**	**5**
4498	**RI02A - Rilevato Irpinia 2 da progr. 1+210 a progr. 1+765**	**16/11/2020**	**17/03/2022**	**487**
4499	**RI02 - Concio 1 da 1+210,83 a 1+238,01**	**16/11/2020**	**11/06/2021**	**208**
4500	**RI4 - Movimenti di terra**	**16/11/2020**	**17/11/2020**	**2**
4502	**RI5 - Opere di sostegno e di Linea**	**18/11/2020**	**11/06/2021**	**206**
4516	**RI02 - Concio 2 da 1+238,02 a 1+318,19**	**18/11/2020**	**08/09/2021**	**295**
4517	**RI4 - Movimenti di terra**	**18/11/2020**	**25/11/2020**	**8**
4519	**RI5 - Opere di sostegno e di Linea**	**26/11/2020**	**08/09/2021**	**287**
4543	**RI02 - Concio 3 da 1+318,20 a 1+418,22**	**26/11/2020**	**04/11/2021**	**344**
4544	**RI4 - Movimenti di terra**	**26/11/2020**	**02/12/2020**	**7**

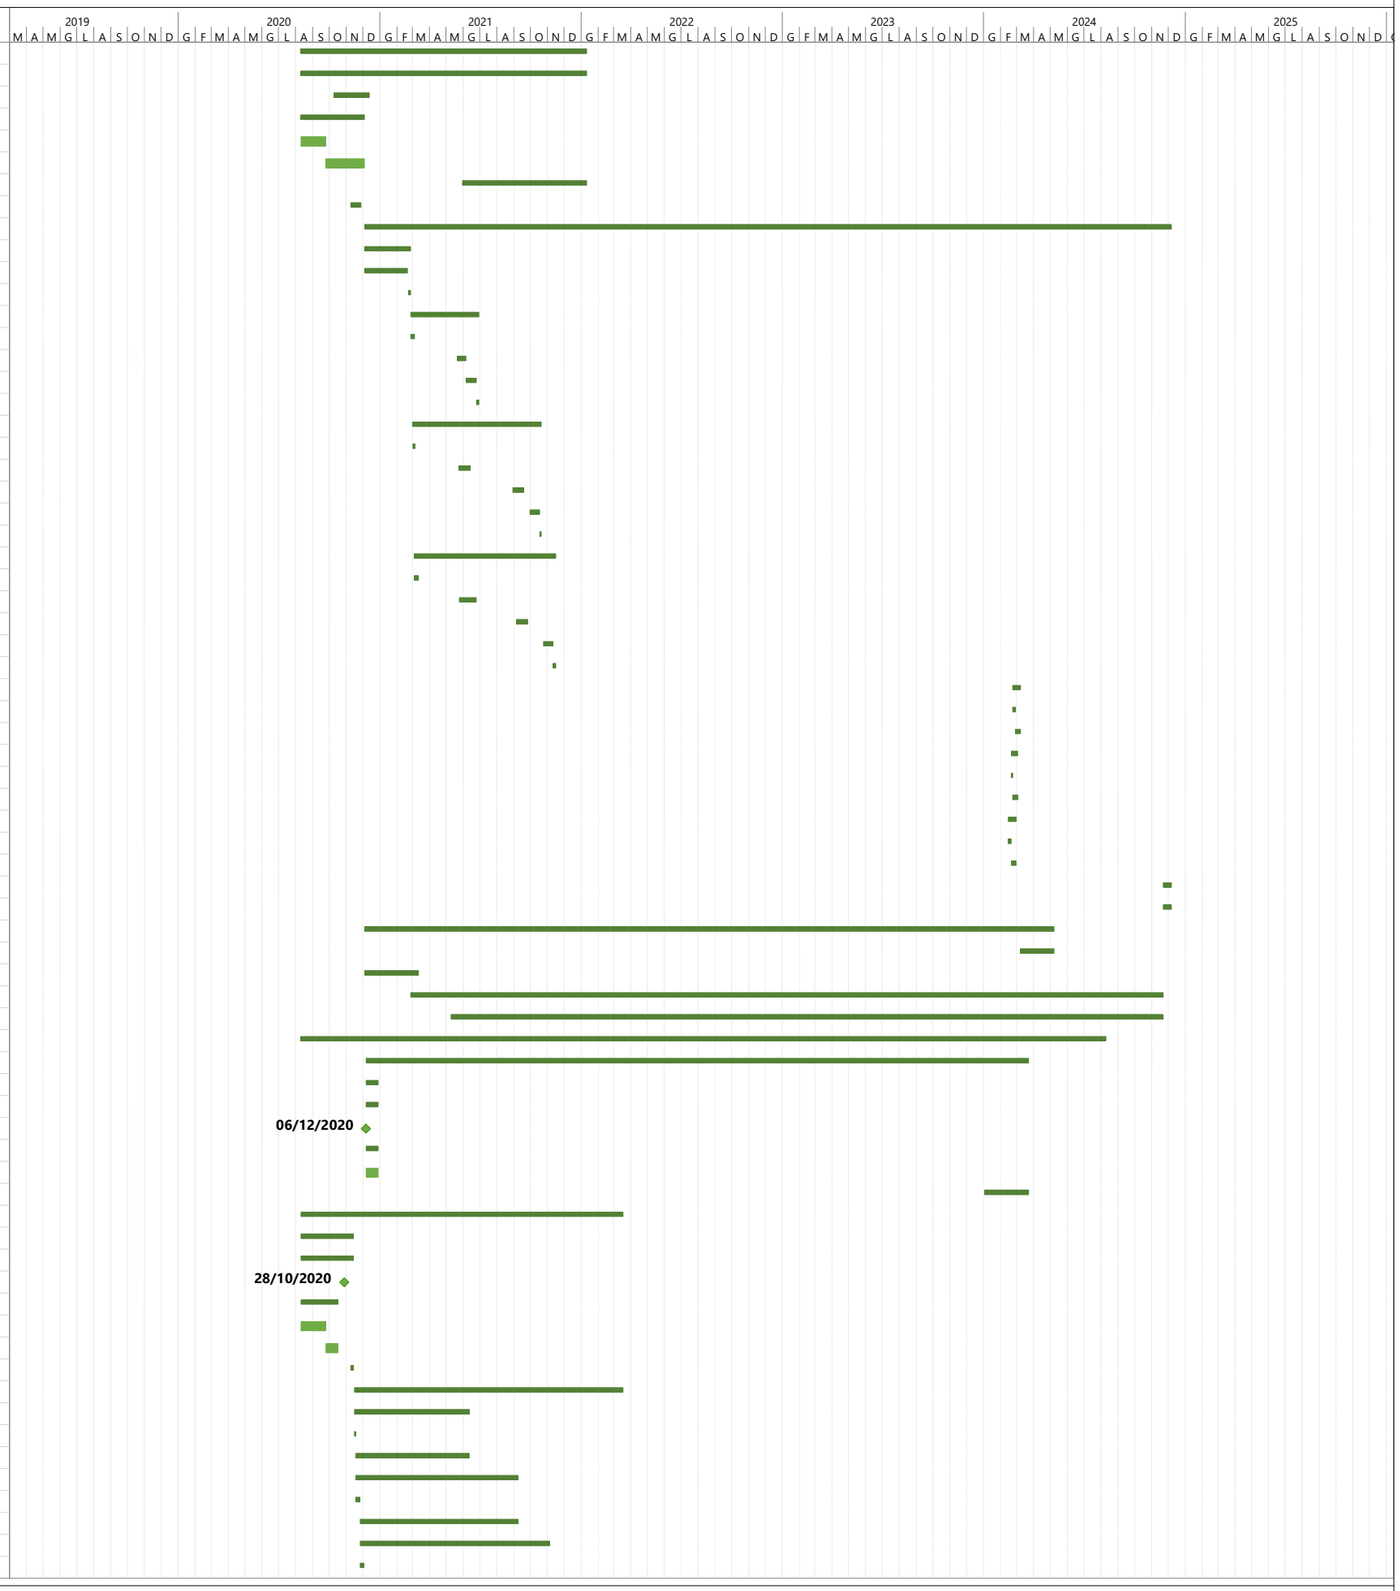

Attività Milestones Riepilogo

ID	Nome attività	Inizio	Fine	Durata gg solari
4546	RI5 - Opere di sostegno e di Linea	15/12/2020	04/11/2021	325
4560	RI02 - Concio 4 da 1+418,23 a 1+485,32	03/12/2020	05/12/2021	368
4561	RI4 - Movimenti di terra	03/12/2020	07/12/2020	5
4563	RI5 - Opere di sostegno e di Linea	11/01/2021	05/12/2021	329
4577	RI02 - Concio 5 da 1+485,33 a 1+585,79	09/12/2020	06/01/2022	394
4578	RI4 - Movimenti di terra	09/12/2020	11/12/2020	3
4580	RI5 - Opere di sostegno e di Linea	20/01/2021	06/01/2022	352
4594	RI02 - Concio 6 da 1+585,80 a 1+685,83	14/12/2020	30/01/2022	413
4595	RI4 - Movimenti di terra	14/12/2020	16/12/2020	3
4597	RI5 - Opere di sostegno e di Linea	29/01/2021	30/01/2022	367
4611	RI02 - Concio 7 da 1+685,84 1+761,04	17/12/2020	17/02/2022	428
4612	RI4 - Movimenti di terra	17/12/2020	18/12/2020	2
4614	RI5 - Opere di sostegno e di Linea	09/02/2021	17/02/2022	374
4628	RI02A - Intero Tratto d'Opera	18/02/2022	17/03/2022	28
4629	RI6 - Piattaforma ferroviaria	18/02/2022	03/03/2022	14
4631	RI8 - Opere di finitura di linea	04/03/2022	17/03/2022	14
4633	RI03 - Rilevato - Grottaminarda imbocco E da progr. 2+420 a progr. 2+620	11/10/2023	27/02/2024	140
4634	RI03A - Rilevato - Grottaminarda imbocco E da progr. 2+420 a progr. 2+620	11/10/2023	27/02/2024	140
4656	RI04 - Rilevato - Rocchetta Imbocco E da progr. 10+047 a progr. 10+088	29/04/2024	20/05/2024	22
4657	RI04A - Rilevato - Rocchetta Imbocco E da progr. 10+047 a progr. 10+088	29/04/2024	20/05/2024	22
4669	RI05 - Rilevato - Apice da progr. 17+409 a progr. 17+655.60	04/01/2024	19/02/2024	47
4670	RI05A - Rilevato - Apice da progr. 17+409 a progr.17+655.60	04/01/2024	19/02/2024	47
4682	RI06 - Rilevato - Apice da progr. 17+900 a progr. 18+713	13/02/2024	15/04/2024	63
4683	RI06A - Rilevato - Apice da progr. 17+900 a progr. 18+713	13/02/2024	15/04/2024	63
4694	RI50 - Rilevato - Rilevato SSE Hirpinia	28/07/2023	02/01/2024	159
4695	RI50A - Rilevato - SSE Hirpinia	28/07/2023	02/01/2024	159
4701	RI51 - Piazzale GA Grottaminarda	22/04/2024	04/06/2024	44
4702	RI51A - Piazzale Imbocco E Grottaminarda (GN01) - FA02A/B - PGEP di Grottaminarda	22/04/2024	04/06/2024	44
4710	RI52 - Slargo GA Grottaminarda - Finestra 1	17/05/2021	12/07/2021	57
4711	RI52A - Piazzale Finestra n.1 Grottaminarda (GN01) - FA03A/B - FA di Grottaminarda	17/05/2021	12/07/2021	57
4719	RI53 - Slargo Imbocco W Grottaminarda	08/02/2021	26/04/2021	78
4720	RI53A - Piazzale Imbocco W Grottaminarda (GN01)	08/02/2021	26/04/2021	78
4730	RI54 - Slargo GA Melito - Finestra 1	11/01/2022	21/03/2022	70
4731	RI54A - Slargo GA Melito - Finestra 1	11/01/2022	21/03/2022	70
4739	RI55 - Slargo GA Melito - Finestra 2	24/03/2021	29/04/2021	37
4740	RI55A - Slargo GA Melito - Finestra 2	24/03/2021	29/04/2021	37
4748	RI56 - Slargo GA Melito - Finestra 3	26/05/2022	01/08/2022	68
4749	RI56 - Intera Opera	26/05/2022	27/06/2022	33
4750	RI56 - Intera Opera	26/05/2022	27/06/2022	33
4751	RAL - Risoluzione interferenze arboree	26/05/2022	27/06/2022	33
4753	RI56A - Slargo GA Melito - Finestra 3	28/06/2022	01/08/2022	35
4761	RI57 - Piazzale GA Melito	18/05/2021	14/12/2021	211
4762	RI57A - Piazzale GA Melito (GN02)	18/05/2021	14/12/2021	211
4810	RI58 - Slargo GA Rocchetta - Finestra 1	13/04/2021	17/05/2021	35
4811	RI58A - Slargo GA Rocchetta - Finestra 1	13/04/2021	17/05/2021	35
4819	RI59 - Slargo GA Rocchetta - Finestra 2	22/02/2021	19/03/2021	26
4820	RI59A - Slargo GA Rocchetta - Finestra 2	22/02/2021	19/03/2021	26
4828	RI60 - Slargo GA Rocchetta - Finestra 3	15/06/2021	19/07/2021	35
4829	RI60A - Slargo GA Rocchetta - Finestra 3	15/06/2021	19/07/2021	35
4837	RI61 - Piazzale GA Rocchetta	22/12/2023	08/03/2024	78
4838	RI61A - Piazzale Finestra n.2 Rocchetta (GN03) - FA07 - FA di Rocchetta - Finestra 2	22/12/2023	08/03/2024	78
4848	RI63 - Piazzale Paduli	29/07/2024	09/08/2024	12
4849	RI63A - Piazzale PPT di Paduli - FA09	29/07/2024	09/08/2024	12
4855	TRINCEE	03/02/2021	16/10/2024	1352
4856	TR01 -Trincea - Irpinia da progr. 0+000 a progr. 0+340	03/01/2024	26/03/2024	84
4857	TR01A - Trincea - Irpinia da progr. 0+000 a progr. 0+310	03/01/2024	26/03/2024	84
4867	TR02 - Trincea Grottaminarda imbocco E da progr. 2+620 a progr. 2+715	03/02/2021	16/10/2024	1352
4868	TR02A - Trincea Grottaminarda imbocco E da progr. 2+620 a progr. 2+715	03/02/2021	16/10/2024	1352
4869	TR02A - Intero Tratto d'Opera	03/02/2021	16/10/2024	1352
4870	TR3 - Interferenze e Sistemazioni Idrauliche	18/07/2024	21/08/2024	35
4872	TR4 - Movimenti di terra	18/07/2024	21/08/2024	35
4874	TR5 - Opere di sostegno e di Linea	03/02/2021	02/10/2024	1338
4913	TR6 - Piattaforma ferroviaria	03/10/2024	16/10/2024	14
4915	TR8 - Opere di finitura di linea	03/10/2024	16/10/2024	14
4917	TR03 - Trincea - Grottaminarda imbocco W da progr. 4+713 a progr. 4+825	03/09/2021	16/10/2024	1140
4918	TR03A - Trincea - Grottaminarda imbocco W da progr. 4+713 a progr. 4+825	03/09/2021	16/10/2024	1140
4981	TR04 - Trincea Melito Imbocco W da progr. 9+597.1 a progr. 9+632	10/11/2022	03/10/2024	694
4982	TR04A - Trincea Melito Imbocco W da progr. 9+597.1 a progr. 9+632	10/11/2022	03/10/2024	694
5008	TR05 - Trincea - Rocchetta Imbocco W da progr. 16+602 a progr. 16+704	22/12/2023	29/03/2024	99
5009	TR05A - Trincea - Rocchetta Imbocco W da progr. 16+602 a progr. 16+704	22/12/2023	29/03/2024	99

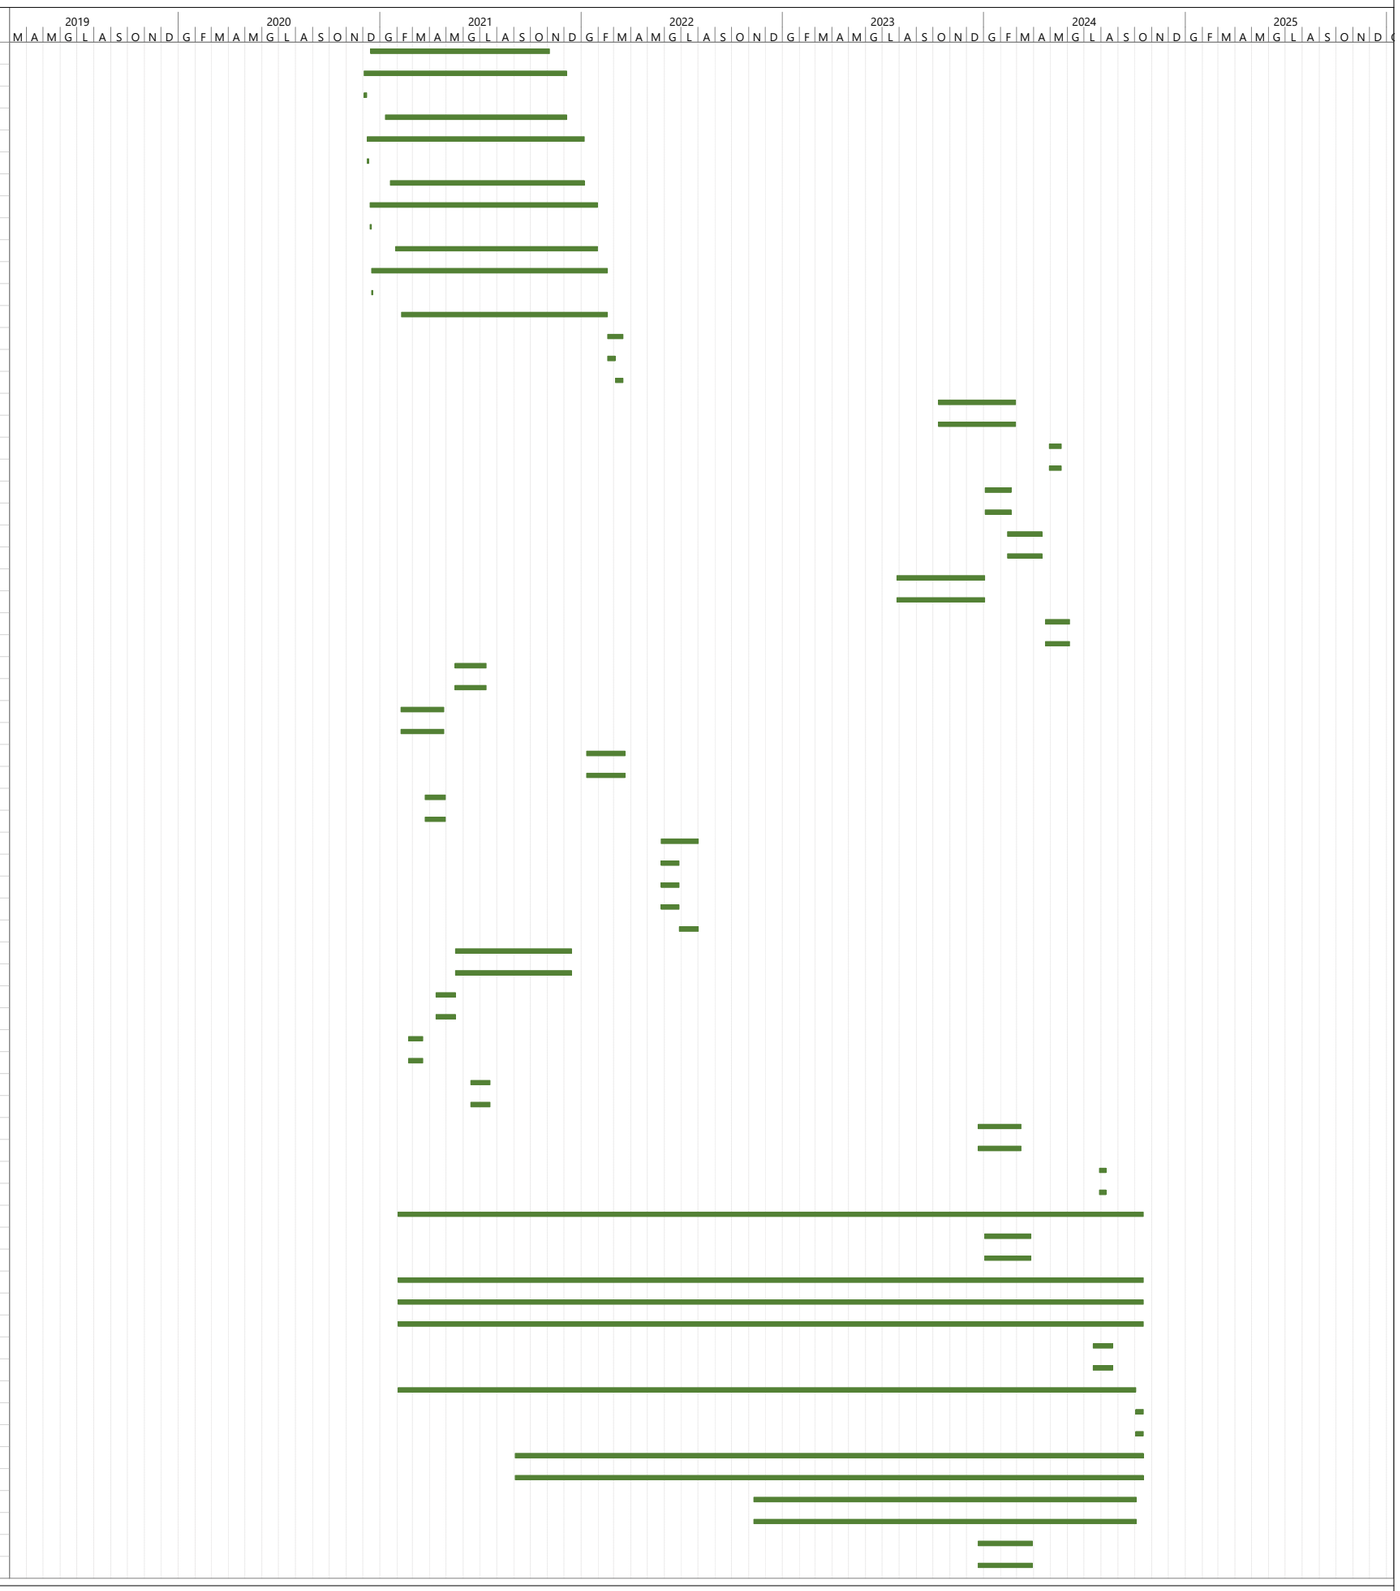

Attività Milestones Riepilogo

ID	Nome attività	Inizio	Fine	Durata gg solari
5021	**INTERFERENZE VIARIE ED IDRAULICHE**	**12/03/2021**	**03/10/2024**	**1302**
5022	**IN01 - Opere d'arte minori - Tombino scatolare 5x2.5 L=62.50 m - Tombino scatolare 5x2.5 L=22.29**	**12/03/2021**	**23/04/2021**	**43**
5023	**IN01A - Opere d'arte minori - Tombino scatolare 5x2.5 L=62.50 m - Tombino scatolare 5x2.5 L=22**	**12/03/2021**	**23/04/2021**	**43**
5040	**IN02 - Opere d'arte minori - Tombino Ø1500 mm**	**05/07/2021**	**30/07/2021**	**26**
5041	**IN02A - Opere d'arte minori - Tombino Ø1500 mm**	**05/07/2021**	**30/07/2021**	**26**
5052	**IN03 - Opere d'arte minori - n° 2 Tombini scatolari 2x2 m 1 fase e 2 fase**	**30/03/2022**	**03/06/2022**	**66**
5053	**IN03A - Opere d'arte minori - Tombino scatolare 2x2 m 1 fase**	**30/03/2022**	**03/06/2022**	**66**
5066	**IN03B - Opere d'arte minori - Tombino scatolare 2x2 m 2 fase**	**30/03/2022**	**03/06/2022**	**66**
5076	**IN04 - Opere d'arte minori - Tombino scatolare 2x2 m prolungamento**	**27/09/2023**	**25/10/2023**	**29**
5077	**IN04A - Opere d'arte minori - Tombino scatolare 2x2 m prolungamento**	**27/09/2023**	**25/10/2023**	**29**
5089	**IN05 - Opere d'arte minori -Tombino scatolare 2x2 m**	**11/01/2022**	**08/02/2022**	**29**
5090	**IN05A - Opere d'arte minori -Tombino scatolare 2x2 m**	**11/01/2022**	**08/02/2022**	**29**
5103	**IN06 - Opere d'arte minori - Tombino scatolare 2x2 m**	**12/04/2021**	**07/05/2021**	**26**
5104	**IN06A - Opere d'arte minori - Tombino scatolare 2x2 m**	**12/04/2021**	**07/05/2021**	**26**
5116	**IN07 - Opere d'arte minori - prolungamento Tombino scatolare 2x2 m km 18+100**	**06/09/2024**	**03/10/2024**	**28**
5117	**IN07A - Opere d'arte minori - prolungamento Tombino scatolare 2x2 m km 18+100**	**06/09/2024**	**03/10/2024**	**28**
5127	**GALLERIE**	**11/08/2020**	**09/10/2025**	**1886**
5128	**GI01 - Galleria Grottaminarda: Opere provvisionali di imbocco lato Bari**	**11/08/2020**	**10/08/2022**	**730**
5129	**GI01 - Intera Opera**	**11/08/2020**	**10/08/2022**	**730**
5130	**GI01 - Intera Opera**	**11/08/2020**	**10/08/2022**	**730**
5131	**BOE - Bonifica da Ordigni Esplosivi (Collaudo Genio Militare)**	**30/09/2020**	**30/09/2020**	**0**
5133	**RSN - Risoluzione interferenze SNAM**	**11/08/2020**	**10/08/2022**	**730**
5134	GI01 (Area smarino) - Metanodotto interrato DN150 75 bar (Interf. n.: 54) - Iter autorizzativ	11/08/2020	16/06/2021	310
5135	GI01 (Area smarino) - Metanodotto interrato DN150 75 bar (Interf. n.: 54) - Fase definitiva	17/06/2021	10/08/2022	420
5136	**REN - Risoluzione interferenze E-Distribuzione**	**11/08/2020**	**03/12/2020**	**115**
5137	GI01 - Risoluzione interferenze E-Distribuzione - Iter autorizzativo/progettuale	11/08/2020	24/09/2020	45
5138	GI01 - Risoluzione interferenze E-Distribuzione (Interf. n.: 55-56-58-59-60)	25/09/2020	03/12/2020	70
5139	**RPP - Risoluzione interferenze Pozzi Privati**	**20/11/2020**	**03/12/2020**	**14**
5140	GI01 - Risoluzione interferenze Pozzi Privati - (Interferenza n. 57)	20/11/2020	03/12/2020	14
5141	**CAN - Attività di Cantierizzazione**	**04/12/2020**	**04/01/2021**	**32**
5143	**GI01A - Galleria Grottaminarda: Opere provvisionali di imbocco lato BA**	**04/12/2020**	**26/09/2021**	**297**
5144	**GI01A - Intero Tratto d'Opera**	**04/12/2020**	**26/09/2021**	**297**
5145	**GI2 - Opere di sostegno e consolidamento**	**07/12/2020**	**25/08/2021**	**262**
5183	**GI3 - Scavo**	**04/12/2020**	**05/08/2021**	**245**
5195	**GI4 - Preanello di imbocco (Dima)**	**26/08/2021**	**26/09/2021**	**32**
5207	**GI02 - Galleria Grottaminarda: Opere provvisionali di imbocco lato Napoli**	**27/04/2021**	**04/03/2022**	**312**
5208	**GI02A - Galleria Grottaminarda: Opere provvisionali di imbocco lato NA**	**27/04/2021**	**04/03/2022**	**312**
5265	**GI03 - Galleria Melito: Opere provvisionali di imbocco lato Bari**	**27/04/2021**	**20/03/2022**	**328**
5266	**GI03A - Galleria Melito: Opere provvisionali di imbocco lato BA**	**27/04/2021**	**20/03/2022**	**328**
5353	**GI04 - Galleria Melito: Opere provvisionali di imbocco lato Napoli**	**25/11/2021**	**16/02/2023**	**449**
5354	**GI04 - Intera Opera**	**25/11/2021**	**03/01/2022**	**40**
5355	**GI04 - Intera Opera**	**25/11/2021**	**03/01/2022**	**40**
5356	**RCS - Risoluzione interferenze Canali di Scolo**	**25/11/2021**	**03/01/2022**	**40**
5358	**GI04A - Galleria Melito: Opere provvisionali di imbocco lato NA**	**04/01/2022**	**16/02/2023**	**409**
5437	**GI05 - Galleria Rocchetta: Opere provvisionali di imbocco lato Bari**	**03/11/2021**	**29/10/2022**	**361**
5438	**GI05A - Galleria Rocchetta: Opere provvisionali di imbocco lato BA**	**03/11/2021**	**29/10/2022**	**361**
5513	**GI06 - Galleria Rocchetta: Opere provvisionali di imbocco lato Napoli**	**11/08/2020**	**23/09/2021**	**409**
5514	**GI06 - Intera Opera**	**11/08/2020**	**23/03/2021**	**225**
5515	**GI06 - Intera Opera**	**11/08/2020**	**23/03/2021**	**225**
5516	**BOE - Bonifica da Ordigni Esplosivi (Collaudo Genio Militare)**	**09/10/2020**	**09/10/2020**	**0**
5518	**RTT - Risoluzione interferenze TELECOM/TIM**	**11/08/2020**	**03/12/2020**	**115**
5519	GI06 - Risoluzione interferenze TIM (Interf. n.: 100-102-108) - Iter autorizzativo/progettuale	11/08/2020	24/09/2020	45
5520	GI06 - Risoluzione interferenze TIM (Interf. n.: 100-102-108) - Risoluzione	25/09/2020	03/12/2020	70
5521	**REN - Risoluzione interferenze E-Distribuzione**	**11/08/2020**	**03/12/2020**	**115**
5522	GI06 - Risoluzione interferenze E-Distribuzione (Interf. n.: 97-101-110-111-112-122) - Iter au	11/08/2020	24/09/2020	45
5523	GI06 - Risoluzione interferenze E-Distribuzione (Interf. n.: 97-101-110-111-112-122) - Risolu	25/09/2020	03/12/2020	70
5524	**RAC - Risoluzione interferenze Acquedotto Alto Calore**	**11/08/2020**	**23/03/2021**	**225**
5525	GI06 - Risoluzione interferenze Acquedotto Alto Calore (Interf. n.: 114+ da AC01 a AC16) - It	11/08/2020	24/09/2020	45
5526	GI06 - Risoluzione interferenze Acquedotto Alto Calore (Interf. n.: 114) - Risoluzione	25/09/2020	03/12/2020	70
5527	Intera Linea - Risoluzione interferenze Acquedotto Alto Calore (Interf. n.: da AC01 a AC16) -	25/09/2020	23/03/2021	180
5528	**RPP - Risoluzione interferenze Pozzi Privati**	**20/11/2020**	**03/12/2020**	**14**
5529	GI06 - Risoluzione interferenze Pozzi Privati - (Interferenza n. 113)	20/11/2020	03/12/2020	14
5530	**RCS - Risoluzione interferenze Canali di Scolo**	**04/11/2020**	**03/12/2020**	**30**
5531	GI06 - Risoluzione interferenze Canali di Scolo - (Interferenza n. 115)	04/11/2020	03/12/2020	30
5532	**CAN - Attività di Cantierizzazione**	**09/11/2020**	**27/11/2020**	**19**
5534	**GI06A - Galleria Rocchetta: Opere provvisionali di imbocco lato NA**	**09/11/2020**	**23/09/2021**	**319**
5535	**GI06A - Intero Tratto d'Opera**	**09/11/2020**	**23/09/2021**	**319**
5536	**GI2 - Opere di sostegno e consolidamento**	**11/11/2020**	**16/08/2021**	**279**
5579	**GI3 - Scavo**	**09/11/2020**	**03/08/2021**	**268**
5596	**GI4 - Preanello di imbocco (Dima)**	**17/08/2021**	**23/09/2021**	**38**

Attività Milestones Riepilogo

ID	Nome attività	Inizio	Fine	Durata gg solari
5608	**GI07 - Uscita/accesso pedonale F1: Opere provvisionali di imbocco**	**13/07/2021**	**25/10/2021**	**105**
5609	**GI07A - Uscita/accesso pedonale F1: Opere provvisionali di imbocco**	**13/07/2021**	**25/10/2021**	**105**
5660	**GI08 - Uscita/accesso pedonale F2: Opere provvisionali di imbocco**	**22/03/2022**	**20/06/2022**	**91**
5661	**GI08A - Uscita/accesso pedonale F2: Opere provvisionali di imbocco**	**22/03/2022**	**20/06/2022**	**91**
5694	**GI09 - Uscita/accesso carrabile F3: Opere provvisionali di imbocco**	**30/04/2021**	**09/10/2021**	**163**
5695	**GI09A - Uscita/accesso carrabile F3: Opere provvisionali di imbocco**	**30/04/2021**	**09/10/2021**	**163**
5752	**GI10 - Uscita/accesso pedonale F4: Opere provvisionali di imbocco**	**02/08/2022**	**27/11/2022**	**118**
5753	**GI10A - Uscita/accesso pedonale F4: Opere provvisionali di imbocco**	**02/08/2022**	**27/11/2022**	**118**
5800	**GI11 - Uscita/accesso pedonale F5: Opere provvisionali di imbocco**	**18/05/2021**	**23/08/2021**	**98**
5801	**GI11A - Uscita/accesso pedonale F5: Opere provvisionali di imbocco**	**18/05/2021**	**23/08/2021**	**98**
5846	**GI12 - Uscita/accesso carrabile F6: Opere provvisionali di imbocco**	**11/08/2020**	**27/07/2021**	**351**
5847	**GI12 - Intera Opera**	**11/08/2020**	**03/12/2020**	**115**
5848	**GI12 - Intera Opera**	**11/08/2020**	**03/12/2020**	**115**
5849	**REN - Risoluzione interferenze E-Distribuzione**	**11/08/2020**	**03/12/2020**	**115**
5850	GI12 - Risoluzione interferenze E-Distribuzione (Interf. n.: 84 (DT06)) - Iter autorizzativo/prc	11/08/2020	24/09/2020	45
5851	GI12 - Risoluzione interferenze E-Distribuzione (Interf. n.: 84 (DT06))	25/09/2020	03/12/2020	70
5852	**GI12A - Uscita/accesso carrabile F6: Opere provvisionali di imbocco**	**22/02/2021**	**27/07/2021**	**156**
5923	**GI13 - Uscita/accesso pedonale F7: Opere provvisionali di imbocco**	**20/07/2021**	**26/10/2021**	**99**
5924	**GI13A - Uscita/accesso pedonale F7: Opere provvisionali di imbocco**	**20/07/2021**	**26/10/2021**	**99**
5975	**GN01 - Galleria Grottaminarda**	**27/09/2021**	**19/04/2024**	**936**
5976	**GN01M - Galleria Grottaminarda - Scavo meccanizzato**	**27/09/2021**	**19/04/2024**	**936**
5984	**GN02 - Galleria Melito**	**23/05/2022**	**25/06/2024**	**765**
5985	**GN02M - Galleria Melito - Scavo meccanizzato**	**23/05/2022**	**25/06/2024**	**765**
5995	**GN03 - Galleria Rocchetta**	**24/09/2021**	**21/12/2023**	**819**
5996	**GN03A - Galleria Melito - Scavo meccanizzato**	**24/09/2021**	**21/12/2023**	**819**
6004	**GN04 - Uscita/accesso pedonale Galleria Grottaminarda F1**	**26/10/2021**	**21/12/2023**	**787**
6005	**GN04A - Uscita/accesso pedonale F1. Concio d'attacco**	**26/10/2021**	**24/07/2022**	**272**
6015	**GN04B - Uscita/accesso pedonale F1. Sezione tipo B2**	**05/11/2021**	**23/07/2022**	**261**
6025	**GN04C - Uscita/accesso pedonale F1. Sezione tipo C2**	**05/11/2021**	**23/07/2022**	**261**
6035	**GN04D - Uscita/accesso pedonale F1. Sezione tipo C2p**	**05/11/2021**	**23/07/2022**	**261**
6045	**GN04F - Uscita/accesso pedonale F1. Sezione tipo B2 allargata**	**05/11/2021**	**23/07/2022**	**261**
6055	**GN04E - Uscita/accesso pedonale F1. Sezione di innesto**	**11/10/2023**	**21/12/2023**	**72**
6080	**GN05 - Uscita/accesso pedonale Galleria Melito F2**	**21/06/2022**	**03/01/2024**	**562**
6081	**GN05A - Uscita/accesso pedonale F2. Concio d'attacco**	**21/06/2022**	**17/01/2023**	**211**
6091	**GN05C - Uscita/accesso pedonale F2. Sezione tipo B2**	**30/06/2022**	**16/01/2023**	**201**
6101	**GN05E - Uscita/accesso pedonale F2. Sezione tipo C2**	**30/06/2022**	**16/01/2023**	**201**
6111	**GN05F - Uscita/accesso pedonale F2. Sezione tipo C2p**	**30/06/2022**	**16/01/2023**	**201**
6121	**GN05H - Uscita/accesso pedonale F2. Sezione tipo B0V**	**30/06/2022**	**16/01/2023**	**201**
6131	**GN05I - Uscita/accesso pedonale F2. Sezione tipo C1V**	**30/06/2022**	**16/01/2023**	**201**
6141	**GN05G - Uscita/accesso pedonale F2. Sezione di innesto**	**16/10/2023**	**03/01/2024**	**80**
6166	**GN06 - Uscita/accesso carrabile Galleria Melito F3 e cunicolo parallelo pedonale**	**13/01/2022**	**19/11/2024**	**1042**
6167	**GN06A - Uscita/accesso carrabile F3. Concio d'attacco**	**13/01/2022**	**19/11/2024**	**1042**
6177	**GN06C - Uscita/accesso carrabile F3. Sezione tipo B2**	**26/01/2022**	**18/11/2024**	**1028**
6187	**GN06E - Uscita/accesso carrabile F3. Sezione tipo C2**	**26/01/2022**	**18/11/2024**	**1028**
6197	**GN06O - Uscita/accesso carrabile F3. Sezione tipo B0V**	**26/01/2022**	**18/11/2024**	**1028**
6207	**GN06P - Uscita/accesso carrabile F3. Sezione tipo B1V**	**26/01/2022**	**18/11/2024**	**1028**
6217	**GN06Q - Uscita/accesso carrabile F3. Sezione tipo B2r**	**26/01/2022**	**18/11/2024**	**1028**
6227	**GN06F - Uscita/accesso carrabile F3. Camerone di manovra**	**03/01/2023**	**13/11/2024**	**681**
6245	**GN06G - Uscita/accesso carrabile F3. Sezione di innesto**	**11/10/2023**	**21/12/2023**	**72**
6270	**GN06H - Uscita/accesso pedonale cunicolo parallelo. Sezione tipo A2**	**23/04/2023**	**08/11/2024**	**566**
6280	**GN06L - Uscita/accesso pedonale cunicolo parallelo. Sezione tipo B2**	**23/04/2023**	**08/11/2024**	**566**
6290	**GN06M - Uscita/accesso pedonale cunicolo parallelo. Sezione tipo C2**	**23/04/2023**	**08/11/2024**	**566**
6300	**GN06S - Uscita/accesso pedonale cunicolo parallelo. Sezione tipo B0V**	**23/04/2023**	**08/11/2024**	**566**
6310	**GN06T - Uscita/accesso pedonale cunicolo parallelo. Sezione tipo B2 allargata**	**23/04/2023**	**08/11/2024**	**566**
6320	**GN06N - Uscita/accesso pedonale cunicolo parallelo. Sezione di innesto**	**11/10/2023**	**21/12/2023**	**72**
6345	**GN07 - Uscita/accesso pedonale Galleria Melito F4**	**28/11/2022**	**03/01/2024**	**402**
6346	**GN07A - Uscita/accesso pedonale F4. Concio d'attacco**	**28/11/2022**	**22/09/2023**	**299**
6356	**GN07C - Uscita/accesso pedonale F4. Sezione tipo B2**	**07/12/2022**	**21/09/2023**	**289**
6366	**GN07E - Uscita/accesso pedonale F4. Sezione tipo C2**	**07/12/2022**	**21/09/2023**	**289**
6376	**GN07G - Uscita/accesso pedonale F4. Sezione tipo B0V**	**07/12/2022**	**21/09/2023**	**289**
6386	**GN07H - Uscita/accesso pedonale F4. Sezione tipo B1V**	**07/12/2022**	**21/09/2023**	**289**
6396	**GN07I - Uscita/accesso pedonale F4. Sezione tipo B2 allargata**	**07/12/2022**	**21/09/2023**	**289**
6406	**GN07F - Uscita/accesso pedonale F4. Sezione di innesto**	**16/10/2023**	**03/01/2024**	**80**
6431	**GN08 - Uscita/accesso pedonale Galleria Rocchetta F5 e cunicolo parallelo pedonale**	**16/11/2021**	**18/03/2025**	**1219**
6432	**GN08A - Uscita/accesso pedonale F5. Concio d'attacco**	**16/11/2021**	**18/03/2025**	**1219**
6442	**GN08C - Uscita/accesso pedonale F5. Sezione tipo B2**	**25/11/2021**	**17/03/2025**	**1209**
6452	**GN08E - Uscita/accesso pedonale F5. Sezione tipo C2**	**25/11/2021**	**17/03/2025**	**1209**
6462	**GN08P - Uscita/accesso pedonale F5. Sezione tipo B0V**	**25/11/2021**	**17/03/2025**	**1209**
6472	**GN08Q - Uscita/accesso pedonale F5. Sezione tipo B1V**	**25/11/2021**	**17/03/2025**	**1209**
6482	**GN08R - Uscita/accesso pedonale F5. Sezione tipo B2 allargata**	**25/11/2021**	**17/03/2025**	**1209**

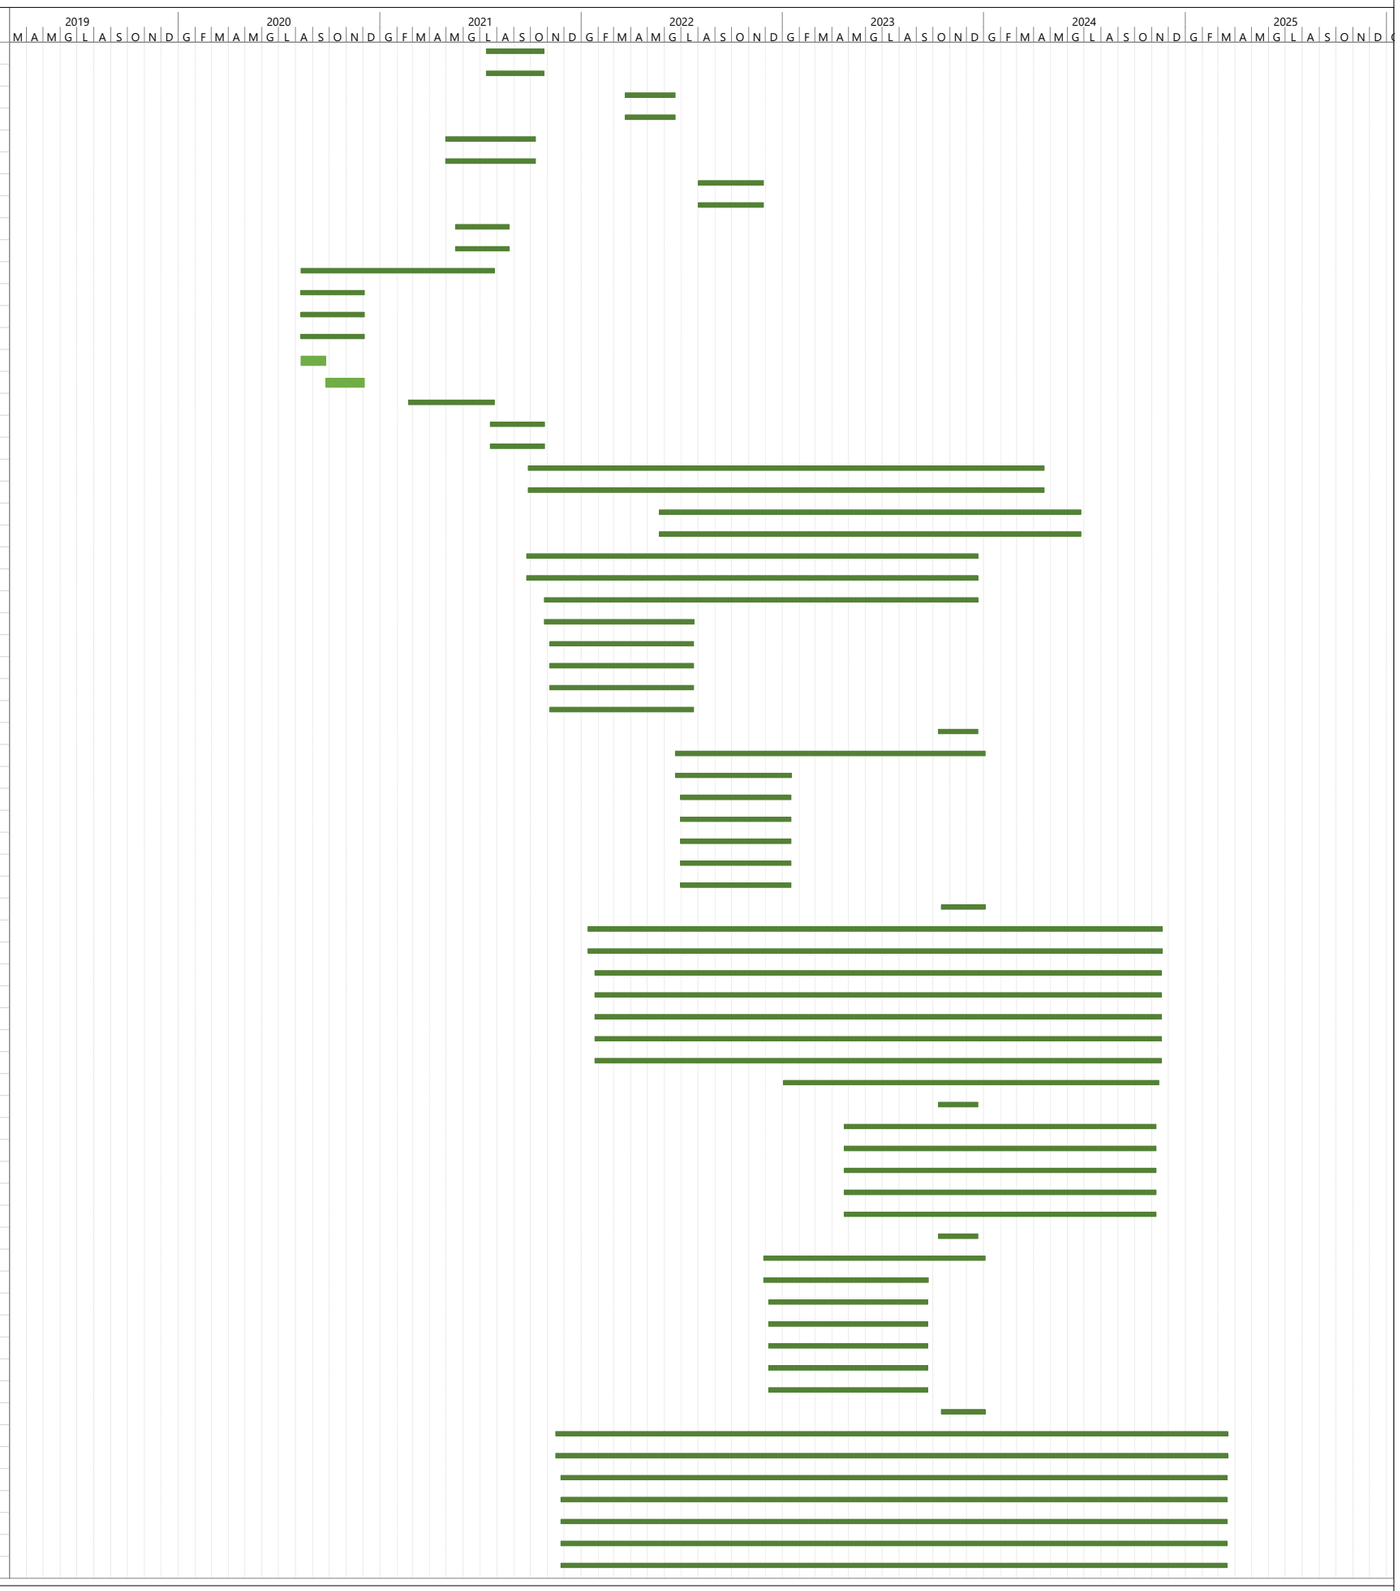

Attività Milestones Riepilogo

ID	Nome attività	Inizio	Fine	Durata gg solari
6492	**GN08S - Uscita/accesso pedonale F5. Sezione tipo C2 allargata**	25/11/2021	17/03/2025	1209
6502	**GN08I - Uscita/accesso pedonale F5. Sezione di innesto**	31/12/2022	23/08/2023	236
6528	**GN08M - Uscita/accesso pedonale cunicolo parallelo. Sezione tipo B2**	09/01/2023	12/03/2025	794
6538	**GN08N - Uscita/accesso pedonale cunicolo parallelo. Sezione tipo C2**	09/01/2023	12/03/2025	794
6548	**GN08T - Uscita/accesso pedonale cunicolo parallelo. Sezione tipo A2**	09/01/2023	12/03/2025	794
6558	**GN08U - Uscita/accesso pedonale cunicolo parallelo. Sezione tipo A2 allargata**	09/01/2023	12/03/2025	794
6568	**GN08V - Uscita/accesso pedonale cunicolo parallelo. Sezione tipo B0**	09/01/2023	12/03/2025	794
6578	**GN08X - Uscita/accesso pedonale cunicolo parallelo. Sezione tipo B2 allargata**	09/01/2023	12/03/2025	794
6588	**GN08O - Uscita/accesso pedonale cunicolo parallelo. Sezione di innesto**	31/05/2023	09/08/2023	71
6613	**GN09 - Finestra costruttiva/Uscita di emergenza Galleria Rocchetta F6 e cunicoli paralleli pedonali**	02/10/2021	10/09/2025	1440
6614	**GN09A - Uscita/accesso carrabile F6. Concio d'attacco**	02/10/2021	10/09/2025	1440
6624	**GN09C - Uscita/accesso carrabile F6. Sezione tipo B2**	15/10/2021	04/09/2025	1421
6634	**GN09E - Uscita/accesso carrabile F6. Sezione tipo C2**	15/10/2021	04/09/2025	1421
6644	**GN09R - Uscita/accesso carrabile F6. Sezione tipo B0V**	15/10/2021	04/09/2025	1421
6654	**GN09S - Uscita/accesso carrabile F6. Sezione tipo B2r**	15/10/2021	09/09/2025	1426
6664	**GN09T - Uscita/accesso carrabile F6. Sezione tipo C1V**	15/10/2021	09/09/2025	1426
6674	**GN09F - Uscita/accesso carrabile F6. Camerone di manovra**	06/07/2023	29/08/2025	786
6692	**GN09G - Uscita/accesso carrabile F6. Sezione di innesto**	24/05/2023	02/08/2023	71
6717	**GN09I - Uscita/accesso pedonale cunicolo parallelo lato BA. Sezione tipo B2**	29/10/2023	24/08/2025	666
6727	**GN09L - Uscita/accesso pedonale cunicolo parallelo lato BA. Sezione tipo C2**	29/10/2023	24/08/2025	666
6737	**GN09U - Uscita/accesso pedonale cunicolo parallelo lato BA. Sezione tipo A2**	29/10/2023	24/08/2025	666
6747	**GN09X - Uscita/accesso pedonale cunicolo parallelo lato BA. Sezione tipo B0V**	29/10/2023	24/08/2025	666
6757	**GN09Y - Uscita/accesso pedonale cunicolo parallelo lato BA. Sezione tipo B2 allargata**	29/10/2023	24/08/2025	666
6767	**GN09M - Uscita/accesso pedonale cunicolo parallelo lato BA. Sezione di innesto**	24/05/2023	02/08/2023	71
6792	**GN09O - Uscita/accesso pedonale cunicolo parallelo lato NA. Sezione tipo B2**	29/10/2023	24/08/2025	666
6802	**GN09P - Uscita/accesso pedonale cunicolo parallelo lato NA. Sezione tipo C2**	29/10/2023	24/08/2025	666
6812	**GN09Z - Uscita/accesso pedonale cunicolo parallelo lato NA. Sezione tipo A2**	29/10/2023	24/08/2025	666
6822	**GN09Z1 - Uscita/accesso pedonale cunicolo parallelo lato NA. Sezione tipo A2 allargata**	29/10/2023	24/08/2025	666
6832	**GN09Z2 - Uscita/accesso pedonale cunicolo parallelo lato NA. Sezione tipo B0V**	29/10/2023	24/08/2025	666
6842	**GN09Z3 - Uscita/accesso pedonale cunicolo parallelo lato NA. Sezione tipo B2 allargata**	29/10/2023	24/08/2025	666
6852	**GN09Q - Uscita/accesso pedonale cunicolo parallelo lato NA. Sezione di innesto**	31/05/2023	09/08/2023	71
6877	**GN10 - Uscita/accesso pedonale Galleria Rocchetta F7**	27/10/2021	23/08/2023	666
6878	**GN10A - Uscita/accesso pedonale F7. Concio d'attacco**	27/10/2021	09/03/2023	499
6888	**GN10C - Uscita/accesso pedonale F7. Sezione tipo B2**	06/11/2021	08/03/2023	488
6898	**GN10D - Uscita/accesso pedonale F7. Sezione tipo C1**	06/11/2021	08/03/2023	488
6908	**GN10G - Uscita/accesso pedonale F7. Sezione tipo A2**	06/11/2021	08/03/2023	488
6918	**GN10H - Uscita/accesso pedonale F7. Sezione tipo B0V**	06/11/2021	08/03/2023	488
6928	**GN10I - Uscita/accesso pedonale F7. Sezione tipo B2 allargata**	06/11/2021	08/03/2023	488
6938	**GN10L - Uscita/accesso pedonale F7. Sezione tipo C1V**	06/11/2021	08/03/2023	488
6948	**GN10F - Uscita/accesso pedonale F7. Sezione di innesto**	08/06/2023	23/08/2023	77
6973	**GN00 - Movimento terre gallerie naturali, nicchie e cunicoli**	02/10/2021	05/06/2025	1343
6974	**GN00A - Movimento terre Galleria Grottaminarda e nicchie**	27/12/2021	11/08/2024	959
6979	**GN00B - Movimento terre Galleria Melito e nicchie**	20/09/2022	30/08/2024	711
6984	**GN00C - Movimento terre Galleria Rocchetta e nicchie**	19/12/2021	19/04/2024	853
6989	**GN00D - Movimento terre Uscita/accesso pedonale F1**	26/10/2021	12/06/2022	230
6993	**GN00E - Movimento terre Uscita/accesso pedonale F2**	21/06/2022	13/12/2022	176
6997	**GN00F - Movimento terre Uscita/accesso carrabile F3 e cunicolo parallelo pedonale**	13/01/2022	23/08/2024	954
7001	**GN00G - Movimento terre Uscita/accesso pedonale F4**	28/11/2022	02/08/2023	248
7005	**GN00H - Movimento terre Uscita/accesso pedonale F5 e cunicolo parallelo pedonale**	16/11/2021	14/10/2024	1064
7009	**GN00I - Movimento terre Uscita/accesso carrabile F6 e cunicoli paralleli pedonali**	02/10/2021	05/06/2025	1343
7013	**GN00L - Movimento terre Uscita/accesso pedonale F7**	27/10/2021	05/01/2023	436
7017	**GR01 - Galleria Grottaminarda Nicchie**	22/12/2023	17/08/2024	240
7018	**GR01A - Nicchie LFM/Connessioni induttive tipo B**	22/12/2023	17/08/2024	240
7022	**GR01B - Nicchie LFM/Connessioni induttive tipo C**	22/12/2023	17/08/2024	240
7026	**GR01C - Nicchie Tecnologiche**	22/12/2023	17/08/2024	240
7030	**GR02 - Galleria Melito Nicchie**	04/01/2024	30/08/2024	240
7031	**GR02A - Nicchie LFM/Connessioni induttive tipo B**	04/01/2024	30/08/2024	240
7035	**GR02B - Nicchie LFM/Connessioni induttive tipo C**	04/01/2024	30/08/2024	240
7039	**GR02C - Nicchie Tecnologiche tipo B**	04/01/2024	30/08/2024	240
7043	**GR02D - Nicchie Tecnologiche tipo C**	04/01/2024	30/08/2024	240
7047	**GR03 - Galleria Rocchetta Nicchie**	24/08/2023	19/04/2024	240
7048	**GR03A - Nicchie LFM/Connessioni induttive tipo B**	24/08/2023	19/04/2024	240
7052	**GR03B - Nicchie LFM/Connessioni induttive tipo C**	24/08/2023	19/04/2024	240
7056	**GR03C - Nicchie Tecnologiche tipo B**	24/08/2023	19/04/2024	240
7060	**GR03D - Nicchie Tecnologiche tipo C**	24/08/2023	19/04/2024	240
7064	**GA01 - Galleria Grottaminarda: Tratto artificiale di imbocco lato Bari**	22/04/2024	23/08/2024	124
7065	**GA01A - Galleria Grottaminarda: Galleria Artificiale lato BA**	22/04/2024	23/08/2024	124
7077	**GA02 - Galleria Grottaminarda: Tratto artificiale di imbocco lato Napoli**	22/04/2024	23/08/2024	124
7078	**GA02A - Galleria Grottaminarda: Galleria Artificiale lato NA**	22/04/2024	23/08/2024	124
7090	**GA03 - Galleria Melito: Tratto artificiale di imbocco lato Bari**	26/06/2024	26/09/2024	93

Attività Milestones Riepilogo

ID	Nome attività	Inizio	Fine	Durata gg solari
7091	**GA03A - Galleria Melito: Galleria Artificiale e Portale d'imbocco lato BA**	**26/06/2024**	**26/09/2024**	**93**
7103	**GA04 - Galleria Melito: Tratto artificiale di imbocco lato Napoli**	**26/06/2024**	**03/10/2024**	**100**
7104	**GA04A - Galleria Melito: Galleria Artificiale e Portale d'imbocco lato NA**	**26/06/2024**	**03/10/2024**	**100**
7116	**GA05 - Galleria Rocchetta: Tratto artificiale di imbocco lato Bari**	**22/12/2023**	**26/04/2024**	**127**
7117	**GA05A - Galleria Rocchetta: Galleria Artificiale e Portale d'imbocco lato BA**	**22/12/2023**	**26/04/2024**	**127**
7129	**GA06 - Galleria Rocchetta: Tratto artificiale di imbocco lato Napoli**	**22/12/2023**	**26/04/2024**	**127**
7130	**GA06A - Galleria Rocchetta: Galleria Artificiale e Portale d'imbocco lato NA**	**22/12/2023**	**26/04/2024**	**127**
7142	**GA07 - Uscita/accesso pedonale F1: Tratto artificiale di imbocco**	**09/08/2022**	**11/11/2022**	**95**
7143	**GA07A - Uscita/accesso pedonale F1: Galleria artificiale e Portale di imbocco**	**09/08/2022**	**11/11/2022**	**95**
7155	**GA08 - Uscita/accesso pedonale F2: Tratto artificiale di imbocco**	**02/02/2023**	**04/05/2023**	**92**
7156	**GA08A - Uscita/accesso pedonale F2: Galleria artificiale e Portale di imbocco**	**02/02/2023**	**04/05/2023**	**92**
7168	**GA09 - Uscita/accesso carrabile F3: Tratto artificiale di imbocco**	**11/10/2021**	**21/01/2025**	**1199**
7169	**GA09A - Uscita/accesso carrabile F3: Galleria Artificiale e Portale d'imbocco**	**11/10/2021**	**21/01/2025**	**1199**
7181	**GA10 - Uscita/accesso pedonale F4: Tratto artificiale di imbocco**	**09/10/2023**	**22/01/2024**	**106**
7182	**GA10A - Uscita/accesso pedonale F4: Galleria artificiale e Portale di imbocco**	**09/10/2023**	**22/01/2024**	**106**
7194	**GA11 - Uscita/accesso pedonale F5: Tratto artificiale di imbocco**	**24/08/2021**	**22/05/2025**	**1368**
7195	**GA11A - Uscita/accesso pedonale F5: Galleria artificiale e Portale di imbocco**	**24/08/2021**	**22/05/2025**	**1368**
7207	**GA12 - Uscita/accesso carrabile F6: Tratto artificiale di imbocco**	**28/07/2021**	**09/10/2025**	**1535**
7208	**GA12A - Uscita/accesso carrabile F6: Galleria Artificiale e Portale d'imbocco**	**28/07/2021**	**09/10/2025**	**1535**
7220	**GA13 - Uscita/accesso pedonale F7: Tratto artificiale di imbocco**	**11/04/2023**	**18/07/2023**	**99**
7221	**GA13A - Uscita/accesso pedonale F7: Galleria artificiale e Portale di imbocco**	**11/04/2023**	**18/07/2023**	**99**
7233	**FABBRICATI VIAGGIATORI**	**17/08/2020**	**24/10/2023**	**1164**
7234	**FV01 - Stazione di Hirpinia**	**17/08/2020**	**24/10/2023**	**1164**
7235	**FV01 - Intera Opera**	**17/08/2020**	**28/08/2020**	**12**
7236	**FV01 - Intera Opera**	**17/08/2020**	**28/08/2020**	**12**
7237	**RPP - Risoluzione interferenze Pozzi Privati**	**17/08/2020**	**28/08/2020**	**12**
7238	FV01 - Risoluzione interferenze Pozzi Privati - (Interferenza n. 37)	17/08/2020	28/08/2020	12
7239	**FV01A - Fabbricato Viaggiatori di Hirpinia**	**12/03/2021**	**24/10/2023**	**957**
7438	**FV02 - Fermata di Apice**	**04/12/2020**	**27/06/2023**	**936**
7439	**FV02A - Fabbricato Viaggiatori di Apice - 1° fase**	**04/12/2020**	**27/06/2023**	**936**
7440	**FV02A - Intero Tratto d'Opera**	**04/12/2020**	**29/05/2023**	**907**
7441	**FV3 - Fondazioni**	**04/12/2020**	**29/03/2023**	**846**
7444	**FV4 - Elevazioni**	**30/03/2023**	**28/04/2023**	**30**
7446	**FV5 - Solai e coperture**	**02/05/2023**	**29/05/2023**	**28**
7448	**FV7 - Finiture interne ed esterne**	**06/06/2022**	**28/10/2022**	**145**
7450	**FV02 - Banchina 1° marciapiede Stazione Apice**	**06/06/2022**	**28/10/2022**	**145**
7451	**FVB - Marciapiedi**	**06/06/2022**	**28/10/2022**	**145**
7453	**FV02 - Banchina 2° marciapiede Stazione Apice**	**06/06/2022**	**28/10/2022**	**145**
7454	**FVB - Marciapiedi**	**06/06/2022**	**28/10/2022**	**145**
7456	**FV02 - Collegamenti verticali - Rampe 1° marciapiede Stazione Apice**	**29/11/2022**	**01/02/2023**	**65**
7457	**FV3 - Fondazioni**	**29/11/2022**	**03/01/2023**	**36**
7459	**FV4 - Elevazioni**	**04/01/2023**	**01/02/2023**	**29**
7461	**FV02 - Collegamenti verticali - Scale 1° marciapiede Stazione Apice**	**31/10/2022**	**01/02/2023**	**94**
7462	**FV3 - Fondazioni**	**31/10/2022**	**28/11/2022**	**29**
7464	**FV4 - Elevazioni**	**29/11/2022**	**03/01/2023**	**36**
7466	**FV5 - Solai e coperture**	**04/01/2023**	**01/02/2023**	**29**
7468	**FV02 - Collegamenti verticali - Scale 2° marciapiede Stazione Apice**	**04/01/2023**	**29/03/2023**	**85**
7469	**FV3 - Fondazioni**	**04/01/2023**	**01/02/2023**	**29**
7471	**FV4 - Elevazioni**	**02/02/2023**	**01/03/2023**	**28**
7473	**FV5 - Solai e coperture**	**02/03/2023**	**29/03/2023**	**28**
7475	**FV02 - Nucleo EST (sottopasso e scale)**	**02/02/2023**	**28/04/2023**	**86**
7476	**FV3 - Fondazioni**	**02/02/2023**	**01/03/2023**	**28**
7478	**FV4 - Elevazioni**	**02/03/2023**	**29/03/2023**	**28**
7480	**FV5 - Solai e coperture**	**30/03/2023**	**28/04/2023**	**30**
7482	**FV02 - Pensilina binario 3-4**	**02/05/2023**	**27/06/2023**	**57**
7483	**FVA - Pensiline e tettoie**	**02/05/2023**	**27/06/2023**	**57**
7485	**FV02B - Fabbricato Viaggiatori di Apice - 2° fase**	**02/02/2023**	**27/06/2023**	**146**
7499	**BARRIERE ANTIRUMORE**	**20/02/2024**	**15/11/2024**	**270**
7500	**BA02 - BAR H4 su VI02 L=84m**	**11/10/2024**	**15/11/2024**	**36**
7501	**BA02A - BAR H4 su VI02 L=89.6m**	**11/10/2024**	**15/11/2024**	**36**
7507	**BA04 - BAR su viadotto VI04 e su rilevato RI05**	**20/02/2024**	**17/10/2024**	**241**
7508	**BA04A - BAR H4 su VI04 L=714m**	**14/06/2024**	**17/10/2024**	**126**
7514	**BA04B - BAR H2 su RI05 L=70.6m**	**20/02/2024**	**09/05/2024**	**80**
7522	**BA04C - BAR H4 su RI05 L=63m**	**03/04/2024**	**20/06/2024**	**79**
7530	**OPERE DI RIAMBIENTALIZZAZIONE**	**03/09/2025**	**02/12/2025**	**91**
7531	**IA01 - da km 0+000 a km 1+800**	**03/09/2025**	**02/12/2025**	**91**
7532	**IA_MOD_A - Modulo A**	**03/09/2025**	**02/12/2025**	**91**
7540	**IA_MOD_B - Modulo B**	**03/09/2025**	**02/12/2025**	**91**
7548	**IA_MOD_C - Modulo C**	**03/09/2025**	**02/12/2025**	**91**
7556	**IA_MOD_D - Modulo D**	**03/09/2025**	**02/12/2025**	**91**

Attività Milestones Riepilogo

ID	Nome attività	Inizio	Fine	Durata gg solari
7564	IA_MOD_E - Modulo E	03/09/2025	02/12/2025	91
7572	IA02 - da km 2+050 a km 2+700	03/09/2025	02/12/2025	91
7573	IA_MOD_A - Modulo A	03/09/2025	02/12/2025	91
7581	IA_MOD_C - Modulo C	03/09/2025	02/12/2025	91
7589	IA_MOD_E - Modulo E	03/09/2025	02/12/2025	91
7597	IA_MOD_F - Modulo F	03/09/2025	02/12/2025	91
7605	IA03 - da km 4+650 a km 5+150	03/09/2025	02/12/2025	91
7606	IA_MOD_B - Modulo B	03/09/2025	02/12/2025	91
7614	IA_MOD_D - Modulo D	03/09/2025	02/12/2025	91
7622	IA_MOD_E - Modulo E	03/09/2025	02/12/2025	91
7630	IA_MOD_F - Modulo F	03/09/2025	02/12/2025	91
7638	IA04 - da km 5+850 a km 6+150	03/09/2025	02/12/2025	91
7639	IA_MOD_B - Modulo B	03/09/2025	02/12/2025	91
7647	IA05 - da km 7+500 a km 7+700	03/09/2025	02/12/2025	91
7648	IA_MOD_B - Modulo B	03/09/2025	02/12/2025	91
7656	IA06 - da km 9+100 a km 9+250	03/09/2025	02/12/2025	91
7657	IA_MOD_B - Modulo B	03/09/2025	02/12/2025	91
7665	IA07 - da km 9+500 a km 10+150	03/09/2025	02/12/2025	91
7666	IA_MOD_C - Modulo C	03/09/2025	02/12/2025	91
7674	IA_MOD_D - Modulo D	03/09/2025	02/12/2025	91
7682	IA_MOD_F - Modulo F	03/09/2025	02/12/2025	91
7690	IA08 - da km 10+400 a km 10+500	03/09/2025	02/12/2025	91
7691	IA_MOD_B - Modulo B	03/09/2025	02/12/2025	91
7699	IA09 - da km 14+100 a km 14+150	03/09/2025	02/12/2025	91
7700	IA_MOD_B - Modulo B	03/09/2025	02/12/2025	91
7708	IA10 - da km 16+250 a km 18+400	03/09/2025	02/12/2025	91
7709	IA_MOD_A - Modulo A	03/09/2025	02/12/2025	91
7717	IA_MOD_B - Modulo B	03/09/2025	02/12/2025	91
7725	IA_MOD_C - Modulo C	03/09/2025	02/12/2025	91
7733	IA_MOD_E - Modulo E	03/09/2025	02/12/2025	91
7741	IA_MOD_F - Modulo F	03/09/2025	02/12/2025	91
7749	MONITORAGGIO	07/02/2021	02/12/2025	1760
7750	MO01 - Monitoraggio	07/02/2021	02/12/2025	1760
7751	MO01A - Monitoraggio opere di imbocco	07/02/2021	06/02/2023	730
7755	MO01B - Monitoraggio opere interferenti	31/08/2024	28/12/2024	120
7759	MO01C - Monitoraggio geotecnico	07/02/2021	02/12/2025	1760
7763	MO01D - Monitoraggio interno GN (riv. provvisorio e definitivo)	19/12/2021	27/07/2023	586
7767	MO01E - Monitoraggio interno uscite di emergenza (riv. provvisorio e definitivo)	02/10/2021	18/08/2025	1417
7771	CANTIERIZZAZIONE	03/03/2021	18/08/2025	1630
7772	CA01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione	03/03/2021	18/08/2025	1630
7773	CA01A - Aspetti ambientali della cantierizzazione	03/03/2021	18/08/2025	1630
7783	MIGLIORIE OFFERTA TECNICA	07/02/2021	19/04/2024	1168
7784	SB22 - SUBCRITERIO 2.2	07/02/2021	06/02/2022	365
7785	00001 - Generico	07/02/2021	06/02/2022	365
7791	SB23 - SUBCRITERIO 2.3	07/02/2021	06/02/2022	365
7792	00001 - Generico	07/02/2021	06/02/2022	365
7796	SB24 - SUBCRITERIO 2.4	07/02/2021	19/04/2024	1168
7797	00001 - Generico	07/02/2021	19/04/2024	1168
7803	DEPOSITI TEMPORANEI	08/02/2021	02/04/2021	54
7804	DT07 - Deposito Temporaneo	08/02/2021	09/03/2021	30
7805	DT07 - Intera Opera	08/02/2021	09/03/2021	30
7806	DT07 - Intera Opera	08/02/2021	09/03/2021	30
7807	RPP - Risoluzione interferenze Pozzi Privati	08/02/2021	19/02/2021	12
7809	RCS - Risoluzione interferenze Canali di Scolo	08/02/2021	09/03/2021	30
7811	DT08 - Deposito Temporaneo	08/02/2021	02/04/2021	54
7812	DT08 - Intera Opera	08/02/2021	02/04/2021	54
7813	DT08 - Intera Opera	08/02/2021	02/04/2021	54
7814	RPP - Risoluzione interferenze Pozzi Privati	08/02/2021	02/04/2021	54
7819	RCS - Risoluzione interferenze Canali di Scolo	08/02/2021	09/03/2021	30
7821	Sovrastruttura ferrovia, Impianti Elettroferroviari ed Attività in ambito Apice	07/09/2022	29/09/2025	1119
7822	LAVORI DI ARMAMENTO	04/10/2024	18/03/2025	166
7823	AM01 - Tratta Apice - Hirpinia da pk 18+713 a pk 16+610	16/10/2024	14/02/2025	122
7824	AM01A - Tratta Apice - Hirpinia da pk 18+713 a pk 16+610	16/10/2024	14/02/2025	122
7839	AM02 - Tratta Apice - Hirpinia da pk 16+610 a pk 10+090 Galleria	24/10/2024	26/02/2025	126
7840	AM02A - Tratta Apice - Hirpinia da pk 16+610 a pk 10+090 Galleria	24/10/2024	26/02/2025	126
7850	AM03 - Tratta Apice - Irpinia da pk 10+090 a pk 9+550 Viadotto	19/11/2024	27/02/2025	101
7851	AM03A - Tratta Apice - Irpinia da pk 10+090 a pk 9+550 Viadotto	19/11/2024	27/02/2025	101
7861	AM04 - Tratta Apice - Hirpinia da pk 9+550 a pk 5+090 Galleria	21/11/2024	07/03/2025	107
7862	AM04A - Tratta Apice - Hirpinia da pk 9+550 a pk 5+090 Galleria	21/11/2024	07/03/2025	107
7872	AM05 - Tratta Apice - Hirpinia da pk 5+090 a pk 4+700 Viadotto	09/12/2024	10/03/2025	92

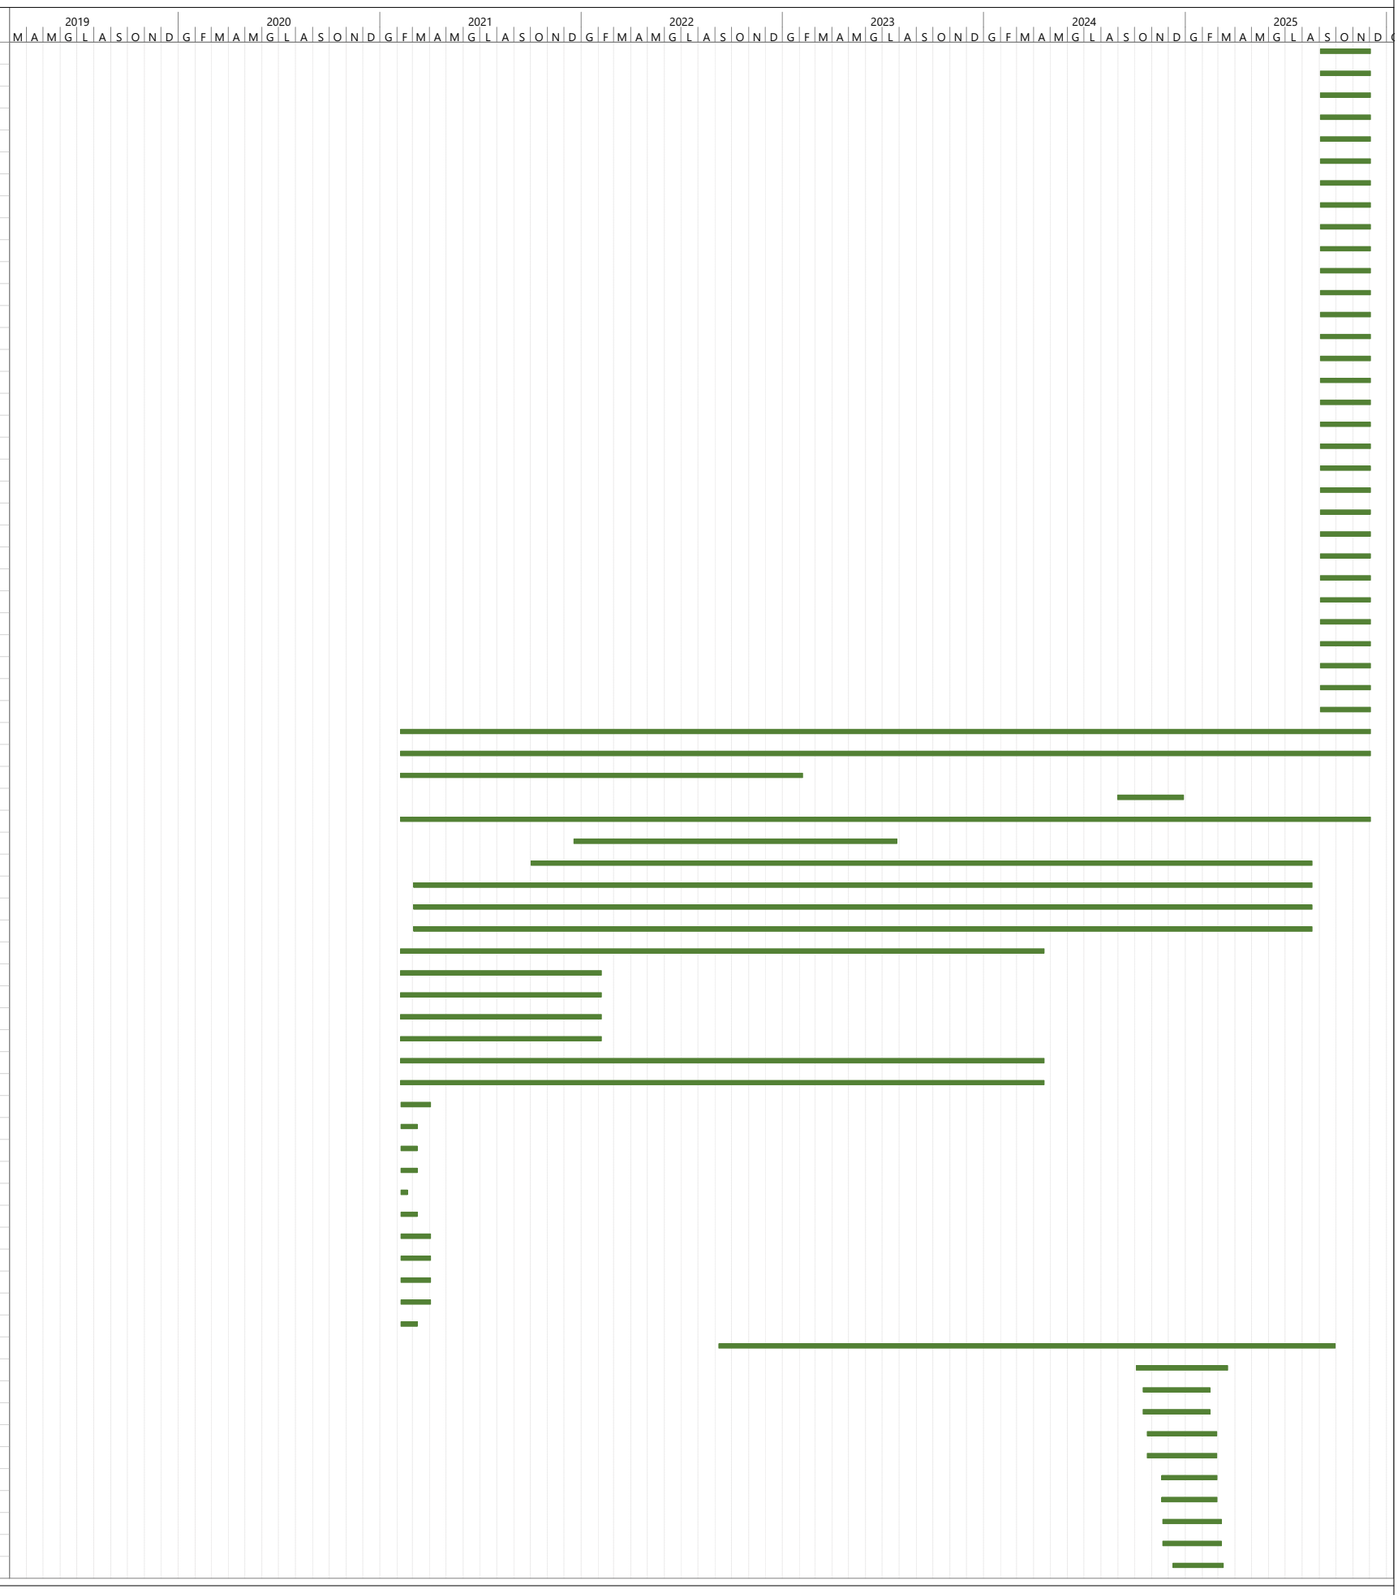

Attività Milestones Riepilogo

ID	Nome attività	Inizio	Fine	Durata gg solari
7873	AM05A - Tratta Apice - Hirpinia da pk 5+090 a pk 4+700 Viadotto	09/12/2024	10/03/2025	92
7883	AM06 - Tratta Apice - Hirpinia da pk 4+700 a pk 2+700 Galleria	10/12/2024	13/03/2025	94
7884	AM06A - Tratta Apice - Hirpinia da pk 4+700 a pk 2+700 Galleria	10/12/2024	13/03/2025	94
7894	AM07 - Stazione Hirpinia da pk 2+700 a pk 0+700	17/12/2024	18/03/2025	92
7895	AM07A - Stazione Hirpinia da pk 2+700 a pk 0+700	17/12/2024	18/03/2025	92
7914	AM08 - Apice Fase 1.1	04/10/2024	15/10/2024	12
7915	AM08A - Apice Fase 1.1	04/10/2024	15/10/2024	12
7931	AM09 - Apice Fase 1.2	31/12/2024	22/01/2025	23
7932	AM09A - Apice Fase 1.2	31/12/2024	22/01/2025	23
7948	AM10 - Apice Fase 1.3	22/01/2025	04/02/2025	14
7949	AM10A - Apice Fase 1.3	22/01/2025	04/02/2025	14
7963	AM11 - APICE - HIRPINIA - Tonnellaggio	05/02/2025	11/02/2025	7
7964	AM11A - APICE - HIRPINIA - Tonnellaggio	05/02/2025	11/02/2025	7
7970	IMPIANTI TE	16/01/2025	29/09/2025	257
7971	LC01 - STAZIONE DI APICE	16/01/2025	17/02/2025	33
7972	LC01 - Intera Opera	16/01/2025	03/02/2025	19
7973	LC01 - Intera Opera	16/01/2025	03/02/2025	19
7974	RWT - Risoluzione interferenze WIND TRE	16/01/2025	03/02/2025	19
7976	LC01A - PC APICE - FASE 1.1	16/01/2025	21/01/2025	6
7990	LC01B - PC APICE - FASE 1.2	22/01/2025	28/01/2025	7
8008	LC01C - PC APICE - FASE 1.3	29/01/2025	03/02/2025	6
8020	LC01D - PC APICE - FASE 1.4	04/02/2025	17/02/2025	14
8038	LC02 - TRATTA APICE(e)-HIRPINIA(e)	19/03/2025	30/06/2025	104
8039	LC02A - TRATTA APICE-HIRPINIA	19/03/2025	30/06/2025	104
8053	LC03 - STAZIONE HIRPINIA	01/07/2025	28/07/2025	28
8054	LC03A - STAZIONE HIRPINIA	01/07/2025	28/07/2025	28
8070	LC11 - ALIMENTATORI STAZIONE APICE	18/02/2025	14/04/2025	56
8071	LC11A - ALIMENTATORI PC APICE	18/02/2025	14/04/2025	56
8077	LC12 - ALIMENTATORI STAZIONE HIRPINIA	29/07/2025	29/09/2025	63
8078	LC12A - ALIMENTATORI STAZIONE HIRPINIA	29/07/2025	29/09/2025	63
8085	IMPIANTI SEGNALAMENTO	08/10/2024	17/03/2025	161
8086	AC01 - APPARATI A RELÈ - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ACEI APICE	08/10/2024	17/02/2025	133
8087	AC011 - ACEI - APICE	08/10/2024	17/02/2025	133
8103	AC02 - REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONI HIRPINIA	18/02/2025	17/03/2025	28
8104	AC021 - CANALIZZAZIONI HIRPINIA	18/02/2025	17/03/2025	28
8111	IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI	29/04/2023	02/09/2025	858
8112	TC01 - IMPIANTI TLC	29/04/2023	02/09/2025	858
8113	TC01A - Fermata di Apice	29/04/2023	25/10/2023	180
8117	TC01B - Stazione di Hirpinia	25/10/2023	21/04/2024	180
8125	TC01C - Galleria Rocchetta	01/07/2025	02/09/2025	64
8129	TC01E - Galleria Melito-Grottaminarda	01/07/2025	02/09/2025	64
8133	TRATTA BA APICE IRPINIA CANALIZZAZIONI	21/05/2023	16/11/2023	180
8134	BL02 - TRATTA BA APICE IRPINIA CANALIZZAZIONI	21/05/2023	16/11/2023	180
8135	BL021 - TRATTA BA APICE IRPINIA	21/05/2023	16/11/2023	180
8144	LINEA PRIMARIA	07/09/2022	20/05/2023	256
8145	LP02 - SSE HIRPOINIA - LINEA PRIMARIA	07/09/2022	20/05/2023	256
8146	LP02 - Intera Opera	07/09/2022	07/09/2022	0
8147	LP02 - Intera Opera	07/09/2022	07/09/2022	0
8148	BOE - Bonifica da Ordigni Esplosivi (Collaudo Genio Militare)	07/09/2022	07/09/2022	0
8150	LP02A - SSE HIRPINIA - LINEA PRIMARIA 150 kV	08/09/2022	20/05/2023	255
8164	IMPIANTI MATS e SSE	08/09/2022	02/09/2025	1091
8165	SE01 - SSE APICE	08/09/2022	10/05/2023	245
8166	SE01A - SSE APICE	08/09/2022	10/05/2023	245
8202	SE02 - SSE HIRPINIA	03/01/2024	03/09/2024	245
8203	SE02A - SSE HIRPINIA	03/01/2024	03/09/2024	245
8239	TE01 - MATS GALLERIA MELITO-GROTTAMINARDA	01/07/2025	02/09/2025	64
8240	TE01A - MATS GALLERIA MELITO - GROTTAMINARDA - IMBOCCO LATO NAPOLI	01/07/2025	02/09/2025	64
8258	TE01B - MATS GALLERIA MELITO - GROTTAMINARDA - FINESTRA INTERMEDIA 1	01/07/2025	02/09/2025	64
8272	TE01C - MATS GALLERIA MELITO - GROTTAMINARDA - IMBOCCO TRA GALLERIE	01/07/2025	02/09/2025	64
8288	TE01D - MATS GALLERIA MELITO - GROTTAMINARDA - IMBOCCO LATO FOGGIA	01/07/2025	02/09/2025	64
8304	TE02 - MATS GALLERIA ROCCHETTA	01/07/2025	02/09/2025	64
8305	TE02A - MATS GALLERIA ROCCHETTA - IMBOCCO LATO NAPOLI	01/07/2025	02/09/2025	64
8323	TE02B - MATS GALLERIA ROCCHETTA - FINESTRA INTERMEDIA	01/07/2025	02/09/2025	64
8337	TE02C - MATS GALLERIA ROCCHETTA - IMBOCCO LATO FOGGIA	01/07/2025	02/09/2025	64
8351	Fabbricati Tecnoloici	31/12/2022	13/12/2024	714
8352	FABBRICATI	31/12/2022	13/12/2024	714
8353	FA01 - FA Tecnologico Lungo Linea di Hirpinia	03/01/2024	05/07/2024	185
8354	FA01A - FSA di Hirpinia	03/01/2024	05/07/2024	185
8364	FA02 - PGEP Imbocco E Grottaminarda	05/06/2024	11/11/2024	160
8365	FA02A - PGEP Imbocco E Grottaminarda (GN01)	05/06/2024	27/10/2024	145

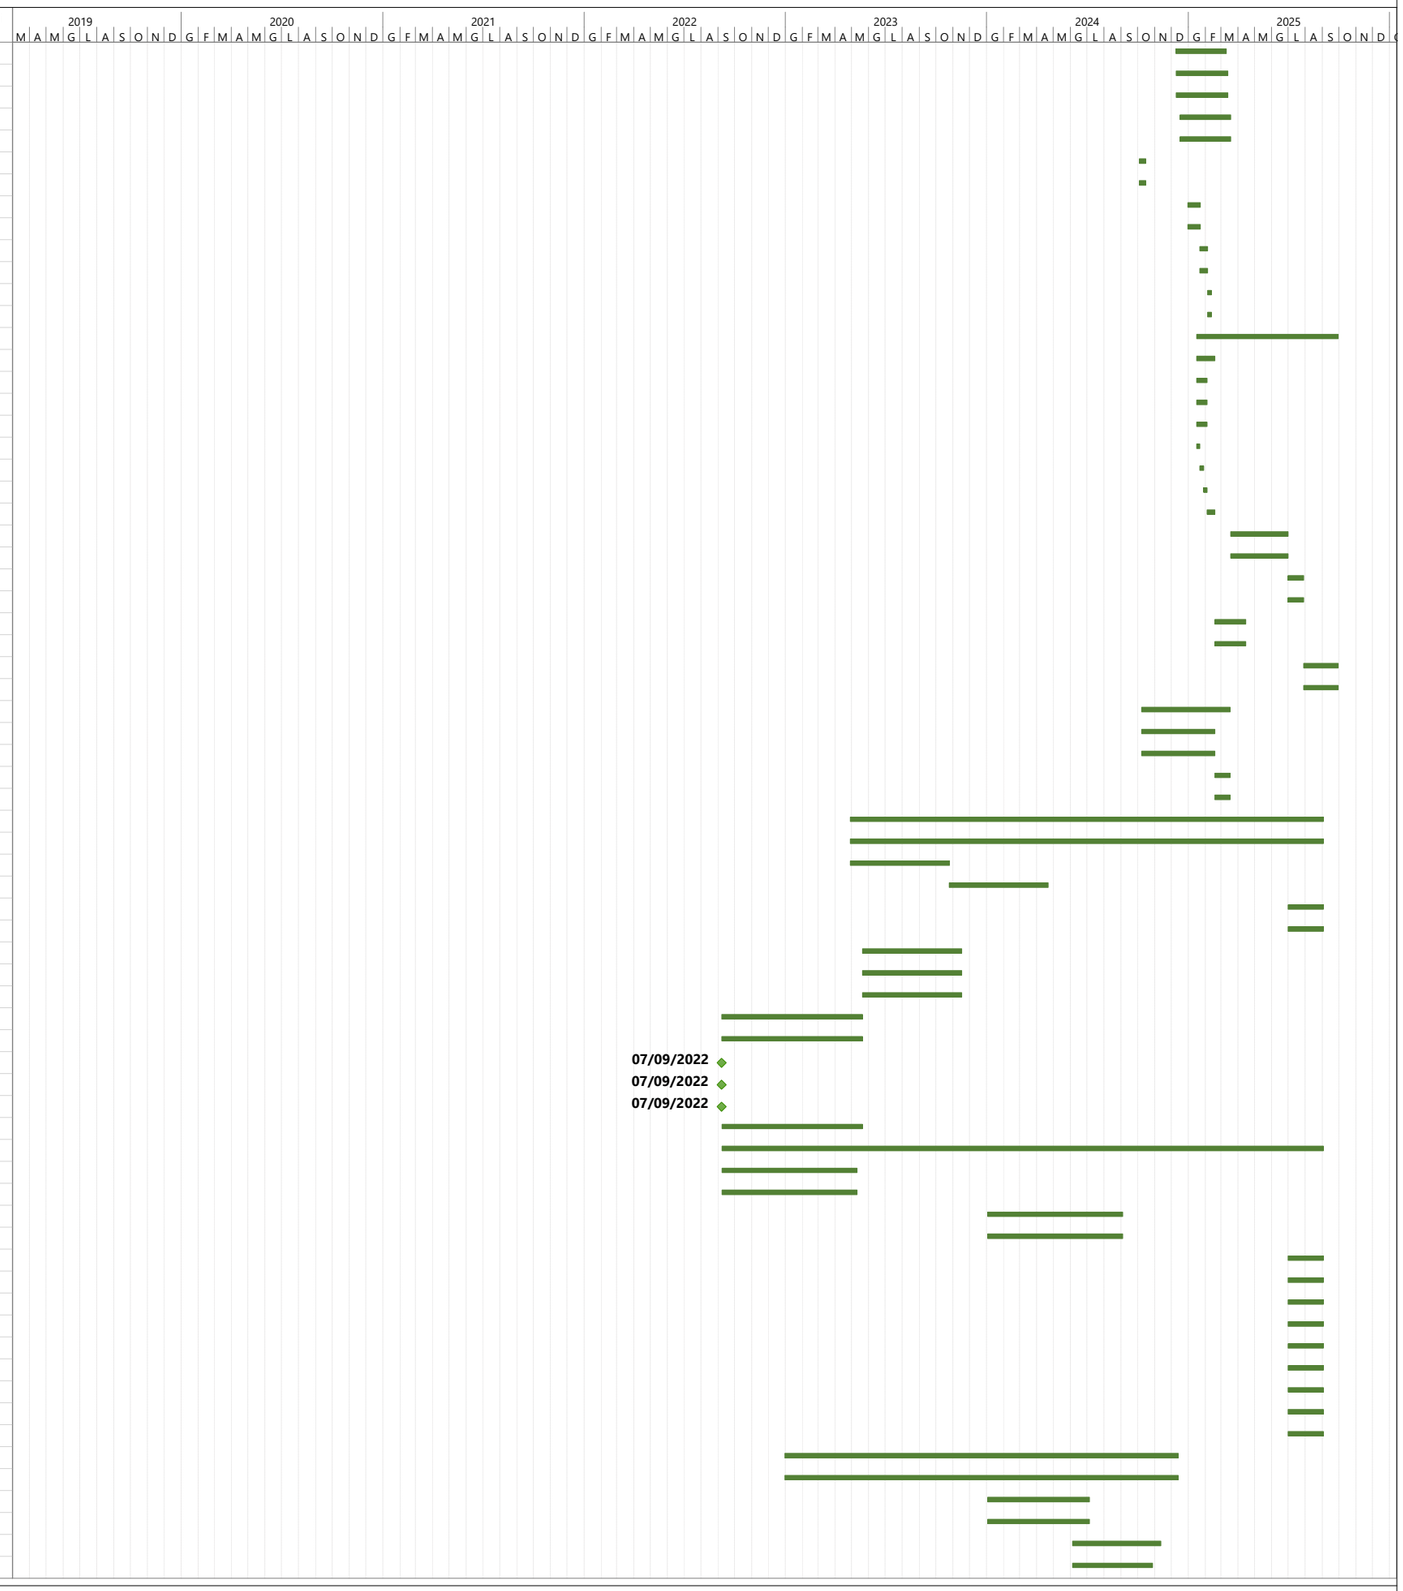

Attività Milestones Riepilogo

ID	Nome attività	Inizio	Fine	Durata gg solari
8375	FA02B - Vasca Antincendio Imbocco E Grottaminarda (GN01)	10/07/2024	11/11/2024	125
8385	FA03 - FA Imbocco W Grottaminarda	20/04/2024	27/09/2024	161
8386	FA03A - FA Tecnologico Imbocco W Grottaminarda (GN01)	20/04/2024	12/09/2024	146
8396	FA03B - PPT Imbocco W Grottaminarda (GN01)	05/06/2024	27/09/2024	115
8406	FA04 - FA tecnologico Finestra n°2 di Melito (GN02)	23/04/2023	10/08/2023	110
8407	FA04A - FA Tecnologico Finestra n.2 Melito (GN02)	23/04/2023	10/08/2023	110
8417	FA05 - PGEP di Melito	04/01/2024	11/06/2024	160
8418	FA05A - FA PGEP Imbocco W Melito (GN02)	04/01/2024	22/05/2024	140
8428	FA05B - Vasca Imbocco W Melito (GN02 - galleria Grottaminarda)	08/02/2024	01/06/2024	115
8438	FA05C - PPT Imbocco W Melito (GN02)	28/02/2024	11/06/2024	105
8448	FA06 - FA di Rocchetta - Finestra 1	31/12/2022	29/04/2023	120
8449	FA06A - FA Tecnologico Finestra n.1 Rocchetta	31/12/2022	29/04/2023	120
8459	FA07 - FA di Rocchetta - Finestra 2	29/10/2023	25/02/2024	120
8460	FA07A - FA Tecnologico Finestra n.2 Rocchetta	29/10/2023	25/02/2024	120
8470	FA08 - PGEP di Rocchetta	09/03/2024	15/08/2024	160
8471	FA08A - PGEP Imbocco W Rocchetta (GN03)	09/03/2024	31/07/2024	145
8481	FA08B - Vasca Imbocco W Rocchetta (GN03)	13/04/2024	15/08/2024	125
8491	FA09 - PPT di Paduli	16/08/2024	13/12/2024	120
8492	FA09A - PPT di Paduli	16/08/2024	13/12/2024	120
8502	Impianti Civili	24/03/2021	19/10/2025	1671
8503	IMPIANTI MECCANICI	25/07/2022	19/10/2025	1183
8504	IM01 - Fabbricato FSA di Hirpinia (FA01)	06/07/2024	03/10/2024	90
8505	IM01A - Fabbricato FSA di Hirpinia (FA01)	06/07/2024	03/10/2024	90
8517	IM02 - Fabbricati FA02: PGEP IMBOCCO E GROTTAMINARDA	12/11/2024	10/01/2025	60
8518	IM02A - Fabbricati FA02: PGEP IMBOCCO E GROTTAMINARDA	12/11/2024	10/01/2025	60
8532	IM03 - Fabbricati FA03: Imbocco W Grottaminarda	28/09/2024	26/11/2024	60
8533	IM03A - Fabbricati FA03: Imbocco W Grottaminarda	28/09/2024	26/11/2024	60
8543	IM04 - Fabbricato tecnologico Finestra N°2 di Melito (FA04)	11/08/2023	09/10/2023	60
8544	IM04A - Fabbricato tecnologico Finestra N°2 di Melito (FA04)	11/08/2023	09/10/2023	60
8554	IM05 - Fabbricati FA05: PGEP Imbocco W Melito	12/06/2024	10/08/2024	60
8555	IM05A - Fabbricati FA05: PGEP Imbocco W Melito	12/06/2024	10/08/2024	60
8569	IM06 - Fabbricato tecnologico (FA06)	30/04/2023	28/06/2023	60
8570	IM06A - Fabbricato tecnologico (FA06)	30/04/2023	28/06/2023	60
8580	IM07 - Fabbricato tecnologico FA di Apice (FA07)	26/02/2024	25/04/2024	60
8581	IM07A - Fabbricato tecnologico FA di Apice (FA07)	26/02/2024	25/04/2024	60
8591	IM08 - Fabbricati FA08: PGEP di Rocchetta	16/08/2024	14/10/2024	60
8592	IM08A - Fabbricati FA08: PGEP di Rocchetta	16/08/2024	14/10/2024	60
8606	IM09 - Fabbricato PPT di Paduli (FA09)	14/12/2024	11/02/2025	60
8607	IM09A - Fabbricato PPT di Paduli (FA09)	14/12/2024	11/02/2025	60
8617	IM10 - STAZIONE DI HIRPINIA (FV01)	25/10/2023	22/03/2024	150
8618	IM10A - STAZIONE DI HIRPINIA (FV01)	25/10/2023	22/03/2024	150
8636	IM20 - FABBRICATO DI APICE (FV02)	29/04/2023	25/10/2023	180
8637	IM20A - FABBRICATO DI APICE (FV02)	29/04/2023	25/10/2023	180
8651	IM21 - Uscita/accesso pedonale Finestra F1	25/07/2022	08/08/2022	15
8652	IM21A - Uscita/accesso pedonale Finestra F1	25/07/2022	08/08/2022	15
8664	IM22 - Uscita/accesso pedonale Finestra F2	18/01/2023	01/02/2023	15
8665	IM22A - Uscita/accesso pedonale Finestra F2	18/01/2023	01/02/2023	15
8677	IM23 - Uscita/accesso pedonale Finestra F3	19/11/2024	18/12/2024	30
8678	IM23A - Uscita/accesso pedonale Finestra F3	19/11/2024	18/12/2024	30
8690	IM24 - Uscita/accesso pedonale Finestra F4	23/09/2023	07/10/2023	15
8691	IM24A - Uscita/accesso pedonale Finestra F4	23/09/2023	07/10/2023	15
8703	IM25 - Uscita/accesso pedonale Finestra F5	19/03/2025	17/04/2025	30
8704	IM25A - Uscita/accesso pedonale Finestra F5	19/03/2025	17/04/2025	30
8716	IM26 - Uscita/accesso carrabile Finestra F6	10/09/2025	19/10/2025	40
8717	IM26A - Uscita/accesso carrabile Finestra F6	10/09/2025	19/10/2025	40
8729	IM27 - Uscita/accesso pedonale Finestra F7	10/03/2023	08/04/2023	30
8730	IM27A - Uscita/accesso pedonale Finestra F7	10/03/2023	08/04/2023	30
8744	IMPIANTI ELETTRICI	24/03/2021	19/10/2025	1671
8745	IE01 - IMPIANTI LFM FERMATE, STAZIONI E FABBRICATI TECNOLOGICI	29/04/2023	10/01/2025	623
8746	IE01A - Stazione di Hirpinia e fabbricato tecnologico FA01 (FSA)	06/07/2024	02/11/2024	120
8758	IE01B - Fabbricati Tecnologici FA02 - (PGEP, VASCA e FA) Grottaminarda	12/11/2024	10/01/2025	60
8768	IE01C - Fabbricati Tecnologici FA03 - PPT10 Grottaminarda	28/09/2024	26/11/2024	60
8778	IE01D - Fabbricati Tecnologici FA04 - Melito	11/08/2023	09/10/2023	60
8788	IE01E - Fabbricati Tecnologici FA05 - (PGEP, VASCA E PPT9) Melito	12/06/2024	10/08/2024	60
8798	IE01F - Fabbricati Tecnologici FA06 - Rocchetta	30/04/2023	28/06/2023	60
8808	IE01G - Fabbricati Tecnologici FA07 - Rocchetta	26/02/2024	25/04/2024	60
8818	IE01H - Fabbricati Tecnologici FA08 - (PGEP, VASCA e PPT8) Rocchetta	16/08/2024	14/10/2024	60
8828	IE01I - Fermata di Apice	29/04/2023	25/10/2023	180
8838	IE01L - PPT7 Paduli	26/10/2023	24/12/2023	60
8846	IE02 - IMPIANTI ILLUMINAZIONE VIABILITA'	24/03/2021	15/02/2025	1425

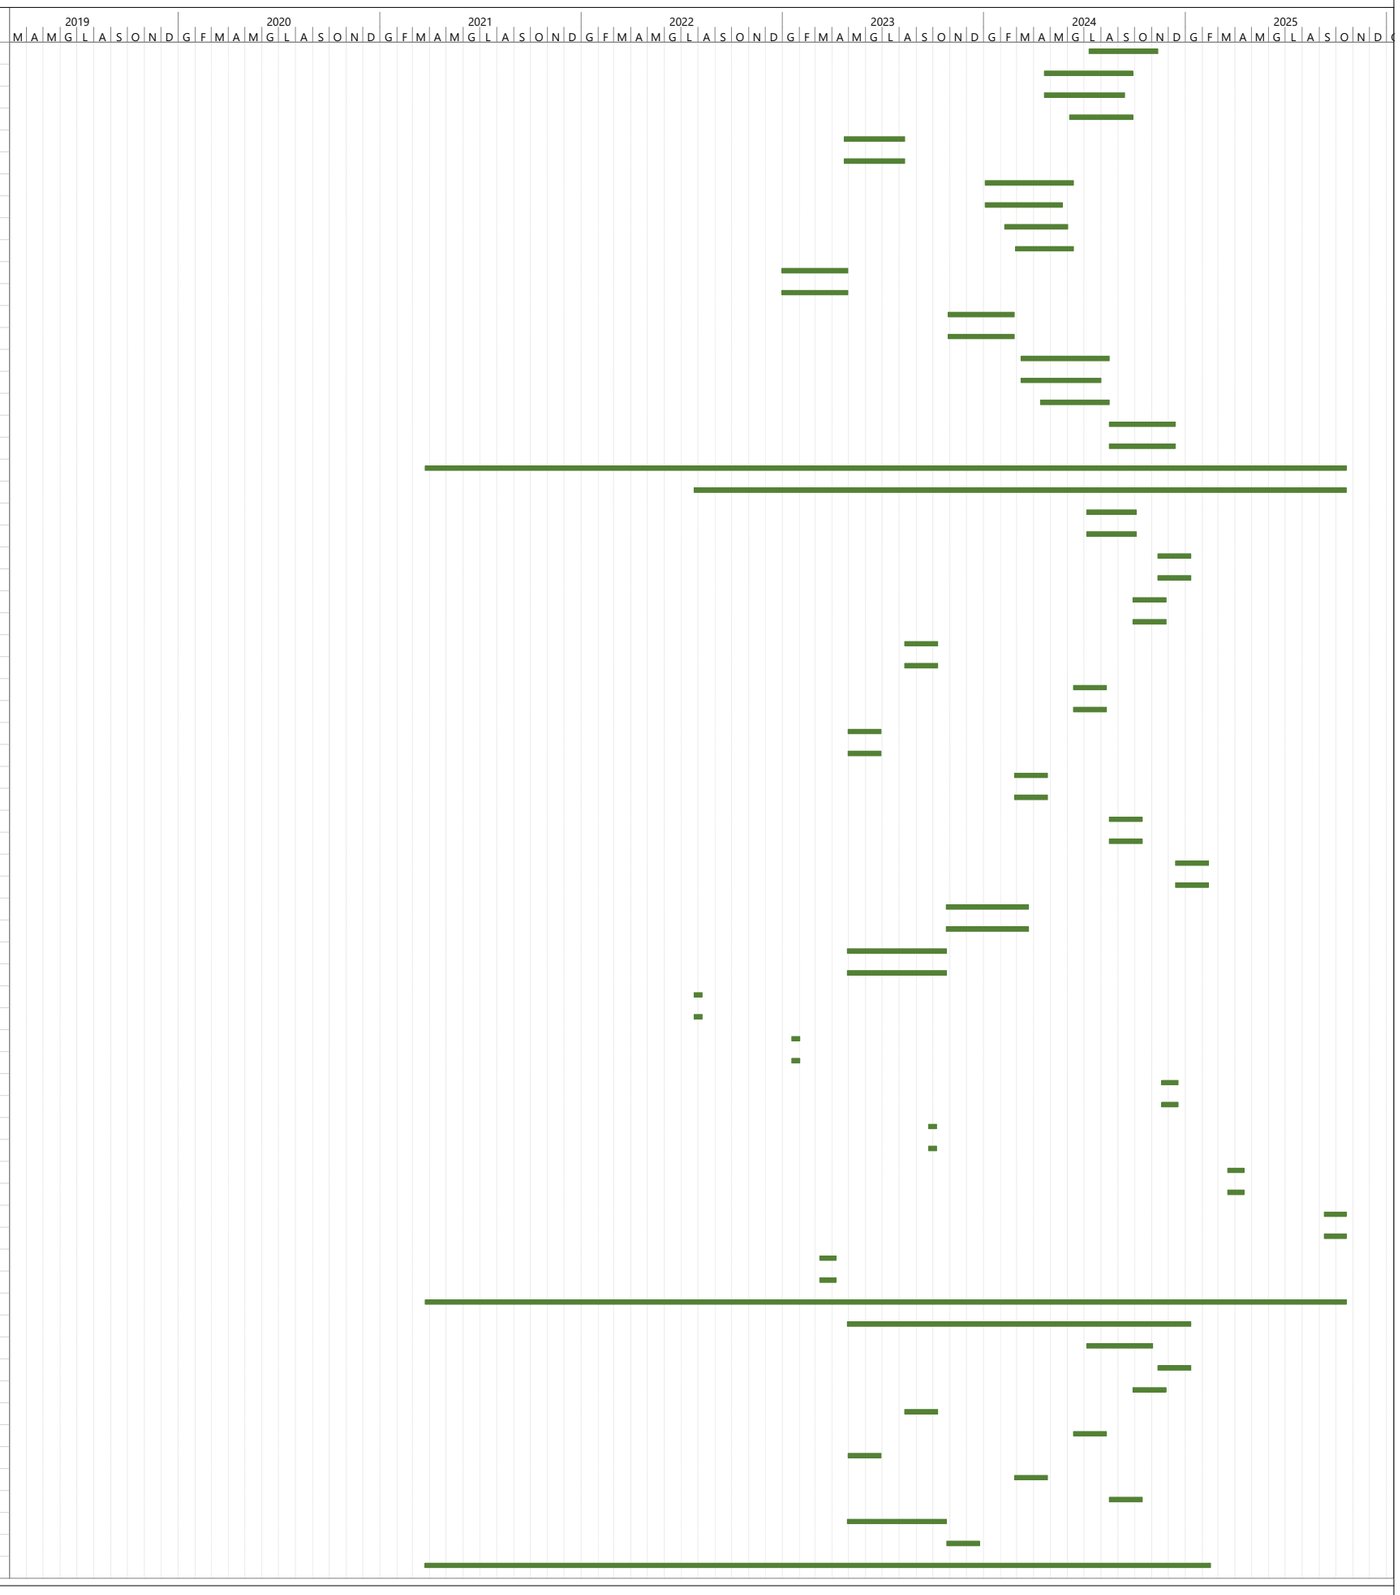

Attività Milestones Riepilogo

Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria dell'itinerario Napoli - Bari
Raddoppio tratta Apice - Orsara, I lotto funzionale Apice – Hirpinia

Programma Operativo dei Lavori Rev. E

ID	Nome attività	Inizio	Fine	Durata gg solari
8847	**IE02A - NV01 - Viabilità accesso Stazione di irpinia**	**07/04/2021**	**26/04/2021**	**20**
8853	**IE02B - NV02 - Viabilità accesso Stazione di Irpinia**	**21/01/2025**	**09/02/2025**	**20**
8859	**IE02C - NV03 - Viabilità accesso Piazzale RI51**	**06/02/2025**	**15/02/2025**	**10**
8865	**IE02D - NV04 - Viabilità accesso Piazzale RI52**	**15/05/2021**	**24/05/2021**	**10**
8871	**IE02E - NV05 - Viabilità accesso Piazzale RI53**	**12/12/2024**	**21/12/2024**	**10**
8877	**IE02F - NV07 - Viabilità accesso Piazzale RI54**	**11/01/2022**	**20/01/2022**	**10**
8883	**IE02G - NV08 - Viabilità accesso Piazzale RI55**	**24/03/2021**	**02/04/2021**	**10**
8889	**IE02H - NV09 - Viabilità accesso Piazzale RI56**	**28/06/2022**	**07/07/2022**	**10**
8895	**IE02I - NV11 - Viabilità accesso Piazzale RI57**	**15/07/2021**	**24/07/2021**	**10**
8901	**IE02L - NV12 - Viabilità accesso Piazzale RI58**	**13/04/2021**	**22/04/2021**	**10**
8907	**IE02N - NV14 - Viabilità accesso Piazzale RI60**	**15/06/2021**	**24/06/2021**	**10**
8913	**IE02O - NV15 - Viabilità accesso Piazzale RI61**	**01/11/2024**	**10/11/2024**	**10**
8919	**IE02P - NV16 - Viabilità fermata di Apice**	**04/01/2024**	**18/01/2024**	**15**
8925	**IE03 - IMPIANTI LFM GALLERIE, IMBOCCHI E FINESTRE**	**25/07/2022**	**19/10/2025**	**1183**
8926	**IE03A - Impianti elettrici Galleria Rocchetta**	**24/08/2023**	**21/12/2023**	**120**
8934	**IE03B - Impianti elettrici Finestra 1 Rocchetta**	**19/03/2025**	**17/04/2025**	**30**
8942	**IE03C - Impianti elettrici Finestra 2 Rocchetta**	**10/09/2025**	**19/10/2025**	**40**
8948	**IE03D - Impianti elettrici Finestra 3 Rocchetta**	**10/03/2023**	**08/04/2023**	**30**
8956	**IE03E - Impianti elettrici Galleria Melito**	**04/01/2024**	**02/05/2024**	**120**
8962	**IE03F - Impianti elettrici Finestra 1 Melito**	**18/01/2023**	**01/02/2023**	**15**
8970	**IE03G - Impianti elettrici Finestra 2 Melito**	**19/11/2024**	**18/12/2024**	**30**
8976	**IE03H - Impianti elettrici Finestra 3 Melito**	**23/09/2023**	**07/10/2023**	**15**
8984	**IE03I - Impianti elettrici Galleria Grottaminarda**	**22/12/2023**	**19/04/2024**	**120**
8990	**IE03L - Impianti elettrici Finestra 1 Grottaminarda**	**25/07/2022**	**08/08/2022**	**15**

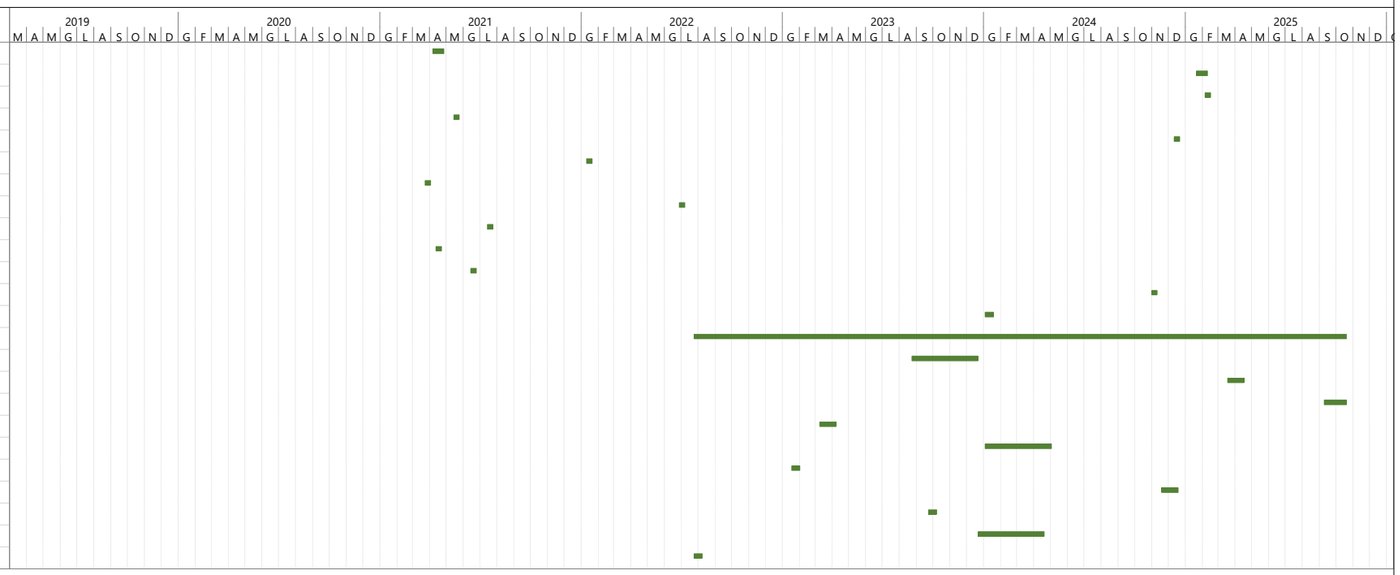

Attività Milestones Riepilogo
