| CANTIERE OPERATIVO C.O. 1.2 – WBS CA16 | PROGRESSIVA | PK 6+025 |
|---|---|---|
| TRATTO DI LINEA 1 (0+000 – 10+021) | SUPERFICIE | 16.914,00 mq |

| INDIVIDUAZIONE AREE | |
|---|---|
| 1 | Guardiania |
| 2 | Pozzo |
| 3 | Impianto trattamento acque |
| 4 | Serbatoio di accumulo+Gruppo Pompe |
| 5 | Impianto per jet grouting |
| 6 | Area stoccaggio reflui jet grouting |
| 7 | Ribaltina |
| 8 | Lavaruote |
| 9 | Pesa a ponte |
| 10 | Spogliatoi e docce |
| 11 | Scala |
| 12 | Locali igienici |
| 13 | Uffici |
| 15 | Area gruppi energia elettrica |
| 16 | Punto consegna Cabina ENEL |
| 17 | Impianto per diaframmi con bentonite |
| 18 | Vasca di raccolta acque |
| 19 | Gru |
| 20 | Gruppo Ventilazione |
| 21 | Area Stoccaggio Materiali |

## KEY PLAN




## LEGENDA

- Duna
- Torri faro
- Entrata/Uscita Mezzi di Cantiere
- Entrata/Uscita Personale
- Quota Progetto / Quota Terreno
- Recinzione di cantiere
- Barriera mobile H=2.50m L=458m
- Linea elettrica AT esistente
- Rete Gas esistente
- Condotte idriche esistenti
- Tracciato di progetto ed opere connesse
- Pista accesso cantiere
- viabilità locale esistente
- Nuova pista di cantiere lungolinea
- Nuova temporanea pista di cantiere lungolinea
- Utilizzo viabilità esistente pubblica
- Area con pavimentazione in cls
- Area in misto stabilizzato
- Area con pavimentazione bituminosa

AREA IN MISTO STABILIZZATO

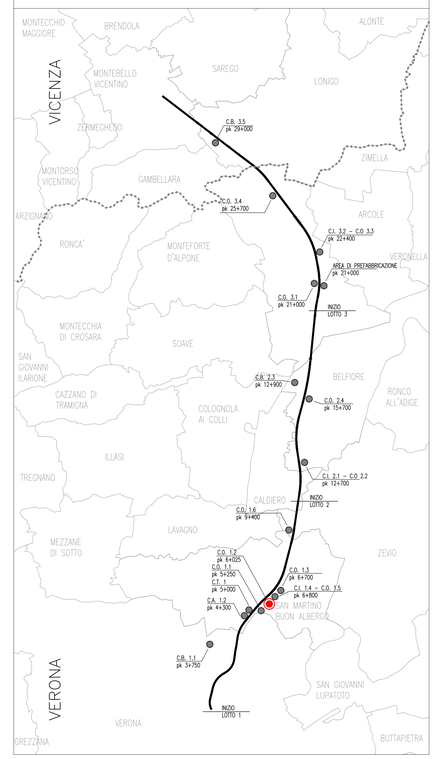


AREA CON PAVIMENTAZIONE IN CLS




AREA CON PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA




COMMITTENTE: RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA – GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR – GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

GENERAL CONTRACTOR: Consorzio Iricav Due

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

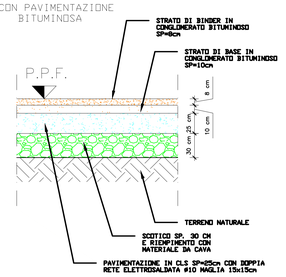LINEA A.V. /A.C. TORINO–VENEZIA Tratta VERONA–PADOVA
Lotto funzionale Verona–Bivio Vicenza

PROGETTO ESECUTIVO

DISEGNO

CANTIERIZZAZIONE

CANTIERE OPERATIVO CO 1.2 S.MARTINO GA01 – TRATTO IN SPINGITUBO

Planimetria generale di Progetto

| GENERAL CONTRACTOR | DIRETTORE LAVORI | SCALA |
|---|---|---|
| IMPRESA INTEGRATORE MALAVENDA Ordine degli Ingegneri di Ravenna n. 3789 Data 08/03/21 | Consorzio Iricav Due Ing. Guido FRATINI | Valido per costruzione Ing. Luca ZACCARIA Iscritto all'ordine degli Ingegneri di Ravenna n. A1206 Data 08/03/21 | 1:500 |

| COMMESSA | LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC. | OPERA/DISCIPLINA | PROGR. | REV. | FOGLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN17 | 10 | E | I2 | P7 | CA1600 | 002 | A | 001 di 001 |

Consorzio Iricav Due — VISTO CONSORZIO IRICAV DUE — Data 04/03/21

Progettazione :

| Rev. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | IL PROGETTISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | EMISSIONE | MAVA VELEZ | 03/03/21 | MANNETI | 03/03/21 | ZANINI | 03/03/21 | |
| B | | | | | | | | |
| C | | | | | | | | |

OG. 8377957C01 — CUP: J41E91000000009 — File: IN17I0E12P7CA1600002A.DWG — Cod. origine: 03AKE

Progetto cofinanziato dalla Unione Europea

Scala di plot: — TUTTI I DIRITTI DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATI. LA PRODUZIONE ANCHE PARZIALE È VIETATA
