CRONOPROGRAMMA DI DETTAGLIO

Contratto Istituzionale di Sviluppo per il recupero e la rifunzionalizzazione dell'"Ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano – Ventotene"

ID	Mo att	Nome attività	Durata	Inizio	Fine
1		**CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX CARCERE BORBONICO DELL'ISOLA DI SANTO STEFANO, VENTOTENE**	**1452 g**	**gio 04/06/20**	**sab 27/12/25**
2		**Intervento n. 1 - Messa in sicurezza degli ed**	**929 g**	**gio 04/06/20**	**mer 27/12/23**
3		**Progettazione, Pareri, Verifica e Validazio**	**207 g**	**gio 04/06/20**	**dom 21/03/21**
4		Sopralluoghi, rilevazioni topografiche a terra, predisposizione atti condivisione con Soggetti Istituzionali affidamento	90 gt	gio 04/06/20	mer 02/09/20
5		Indagini e rilevazioni (ambientali, archeologiche, geologiche, geotecniche, geofisiche a mare e a	45 gt	mer 02/09/20	sab 17/10/20
6		Progetto definitivo	60 gt	mer 02/09/20	dom 01/11/20
7		Conferenza di Servizi e procedura di Vinca Regionale	30 gt	dom 01/11/20	mar 01/12/20
8		Progetto Definitivo per appalto integrat	45 gt	mar 01/12/20	ven 15/01/21
9		Verifica e Validazione del RUP del Progetto definitivo per Appalto Integrato, condivisione atti di gra	35 gt	ven 15/01/21	ven 19/02/21
10		Protocollo di vigilanza collaborativa ANAC	30 gt	ven 19/02/21	dom 21/03/21
11		**Procedura di affidamento lavori**	**115 g**	**dom 21/03/21**	**sab 28/08/21**
12		Procedura di gara per l'affidamento della Progettazione esecutiva, di Servizi	150 gt	dom 21/03/21	mer 18/08/21
13		Sottoscrizione contratto e Comunicazione di avvio del contratto	10 gt	mer 18/08/21	sab 28/08/21
14		**Esecuzione del Contratto Progettazione esecutiva, Servizi e Lavori**	**62 g**	**sab 28/08/21**	**mer 24/11/21**
15		**Esecuzione della Progettazione esecuti**	**42 g**	**sab 28/08/21**	**mer 27/10/21**
16		**Fase 1: redazione Progetto Esecutivo**	**43 gt**	sab 28/08/21	dom 10/10/21
17		Ottenimento ulteriori pareri sul Progetto Esecutiva	10 gt	dom 10/10/21	mer 20/10/21
18		**Fase 2: adeguamento alle eventuali indicazioni**	**7 gt**	mer 20/10/21	mer 27/10/21
19		**Verifica e validazione della Progettazione Esecutiva**	**20 g**	**mer 27/10/21**	**mer 24/11/21**
20		Verbale di verifica intermedio (Nucleo di Verifica)	10 gt	mer 27/10/21	sab 06/11/21
21		**Integrazioni Progettisti Esecutivo**	**7 gt**	sab 06/11/21	sab 13/11/21
22		Verifica Finale (consegna verbale Nucleo di verifica)	5 gt	sab 13/11/21	gio 18/11/21
23		**Integrazioni dei Progettisti Esecutivo post verifica finale**	**5 gt**	gio 18/11/21	mar 23/11/21
24		Atto di Validazione RUP	1 gt	mar 23/11/21	mer 24/11/21
25		**Esecuzione Lavori**	**503 g**	**mer 24/11/21**	**sab 28/10/23**
26		**Esecuzione dei servizi e dei lavori**	**703 gt**	mer 24/11/21	sab 28/10/23
27		**Collaudo tecnico amministrativo**	**545 g**	**mer 24/11/21**	**mer 27/12/23**
28		Collaudo tecnico amministrativo	763 gt	mer 24/11/21	mer 27/12/23
29		**Intervento n. 2 - Redazione dello "Studio di Fattibilità"**	**154 g**	**lun 07/09/20**	**gio 08/04/21**
30		Predisposizione Studio, interlocuzioni con la struttura Commissariale, Amministrazioni coinvolte, Esperti, altri	180 gt	lun 07/09/20	sab 06/03/21
31		Condivisione, integrazioni e modifiche, e Approvazione da parte del TIP	33 gt	sab 06/03/21	gio 08/04/21
32		**Concorso di Progettazione - Interventi n. 5 (corpi A e B) - n. 4 - n. 6 - n. 7 - n. 8 - n. 9 - n. 10 - n. 11 - n. 12**	**161 g**	**gio 08/04/21**	**ven 19/11/21**
33		Predisposizione DPI e atti per il concorso di progettazione art. 154 DLgs 50/16	40 gt	gio 08/04/21	mar 18/05/21
34		Approvazione del DPI da parte del TIP	10 gt	mar 18/05/21	ven 28/05/21
35		Procedura per il Concorso di Progettazione	145 gt	ven 28/05/21	mer 20/10/21
36		Proclamazione Concorso ed eventuale sottoscrizione del contratto per l'esecuzione della Progettazione Definitiva e Progettazione Esecutiva	30 gt	mer 20/10/21	ven 19/11/21
37		**Intervento n. 3 - Realizzazione/adeguamento degli approdi all'Isola di Santo Stefano**	**884 g**	**gio 04/06/20**	**mer 25/10/23**
38		**Progettazione, Pareri, Verifica e Validazio**	**362 g**	**gio 04/06/20**	**dom 24/10/21**
39		Sopralluoghi, rilevazioni topografiche a terra, predisposizione atti condivisione con Soggetti Istituzionali affidamento	90 gt	gio 04/06/20	mer 02/09/20
40		Indagini e rilevazioni (ambientali, archeologiche, geologiche, geotecniche, geofisiche a mare e a	90 gt	mer 02/09/20	mar 01/12/20
41		Autorizzazione, Affidamento ed esecuzione di Ulteriori indagini archeologiche a mare richieste dalla	95 gt	mar 01/12/20	sab 06/03/21
42		Progetto definitivo, compreso interlocuzione con Amministrazioni	135 gt	mar 10/11/20	gio 25/03/21
43		Conferenza di Servizi e procedura di Via e Vinca Nazionale	180 gt	gio 25/03/21	mar 21/09/21
44		Redazione Progetto Definitivo per Appalto Integrato	30 gt	mer 08/09/21	ven 08/10/21
45		Verifica e Validazione del RUP del Progetto definitivo per Appalto	30 gt	ven 24/09/21	dom 24/10/21
46		**Procedura di affidamento lavori**	**136 g**	**lun 20/09/21**	**mar 29/03/22**
47		Predisposizione atti di gara	30 gt	lun 20/09/21	mer 20/10/21
48		Approvazione degli atti di gara da parte di ANAC	20 gt	mer 20/10/21	mar 09/11/21
49		Procedura di gara per l'affidamento della Progettazione esecutiva, di Servizi	130 gt	mar 09/11/21	sab 19/03/22
50		Sottoscrizione contratto e Comunicazione di avvio del contratto	10 gt	sab 19/03/22	mar 29/03/22
51		**Esecuzione del Contratto Progettazione esecutiva e verifica**	**61 g**	**mar 29/03/22**	**mer 22/06/22**
52		**Esecuzione della Progettazione esecutiva**	**41 g**	**mar 29/03/22**	**mer 25/05/22**
53		**Fase 1: redazione Progetto Esecutivo**	**40 gt**	mar 29/03/22	dom 08/05/22
54		Ottenimento ulteriori pareri sul Progetto Esecutivo	10 gt	dom 08/05/22	mer 18/05/22
55		**Fase 2: adeguamento alle eventuali indicazioni**	**7 gt**	mer 18/05/22	mer 25/05/22
56		**Verifica e validazione della Progettazione Esecutiva**	**20 g**	**mer 25/05/22**	**mer 22/06/22**
57		Verbale di verifica intermedio (Nucleo di Verifica)	10 gt	mer 25/05/22	sab 04/06/22
58		**Integrazioni Progettisti Esecutivo**	**7 gt**	sab 04/06/22	sab 11/06/22
59		Verifica Finale (consegna verbale Nucleo di verifica)	5 gt	sab 11/06/22	gio 16/06/22
60		**Integrazioni dei Progettisti Esecutivo post verifica finale**	**5 gt**	gio 16/06/22	mar 21/06/22
61		Atto di Validazione RUP	1 gt	mar 21/06/22	mer 22/06/22
62		**Esecuzione dei lavori e monitoraggi**	**294 g**	**mer 22/06/22**	**mar 08/08/23**
63		**Interventi sulla Falesia, mitigazione del rischio**	60 gt	mer 22/06/22	dom 21/08/22
64		**Interventi di monitoraggio geotecnico della Falesia**	365 gt	lun 08/08/22	mar 08/08/23
65		Decreto dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale riperimetrazione della classe di	60 gt	dom 21/08/22	gio 20/10/22
66		**Intervento per la realizzazione dell'app**	100 gt	gio 20/10/22	sab 28/01/23
67		**Collaudo tecnico amministrativo**	**350 g**	**mer 22/06/22**	**mer 25/10/23**
68		Collaudo tecnico amministrativo	490 gt	mer 22/06/22	mer 25/10/23
69		**Interventi n. 5 (corpi A e B) - n. 4 - n. 6 - n. 7 - n. 8 - n. 9 - n. 10 - n. 11 - n. 12**	**1070 g**	**ven 19/11/21**	**sab 27/12/25**
70		**Progettazione, Pareri, Verifica e Validazio**	**186 g**	**ven 19/11/21**	**mar 09/08/22**
71		Progetto definitivo derivante dal Concorso di Progettazione	110 gt	ven 19/11/21	mer 09/03/22
72		Conferenza di Servizi e procedura di Vin	60 gt	mer 09/03/22	dom 08/05/22
73		Redazione Progetto Esecutivo	80 gt	lun 28/03/22	gio 16/06/22
74		**Verifica e validazione della Progettazione Esecutiva**	**48 g**	**gio 02/06/22**	**mar 09/08/22**
75		Verbale di verifica intermedio (Nucleo di Verifica)	30 gt	gio 02/06/22	sab 02/07/22
76		**Integrazioni Progettisti Esecutivo**	**15 gt**	sab 02/07/22	dom 17/07/22
77		Verifica Finale (consegna verbale Nucleo di verifica)	12 gt	dom 17/07/22	ven 29/07/22
78		**Integrazioni dei Progettisti Esecutivo post verifica finale**	**10 gt**	ven 29/07/22	lun 08/08/22
79		Atto di Validazione RUP	1 gt	lun 08/08/22	mar 09/08/22
80		**Procedura di affidamento lavori**	**125 g**	**mar 05/07/22**	**mar 27/12/22**
81		Predisposizione atti di gara	33 gt	mar 05/07/22	dom 07/08/22
82		Procedura di gara per l'affidamento dei Lavori	130 gt	lun 08/08/22	ven 16/12/22
83		Sottoscrizione contratto e Comunicazione di avvio del contratto	11 gt	ven 16/12/22	mar 27/12/22
84		**Esecuzione Lavori**	**736 g**	**lun 02/01/23**	**mar 28/10/25**
85		**Esecuzione dei servizi e dei lavori**	**1030 g**	lun 02/01/23	mar 28/10/25
86		**Collaudo tecnico amministrativo**	**780 g**	**lun 02/01/23**	**sab 27/12/25**
87		Collaudo tecnico amministrativo	1090 gt	lun 02/01/23	sab 27/12/25
88		**Intervento n. 13 - Realizzazione di interventi di messa in sicurezza delle falesie sul perimetro dell'Isola in corrispondenza della viabilità e degli approdi**	**537 g**	**gio 15/07/21**	**sab 05/08/23**
89		**Progettazione, Pareri, Verifica e Validazio**	**192 g**	**gio 15/07/21**	**sab 09/04/22**
90		Rilievi ed Indagini	50 gt	gio 15/07/21	ven 03/09/21
91		Progetto definitivo	70 gt	ven 03/09/21	ven 12/11/21
92		Conferenza di Servizi e procedura di Vin	60 gt	ven 12/11/21	mar 11/01/22
93		Progetto Esecutivo	60 gt	mar 11/01/22	sab 12/03/22
94		**Verifica e validazione della Progettazione Esecutiva**	**20 g**	**sab 12/03/22**	**sab 09/04/22**
95		Verbale di verifica intermedio (Nucleo di Verifica)	10 gt	sab 12/03/22	mar 22/03/22
96		**Integrazioni Progettisti Esecutivo**	**7 gt**	mar 22/03/22	mar 29/03/22
97		Verifica Finale (consegna verbale Nucleo di verifica)	5 gt	mar 29/03/22	dom 03/04/22
98		**Integrazioni dei Progettisti Esecutivo post verifica finale**	**5 gt**	dom 03/04/22	ven 08/04/22
99		Atto di Validazione RUP	1 gt	ven 08/04/22	sab 09/04/22
100		**Procedura di affidamento lavori**	**155 g**	**lun 07/03/22**	**dom 09/10/22**
101		Predisposizione atti di gara	25 gt	lun 07/03/22	ven 01/04/22
102		Procedura di gara per l'affidamento dei Lavori	130 g	ven 01/04/22	gio 29/09/22
103		Sottoscrizione contratto e Comunicazione di avvio del contratto	10 gt	gio 29/09/22	dom 09/10/22
104		**Esecuzione Lavori**	**172 g**	**dom 09/10/22**	**mar 06/06/23**
105		**Esecuzione dei servizi e dei lavori**	**240 gt**	dom 09/10/22	mar 06/06/23
106		**Collaudo tecnico amministrativo**	**215 g**	**dom 09/10/22**	**sab 05/08/23**
107		Collaudo tecnico amministrativo	300 gt	dom 09/10/22	sab 05/08/23
108		**Intervento n. 14. - Realizzazione di una infrastruttura di telecomunicazioni fonia-dati a banda ultralarga.**	**643 g**	**sab 01/05/21**	**mer 18/10/23**
109		**Progettazione, approvazione ed esecuzione attività: competenza e secondo pianificazione INFRATEL**	900 gt	sab 01/05/21	mer 18/10/23

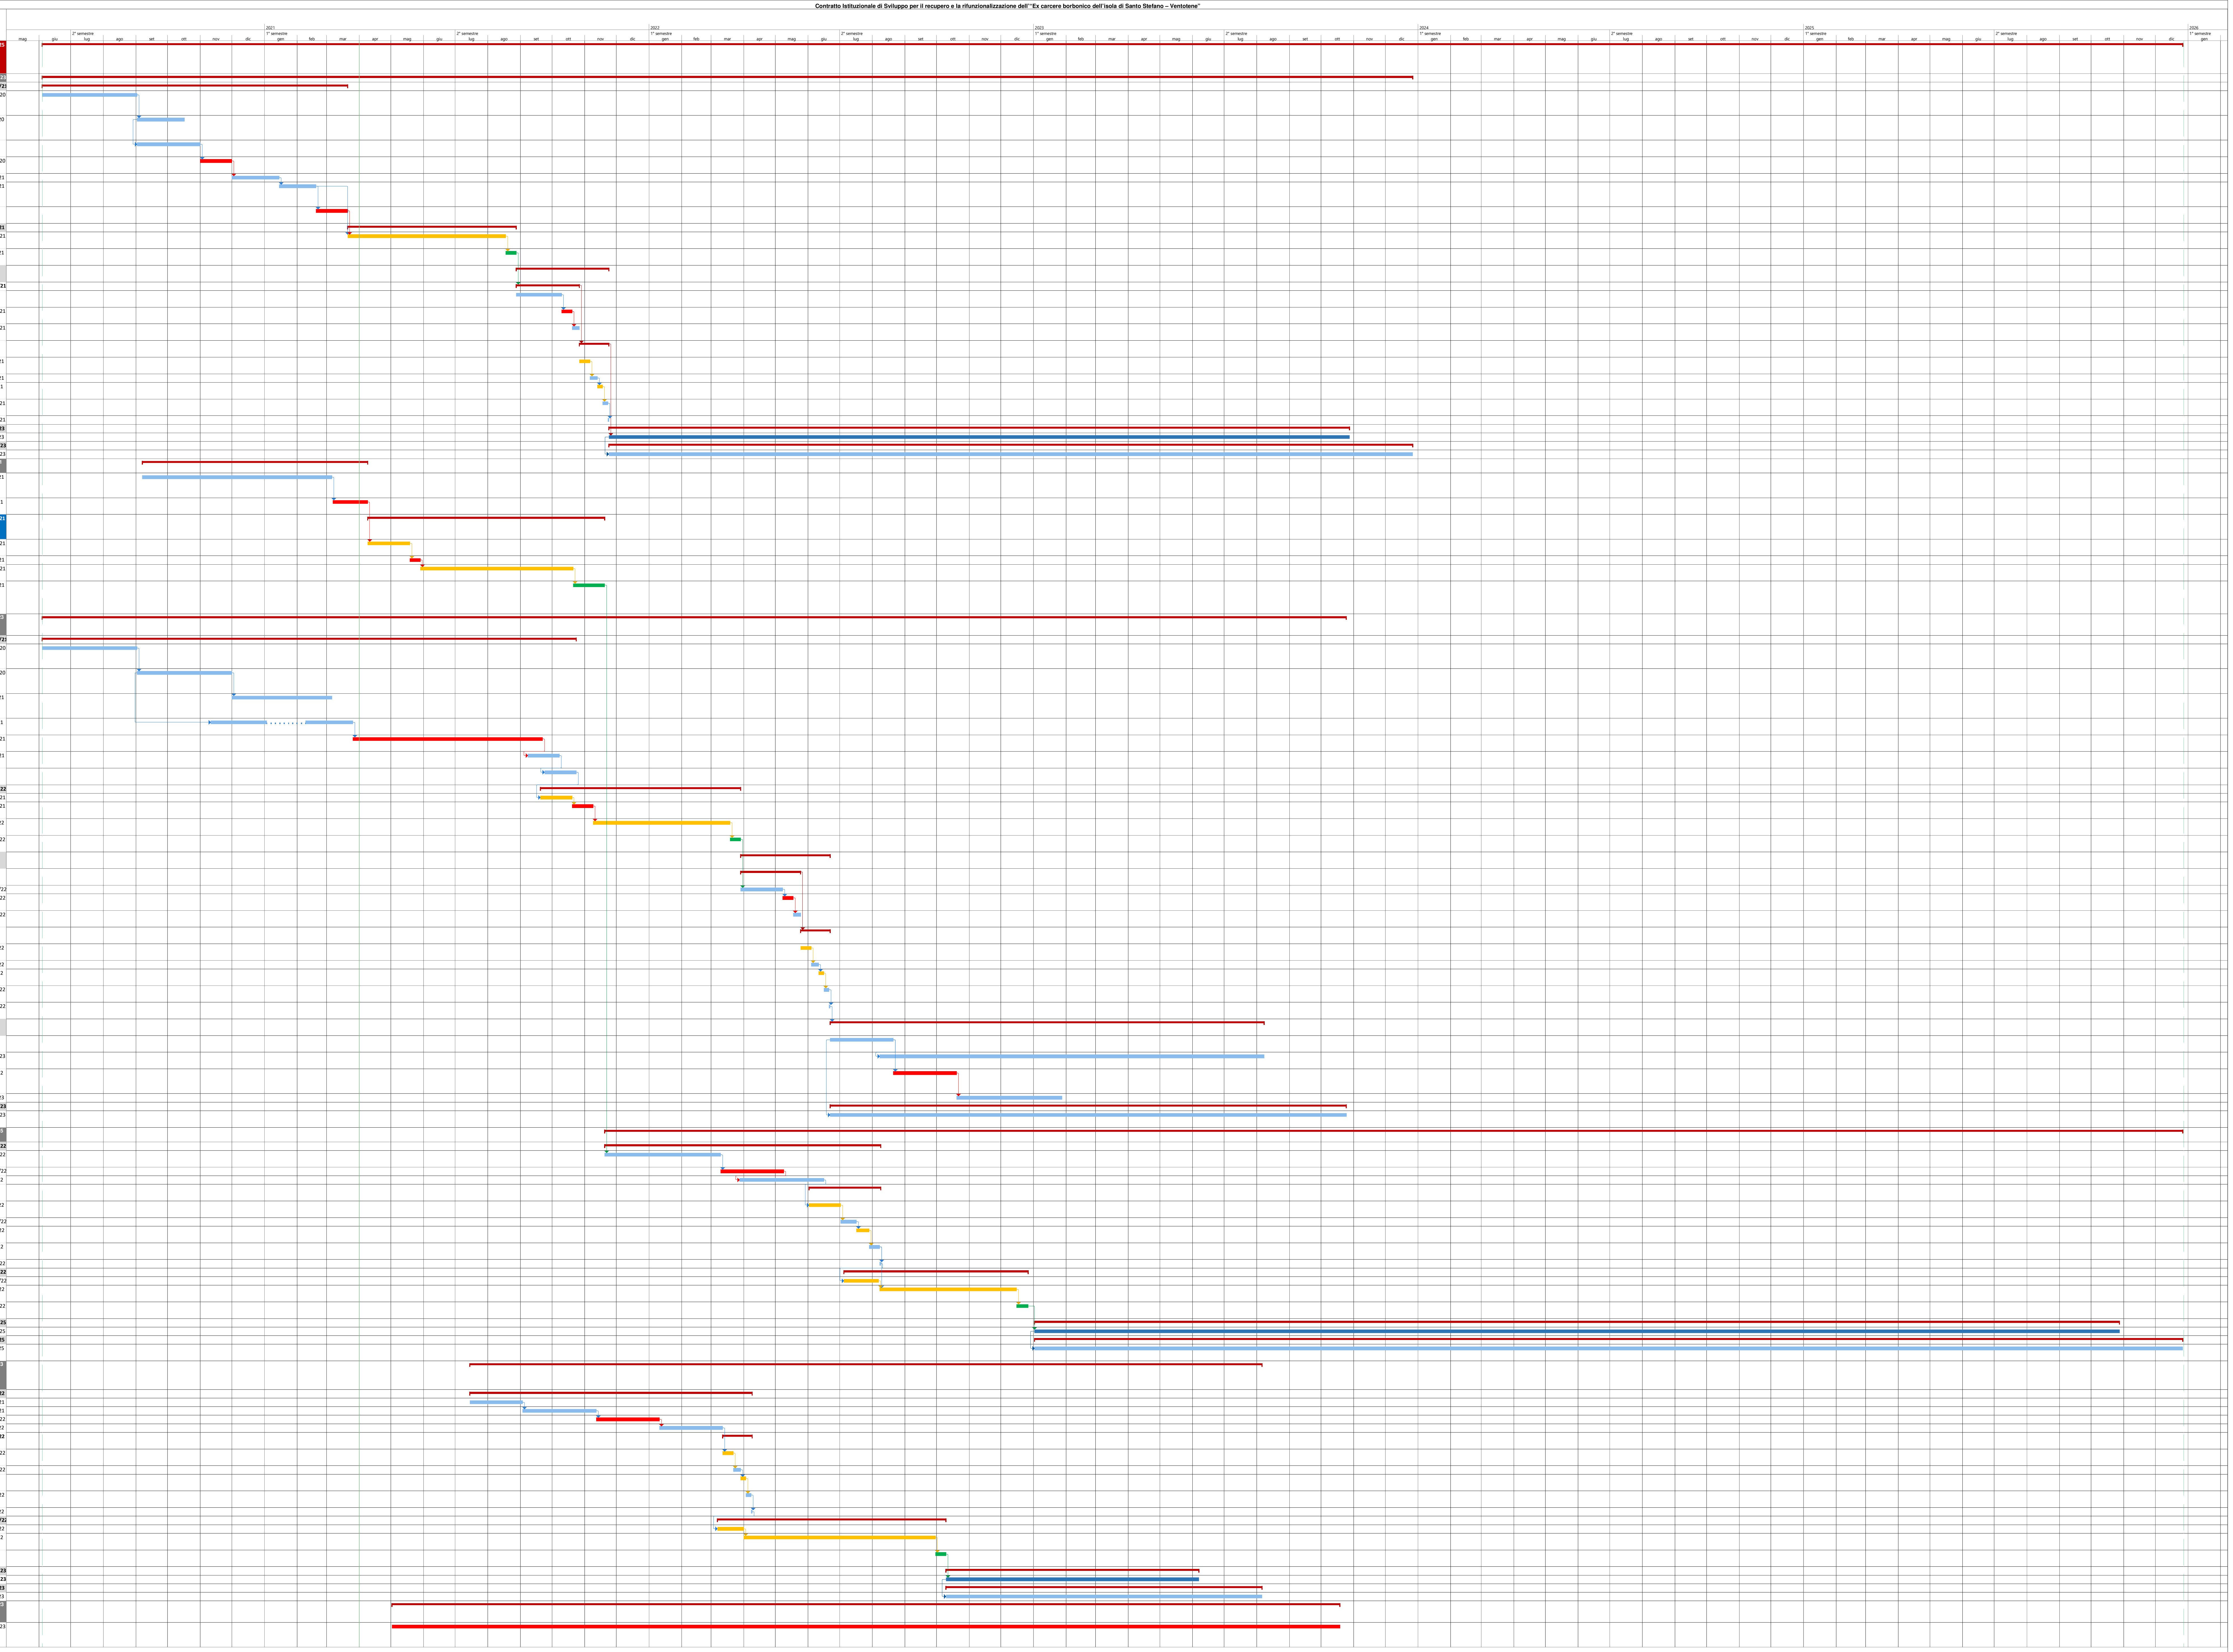

Progetto: 2017E037INV-00-S-T | Attività | Divisione | Cardine | Riepilogo | Riepilogo progetto | Attività inattiva | Cardine inattiva | Riepilogo inattiva | Attività manuale | Solo-durata | Riporto riepilogo manuale | Riepilogo manuale | Solo inizio | Solo-fine | Attività esterne | Cardine esterno | Scadenza | Avanzamento | Avanzamento manuale
