Cantiere serbatoio di progetto

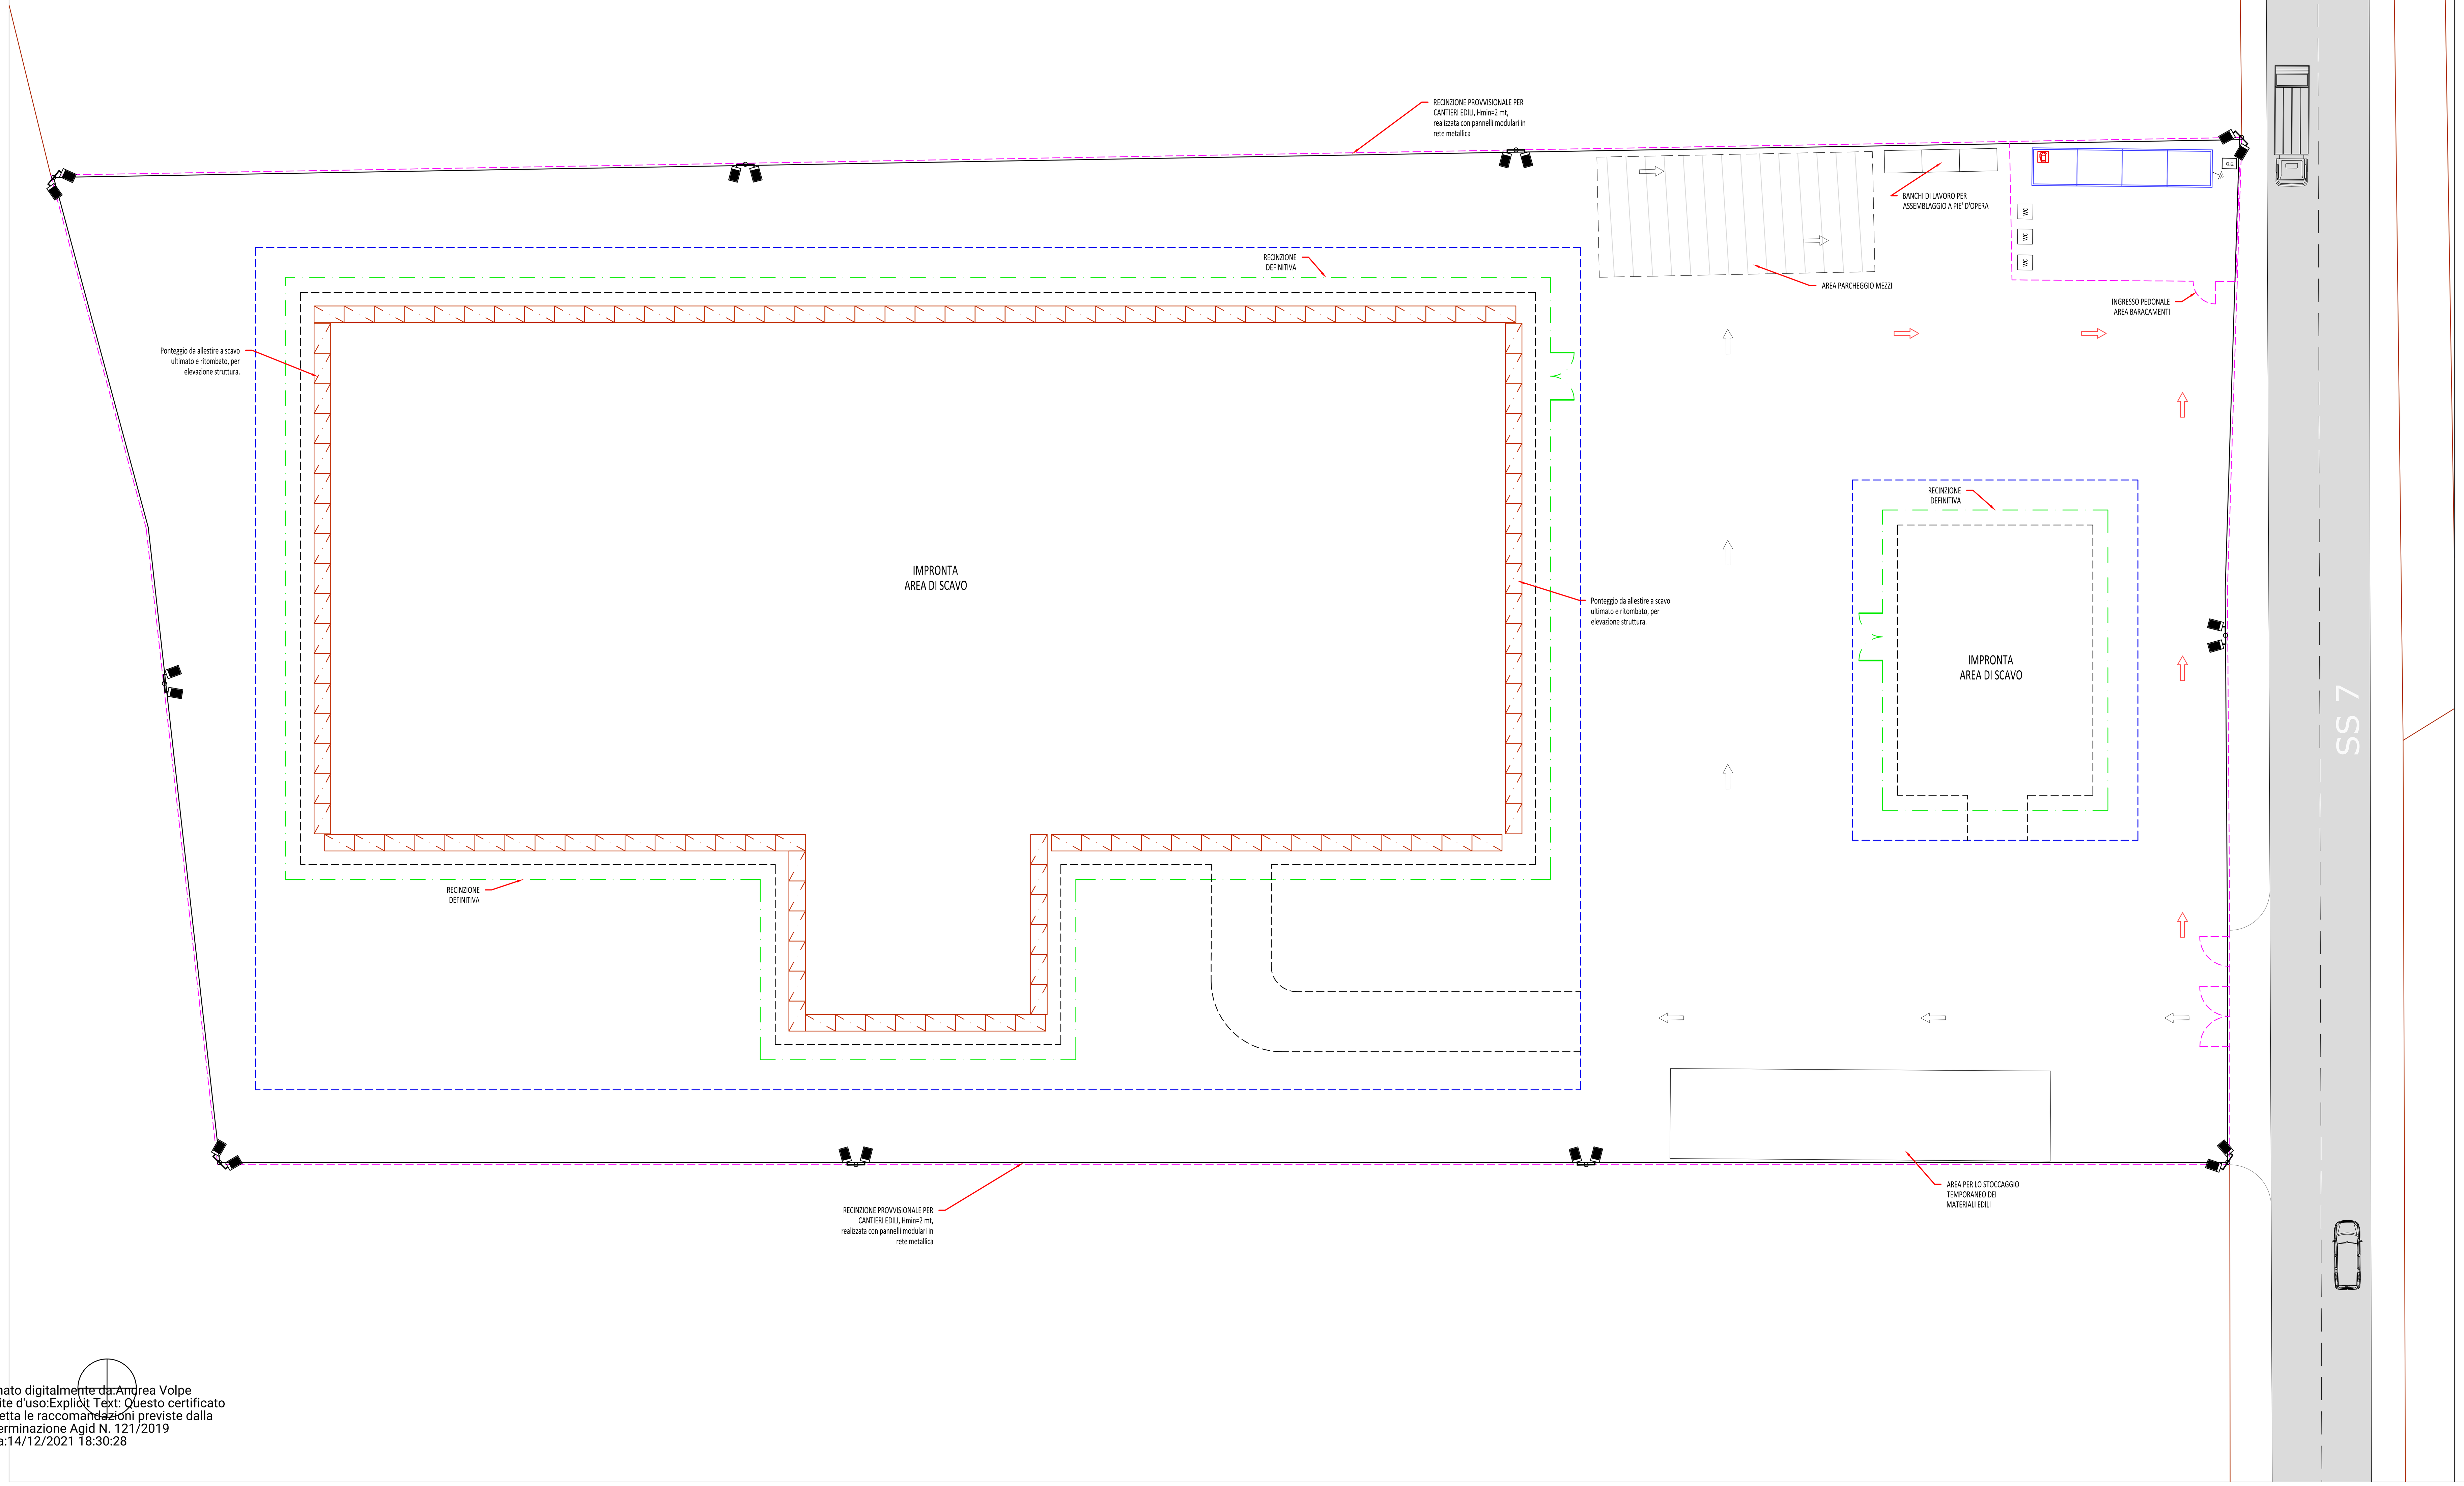

Tipo cantiere stradale temporaneo e mobile

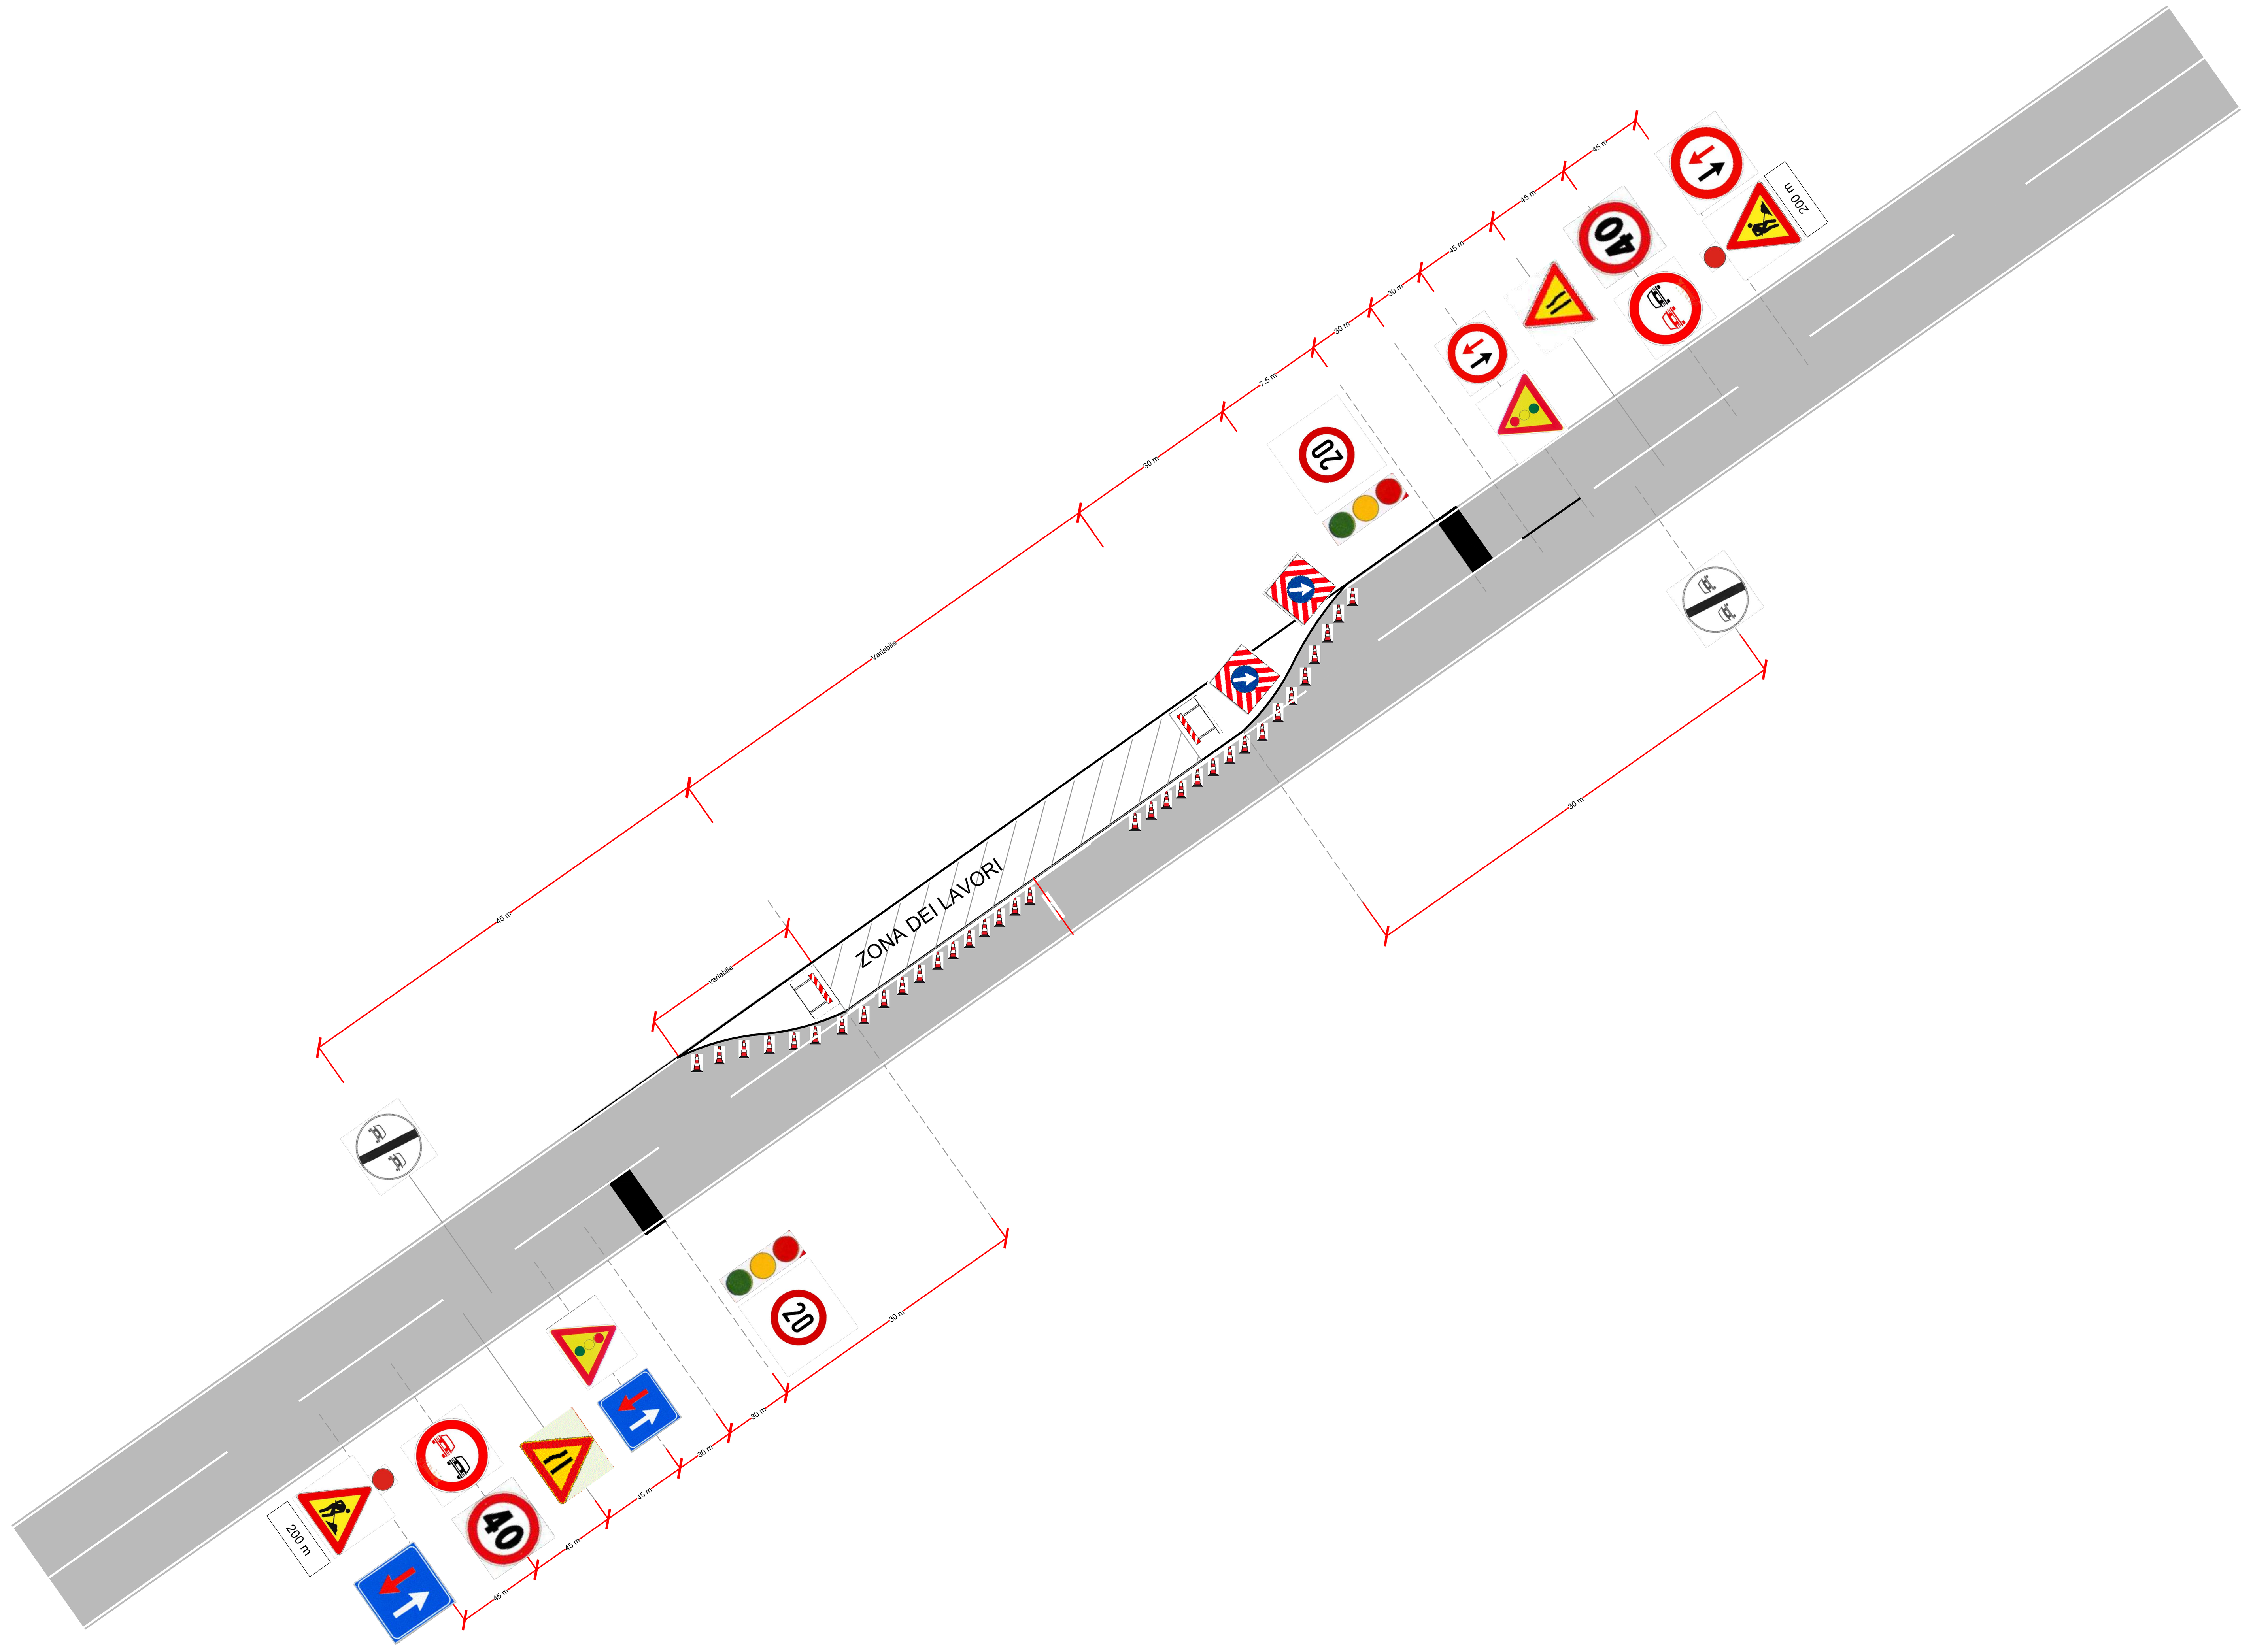

DELIMITAZIONE AREA NON ACCESSIBILE IN FASE DI SCAVO

NON SOSTARE NEL RAGGIO DI AZIONE DELLE MACCHINE PER MOVIMENTI TERRA

SEGNALETICA MINIMA IN FASE DI MANOVRA E UTILIZZO DI MEZZI

SEGNALETICA MINIMA IN FASE DI SCAVO APERTO E LAVORAZIONI IN CORSO ALL'INTERNO

INDICAZIONE GRAFICA DEI PERCORSI DISTINTI E NON INTERFERENTI TRA UOMINI E MEZZI

PERCORSO PEDONALE

PERCORSO MEZZI

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE
polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologato secondo la normativa vigente (D.M. 7/01/05 e s.m.i. - UNI EN 3-7)

n.4 MODULI PREFABBRICATI POLIFUNZIONALI
dim 3x2.50x2.50 (mt)

SEGNALETICA MINIMA **DA DISPORRE NELLE IMMEDIATE VICINANZE DEL CANCELLO DI INGRESSO AL CANTIERE**

VIETATO L'ACCESSO AI NON ADDETTI AI LAVORI
La ditta non risponde di eventuali danni a persone o cose

É OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI PROTEZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO

IN PROSSIMITA' DEGLI INGRESSI ALLE AREE DI CANTIERE COLLOCARE IL CARTELLO IDENTIFICATIVO DELL'APPALTO CON L'INDICAZIONE DI NOMINATIVI E CONTATTI DEI PROFESSIONISTI COINVOLTI

Area di stazionamento di eventuali mezzi
(betonpompe, escavatore, carotatrice...)

MODULO PONTEGGIO METALLICO
da montare in situ secondo le istruzioni riportate nell'ALL.1 al PSC

PRONTO SOCCORSO
Kit in conformità al D.M. 388 ALL. 1, indicato per luoghi di lavoro con tre e più lavoratori.
DOVRA' ESSERE IDONEAMENTE RIPOSTO NEI BARACCAMENTI ALL'INTERNO DEL CANTIERE.

IMPIANTO DI MESSA A TERRA

Autorità idrica pugliese — REGIONE PUGLIA — acquedotto pugliese l'acqua, bene comune

Acquedotto Pugliese S.p.A. - 70121 Bari Via Cognetti, 36 - www.aqp.it - Telefono +39.080.5723111 C.F. e P.IVA 00347000721 REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092

CUP: E87B15000620005

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 2016 - 2019
A CARICO DEI PROVENTI TARIFFARI GIUSTA DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AIP N. 31 DEL 28/06/2018

REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA NELL'ABITATO DI CASTELLANETA E POTENZIAMENTO DEL SERBATOIO - PROGETTO DEFINITIVO-

Il Responsabile del Procedimento
ing. Gaetano jr BARBONE

PROGETTAZIONE

Il Coordinatore del progetto,
Progettista parti idrauliche e opere elettriche/elettromeccaniche e
Coordinatore della Sicurezza in fase progettuale
ing. Michele Alessandro SALIOLA

Il Progettista delle strutture
ing. Tommaso DI LERNIA

Il Geologo e Progettista ambientale
dott. Alfredo DE GIOVANNI

Collaboratori
ing. Antonio DISCIPIO
geom. Ruggiero LANOTTE
ing. Francesco Pellegrino PAPEO
Ing. Francesco RUCCIA
ing. Francesco SARCINA
geom. Pietro SIMONE

Il Responsabile Ingegneria di Progettazione
ing. Massimo PELLEGRINI

acquedotto pugliese — Direzione Ingegneria
Il Direttore
ing. Andrea VOLPE

Elaborato	
S1.4.2	**Layouts di cantiere**

Codice Intervento: P1388	*Codice SAP: 21/19073*	*Prot. 33246* *Data 10/04/2019*	Scala: varie

N. Rev.	Data	Descrizione	Disegnato	Controllato	Approvato
01	*AGO.2021*	*Emesso per integrazioni Valutazione di Impatto Ambientale*	/	/	/
00	*APR.2019*	*Emesso per PROGETTO DEFINITIVO*	/	/	/

rmato digitalmente da:Andrea Volpe
mite d'uso:Explicit Text: Questo certificato
spetta le raccomandazioni previste dalla
eterminazione Agid N. 121/2019
ata:14/12/2021 18:30:28
