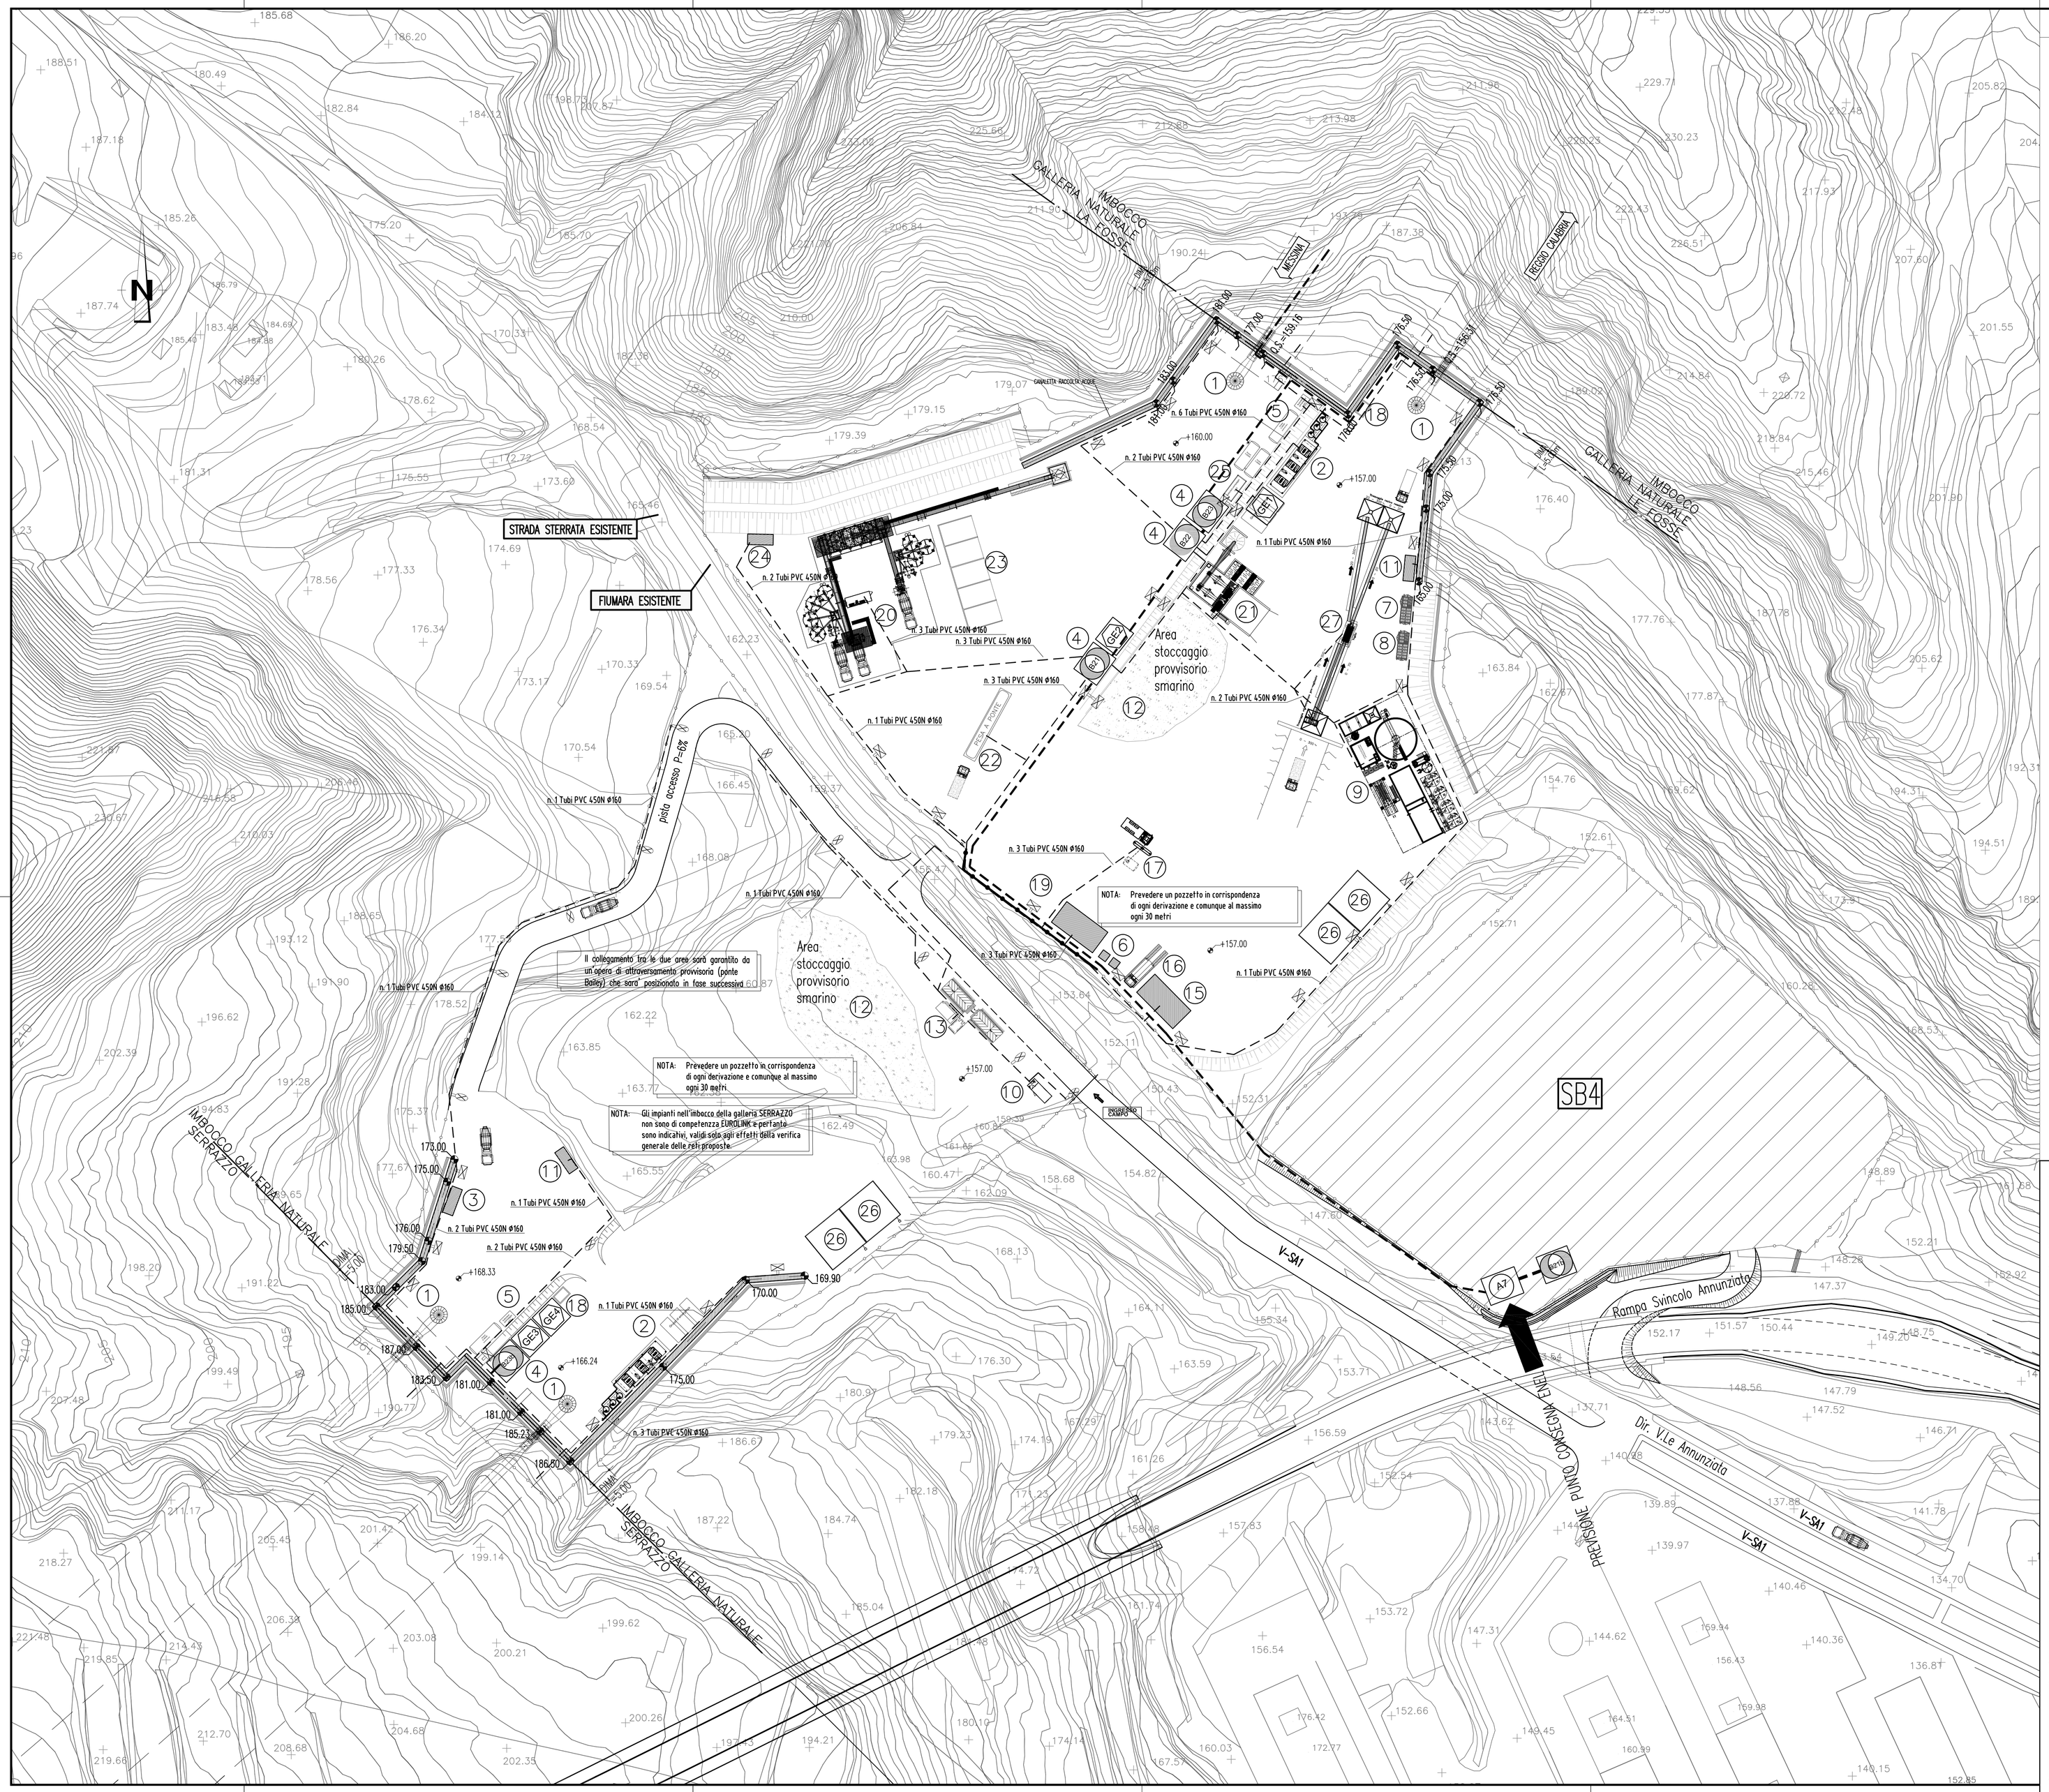

NOTE GENERALI

LEGENDA INSTALLAZIONI CANTIERI OPERATIVI : CO.58 ANNUNZIATA	
1	Ventilazione
2	Gruppo elettrocompressori
3	Cabina Enel
4	Cabina di trasformazione
5	Serbatoio H2O antincendio con gruppo di pompaggio
6	Deposito bombole ossigeno/acetilene
7	Deposito olii nuovi
8	Deposito olii usati
9	Impianto di trattamento acque
10	Guardiania
11	Servizi igienici
12	Area stoccaggio provvisorio materiale di smarino
13	Lavaggio gomme
14	Impianto trattamento acque betonaggio
15	Officina
16	Rampa officina
17	Distributore carburante
18	Vasca raccolta acque di galleria
19	Magazzino
20	Impianto di betonaggio
21	Impianto lavaggio betoniere
22	Pesa a ponte
23	Setti inerti
24	Laboratorio
25	Serbatoi acqua industriale
26	Aree caratterizzazione materiali di smarino
27	Impianto separazione VTR, spritz

DISTRIBUZIONE M.T. (20KV) IN CAVIDOTTO INTERRATO

DISTRIBUZIONE B.T. (400V) IN CAVIDOTTO INTERRATO

A.. Punto consegna ENEL e cabina di distribuzione primaria

B.. Cabina di trasformazione containerizzata (2.5x6.0m)

GE. Gruppo elettrogeno containerizzato (2.5x6.0m)

Proiettore asimmetrico (sap 400w)

Proiettore tipo stradale (sap 250w)

ITEM	DESCRIZIONE	TRAFO KVA		POTENZA INSTALLATA (kW)	POTENZA UTILIZZATA (kW)	ITEM	DESCRIZIONE	KVA
A7	Punto consegna/distribuzione	–	–	–	–	–	–	–
B21b	Cabina di Trasformazione	400	20/0.4kV	350	220	–	–	–
B21	Cabina di Trasformazione	800	20/0.4kV	590	420	GE2	Generatore d'emergenza	400
B22	Cabina di Trasformazione	1250	20/0.4kV	1000	810	GE1	Generatore d'emergenza	800
B23	Cabina di Trasformazione	1250	20/0.4kV	910	700	–	–	–
B23b	Cabina di Distribuzione	1000	0.4/20kV	1550	1180	GE3+GE4	Generatore d'emergenza	800+800

NOTA BENE: PER I DATI DI DETTAGLIO RELATIVI AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI VEDI RELAZIONE DESCRITTIVA DELL'OPERA
RIF. ELABORATO: CG2900PRODSCZC3CO58000001A

Stretto di Messina

Concessionario per la progettazione, realizzazione e gestione del collegamento stabile tra la Sicilia e il Continente
Organismo di Diritto pubblico
(Legge n° 1158 del 17 dicembre 1971, modificato dal D.Lgs. n° 114 del 24 aprile 2003)

EurolinK

PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA

PROGETTO DEFINITIVO

ALTERNATIVA AI SITI DI DEPOSITO

(Richieste CTA del: 22/12/2011 Prot. CTVA/2011/4534 e del: 16/03/2012 Prot. CTVA/2012/1012

EUROLINK S.C.p.A.
IMPREGILO S.p.A. (Mandataria)
SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.p.A. (Mandante)
COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - C.M.C. di Ravenna Soc. Coop. a.r.l. (Mandante)
SACYR S.A.U. (Mandante)
ISHIKAWAJIMA - HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO. Ltd. (Mandante)
A.C.I. S.C.P.A. - CONSORZIO STABILE (Mandante)

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005

IL PROGETTISTA	IL CONTRAENTE GENERALE	STRETTO DI MESSINA	STRETTO DI MESSINA
EurolinK Dott. Ing. E. Pagani Ordine Ingegneri Milano n° 15408	Project Manager (Ing. P.P. Marcheselli)	Direttore Generale (Ing. G. Fiammenghi)	Amministratore Delegato (Dott. P. Ciucci)

COLLEGAMENTI VERSANTE SICILIA

CANTIERI

OPERATIVI – LOGISTICI

CANTIERI OPERATIVI – CO.58. – ANNUNZIATA

CZV0330–F0

SI5 – PLANIMETRIA IMPIANTI E ATTREZZATURE – IMPIANTI ELETTRICI

CODICE: CG2900PP8VSCZC3CO58000003F0 — SCALA: 1:500

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
F0	31/05/2012	EMISSIONE FINALE	ORDFINO	FARINA	PAGANI

NOME DEL FILE: CZV0330_F0.dwg
