ID	Nome attività	Durata
1	1. DURATA TOTALE LAVORI - STAZIONE DI BARI CENTRALE	920 g
2	0. MACROFASE 0_ALLESTIMENTO CAMPO BASE	102 g
3	Dislocmento stalli autobus per predisporre l'area di cantiere	
4	Allestimento campo base di cantiere operativo C.b.1a (Piazza Aldo Moro)	
5	Costruzione nuova cabina elettrica lungo il corridoio di FA di via dei Caduti di via Fani e demolizione di uella esistente	
6	Demolizione del FA (ex KFC) e del FA in Via Caduti di via Fani	
7	Interventi strutturali di adeguamento sismico e funzionale del FA (ex KFC)	
8	Allestimento campo base di cantiere operativo di supporto A.T.1b e A.T.2	
9	0.1 FASE PROPEDEUTICA	60 g
10	Allestimento area di cantiere	
11	Demolizione/rimozione delle pensiline esistenti in acciaio	
12	Smantellamento della struttura di supporto della TE	
13	Realizzazione di strutture provvisorie per sostegno TE	
14	Interruzione del servizio del binaio o binari interessati	
15	1. MACROFASE 1_MA.0	854 g
16	Allestimento area di cantiere	
17	Realizzazione delle fondazioni	
18	Realizzazione delle strutture verticali da piano ferro a piano primo	
19	Posa delle travi prefabbricate principali	
20	SOTTOFASE A_MA.01. - MA.02. - S.P.	
21	SOTTOFASE B_MA.02. - MA.03. - S.P.	
22	SOTTOFASE C_MA.03. - MA.04. - S.P.	
23	SOTTOFASE D_MA.04. - MA.05. - S.P.	
24	SOTTOFASE E_MA.05. - MA.06. - S.P.	
25	Realizzzione di finiture	
26	2. MACROFASE 2_AE.01_AREE ESTERNE IN CONTINUITA' STRUTTURALE CON IL FV	300 g
27	Allestimento area di cantiere	
28	Realizzazione della piastra del FV (posa dei prefabbricati dell'orditura secondaria e getti di completamento)	
29	FASE PROPEDEUTICA 0.1	
30	Sottofase 1) campata 1 (tra FA e banchina 1)	
31	Smobilizzo del cantiere	
32	FASE PROPEDEUTICA 0.1	
33	Sottofase 2) campata 2 (tra banchina 1 e banchina 3)	
34	Smobilizzo del cantiere	
35	FASE PROPEDEUTICA 0.1	
36	Sottofase 3) campata 3 (tra banchina 3 e banchina 7 lungo via G. Capruzzi)	
37	Realizzzione di finiture	
38	Smobilizzo del cantiere	
39	3. MACROFASE 3_AE.02_GIARDINO PENSILE	350 g
40	Allestimento area di cantiere	
41	Realizzazione della piastra giardino (posa dei prefabbricati dell'orditura secondaria e getti di completamento)	
42	FASE PROPEDEUTICA 0.1	
43	Sottofase 4) campata 1 (tra banchina 3 e banchina 4)	
44	Smobilizzo del cantiere	
45	FASE PROPEDEUTICA 0.1	
46	Sottofase 5) campata 1 (tra banchina 1 e banchina 2)	
47	Smobilizzo del cantiere	
48	FASE PROPEDEUTICA 0.1	
49	Sottofase 6) campata 3 (tra banchina 5 e banchina 7 lungo via G. Capruzzi)	
50	Realizzzione di finiture	
51	Smobilizzo del cantiere	
52	4. MACROFASE 4_AE.02_GIARDINO PENSILE	325 g
53	Allestimento area di cantiere	
54	Realizzazione della piastra giardino (porzione finale con travi PREM)	
55	Chiusura temporanea dei binari tronchi	
56	Realizzazione di linee di banchinatura provvisoria in acciaio e delle strutture verticali permanenti	
57	FASE PROPEDEUTICA 0.1	
58	Sottofase 7) campata 1 (tra banchina 3 e banchina 4)	
59	Smobilizzo del cantiere	
60	FASE PROPEDEUTICA 0.1	
61	Sottofase 8) campata 2 (tra banchina 1 e banchina 2)	
62	Smobilizzo del cantiere	
63	FASE PROPEDEUTICA 0.1	
64	Sottofase 9) campata 3 (tra banchina 5 e banchina 7 lungo via G. Capruzzi)	
65	Realizzzione di finiture	
66	Smobilizzo del cantiere	
67	5. MACROFASE 5_FV.01-FABBRICATO VIAGGIATORI E COPERTURA	368 g
68	Allestimento area di cantiere	
69	Realizzazione del fabbricato a Ponte	
70	Realizzazione copertura in acciaio (sopra la piastra del FV, senza interferire con la ferrovia)	
71	Realizzazione piano ammezzato (appesa alla copertura in acciaio, senza interferire con la ferrovia)	
72	Smobilizzo campo base/cantiere operativo di supporto A.T.2	
73	Realizzazione rampa di accesso e della copertura in quota vicino Via dei Caduti di Via Fani	
74	Realizzzione di finiture	
75	Smobilizzo del cantiere	
76	Ripristino stato dei luoghi	
77	6. MACROFASE 6_FA.01_VOLUME IN VETRO A SERVIZIO DEI LOCALI COMMERCIALI	200 g
78	Allestimento area di cantiere	
79	Realizzazione del volume in vetro	
80	Realizzazione di copertura tecnologica	
81	Realizzzione di finiture	
82	Smobilizzo cantiere	
83	7. MACROFASE 7_AE.04_AREE ESTERNE PIAZZA ALDO MORO	102 g
84	Allestimento area di cantiere	
85	Parzializzazione e deviazione dei percorsi carrabili e dei flussi pedonali	
86	Sistemazione esterna del verde e della pavimentazione	
87	Realizzazione impianto di illuminazione	
88	Inserimento di segnaletica e arredo urbano	
89	Smobilizzo cantiere	
90	8. MACROFASE 8_AE.03_AREE ESTERNE PIAZZA ALDO MORO	140 g
91	Allestimento area di cantiere	
92	Parzializzazione e deviazione dei percorsi carrabili e dei flussi pedonali	
93	Sistemazione esterna del verde e della pavimentazione	
94	Realizzazione della pensilina	
95	Realizzazione delle vasche di raccolta	
96	Realizzazione impianto di illuminazione	
97	Inserimento di segnaletica e arredo urbano	
98	Smobilizzo del campo base/cantiere operativo A.T.1b	
99	Ripristino stato dei luoghi	
100	9. MACROFASE 9_AE.05 - AE.06_AREE ESTERNE VIA CAPRUZZI, PASSERELLE SOPRAELEVATE E SMOBILIZZAZIONE DEI CANTIERI	161 g
101	Allestimento campo base operativo e di supporto A.T.3	
102	Allestimento area di cantiere	
103	Parzializzazione e deviazione dei percorsi carrabili e dei flussi pedonali	
104	Sistemazione esterna del verde e della pavimentazione	
105	Realizzazione impianto di illuminazione	
106	Inserimento di segnaletica e arredo urbano	
107	Smobilizzo del campo base/cantiere operativo A.T.3	
108	Ripristino stato dei luoghi	

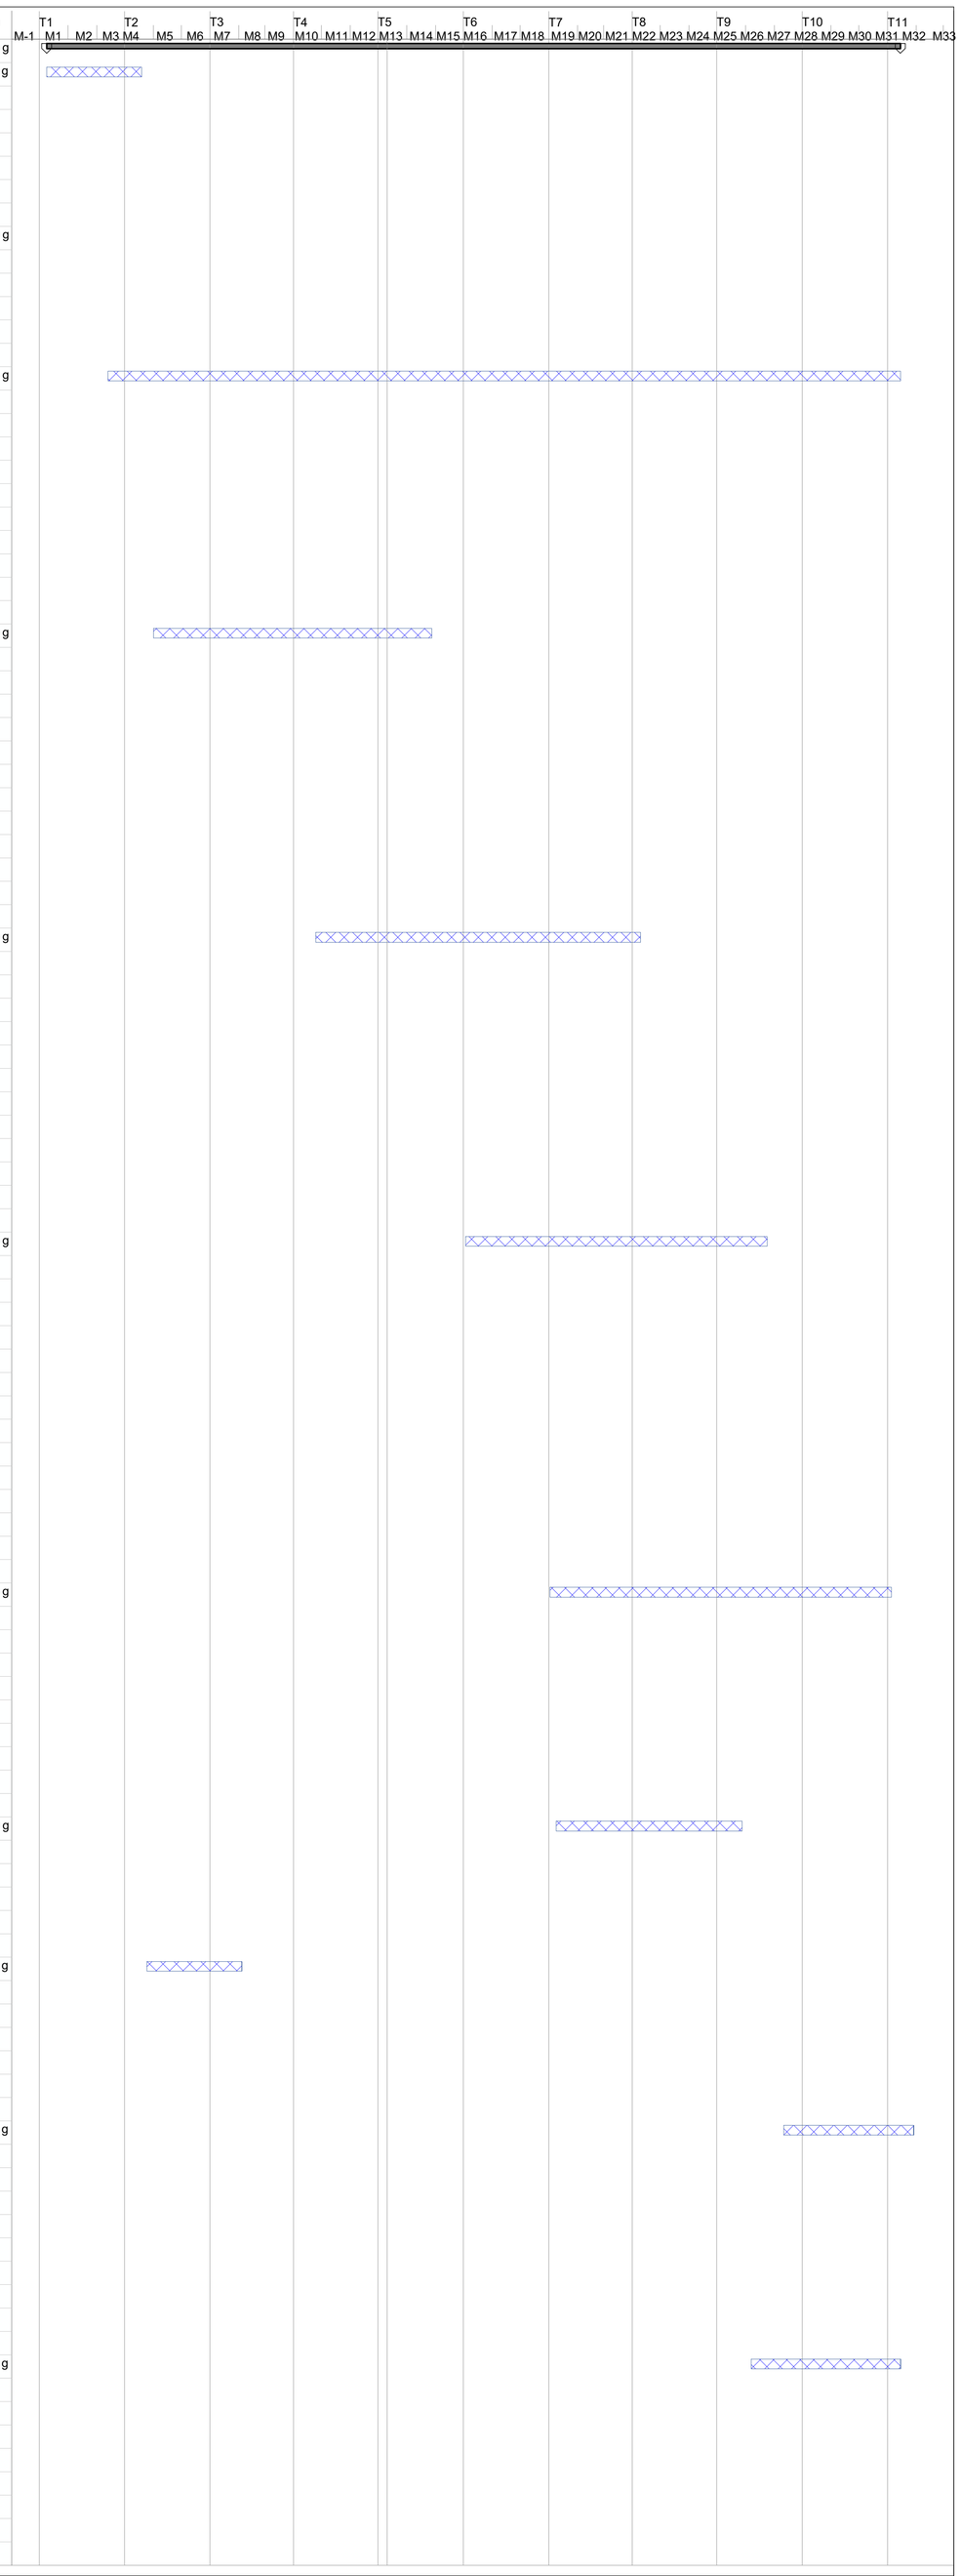

T = Trimestre
M = Mese

Attività
Divisione
Riepilogo progetto
Riepilogo

COMMITTENTE

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE STAZIONI - INGEGNERIA E INVESTIMENTI STAZIONI

SOGGETTO TECNICO

DIREZIONE STAZIONI - INGEGNERIA STAZIONI

PROGETTAZIONE

MANDATARIA
CODING S.R.L.

MANDANTE (se presente)
POLITECNICA SOC. COOP.
SWS ENGINEERING S.P.A.

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA
STAZIONE DI BARI CENTRALE
NUOVO HUB DI CONNESSIONE URBANA E MOBILITÀ SOSTENIBILE

CANTIERIZZAZIONE
Cronoprogramma

SCALA -

PROGETTO	ANNO	SOTTOPR.	LIVELLO	NOME DOC.	TIPO DOC.	SCALA	NUM.	REV.
3262	21	S01	PF	BRSC	CN	SX	E01	A

Rev	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato Il Responsabile	Data	Autorizzato Il Soggetto Tecnico	Data
A	Emissione	R. Cappellone	11/07/22	D. Onorati	11/07/22	GIUSEPPE FABRIZIO COPPA ~~11.07.2022 16:01:22~~ GMT+01:00	11/07/22	M. Sangiovanni	11/07/22

POSIZIONE ARCHIVIO

LINEA	SEDE TECNICA	NOME DOC.	NUMERAZIONE
L454	LO0595		
