IMPIANTO FOTOVOLTAICO "FV FOGGIA"
49,40 MWp
e opere di connessione alla RTN
COMUNE DI FOGGIA (FG)

Cronoprogramma

SCS Ingegneria S.R.L.
Via F.do Ayroldi, 10
72017 – Ostuni (BR)
Tel/Fax 0831.336390
www.scsingegneria.it

IL DIRETTORE TECNICO

			DATA: 08/2021	
	Scopo Documento: PROGETTO DEFINITIVO			
REV. N.	**DATA**	**DESCRIZIONE**	**PREPARATO**	**APPROVATO**
00	**08/2021**	**EMISSIONE DEL DOC.**	**TEAM SCS**	**A.SERGI**

PROGETTO/Project	SCS CODE																			
	COMPANY	FUNCTION	TYPE	DISCIPLINE			COUNTRY			TEC.	PLANT				PROGRESSIVE			REVISION		
FV FOGGIA 7112	S C S	D E S	R	G	E	N	I	T	A	P	7	1	1	2	0	0	9	0	0	

1 CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

La Società LIMES 9 S.r.l. nell'ambito della propria attività imprenditoriale, ha previsto la realizzazione di un parco fotovoltaico, agrovoltaico, denominato in seguito "FV Foggia", nella Località Tavernola, nel Comune di Foggia (FG).
L'impianto in questione è caratterizzato da una potenza complessiva di 40,402 MWp e si localizza in zona agricola E, secondo lo strumento urbanistico del Comune di Foggia.

A seguire, si rappresenta l'elenco delle attività considerate e l'allegato alla presente mostra il cronoprogramma di ognuno degli interventi.

ATTIVITA'
CANTIERE CENTRALE FOTOVOLTAICA
APPRONTAMENTO CANTIERE
(approntamento cantiere: cartellonistica , illuminazione, recinzioni e delimitazioni,
segnaletica orizzontale temporanea, impianti di servizio al cantiere, depositi materiali/attrezzature)
RECINZIONE: Realizzazione recinzione nuova
VIABILITA' A SERVIZIO DELL'IMPIANTO
Pulizia e preparazione terreno
Demolizioni totali o parziali (basamenti in c.a.)
Scavi
Regolarizzazione sottofondi/compattazione
Rilevato
Pavimentazione stradale in misto granulare
ATTIVITA' DI CANTIERE EDILE
MONTAGGIO DI STRUTTURE DI SUPPORTO
Fissaggio carpenterie metalliche di sostegno dei moduli tramite viti di fondazione
CAVIDOTTI PER COLLEGAMENTO STRUTTURE - QUADRI DI PARALLELO STRINGHE
Delivery on site cavi
Scavo e preparazione letto di sabbia
Posa e rinterro
MONTAGGIO MODULI SOLARI FOTOVOLTAICI MONOCRISTALLINI
Delivery on site moduli
Montaggio moduli
CAVIDOTTI PER COLLEGAMENTO QUADRI DI PARALLELO STRINGHE - CABINA DI CONVERSIONE
Scavo e preparazione letto di sabbia

Posa e rinterro
CAVIDOTTI PER COLLEGAMENTO CABINE DI CONVERSIONE - CABINA GENERALE MT
Scavo e preparazione letto di sabbia
Posa e rinterro
CAVIDOTTI PER COLLEGAMENTO CABINA GENERALE MT - SOTTOSTAZIONE ELETTRICA
Scavo e preparazione letto di sabbia
Posa e rinterro
COSTRUZIONE IN OPERA DI LOCALI TECNICI
CABINE DI CONVERSIONE DA 1 A 11
Delivery on site cabine di conversione
Magrone + armatura + rete di terra
Messa in opera delle cabine inverter (prefabbricate)
CABINE GENERALE MT - CABINA UFFICI - CABINA MAGAZZINO
Delivery on site cabine
Magrone + armatura + rete di terra
Messa in opera delle cabine
ASSEMBLAGGIO QUADRI DI PARALLELO STRINGHE (QPS)
Montaggio struttura quadro
Cablaggio (stringhe-connettori-arrivo quadro)
ASSEMBLAGGIO QUADRI ALIMENTAZIONE STRUTTURE (QAUX)
Montaggio struttura quadro
Cablaggio (dispositivi di sezionamento, protezione e misura)
ASSEMBLAGGIO QUADRI MT CABINA GENERALE MT E CABINE DI CONVERSIONE
Montaggio strutture quadri MT
Cablaggio (dispositivi di sezionamento, protezione e misura)
SOTTOSTAZIONE ELETTRICA LIMES 9 S.r.l.
SOTTOSTAZIONE ELETTRICA OPERE CIVILI
SOTTOSTAZIONE ELETTRICA OPERE ELETTROMECCANICHE
CONNESSIONE
Regolamento di esercizio
UTF (ufficio tecnico di finanza)
AVVIAMENTO
Collaudo impianto
Start up
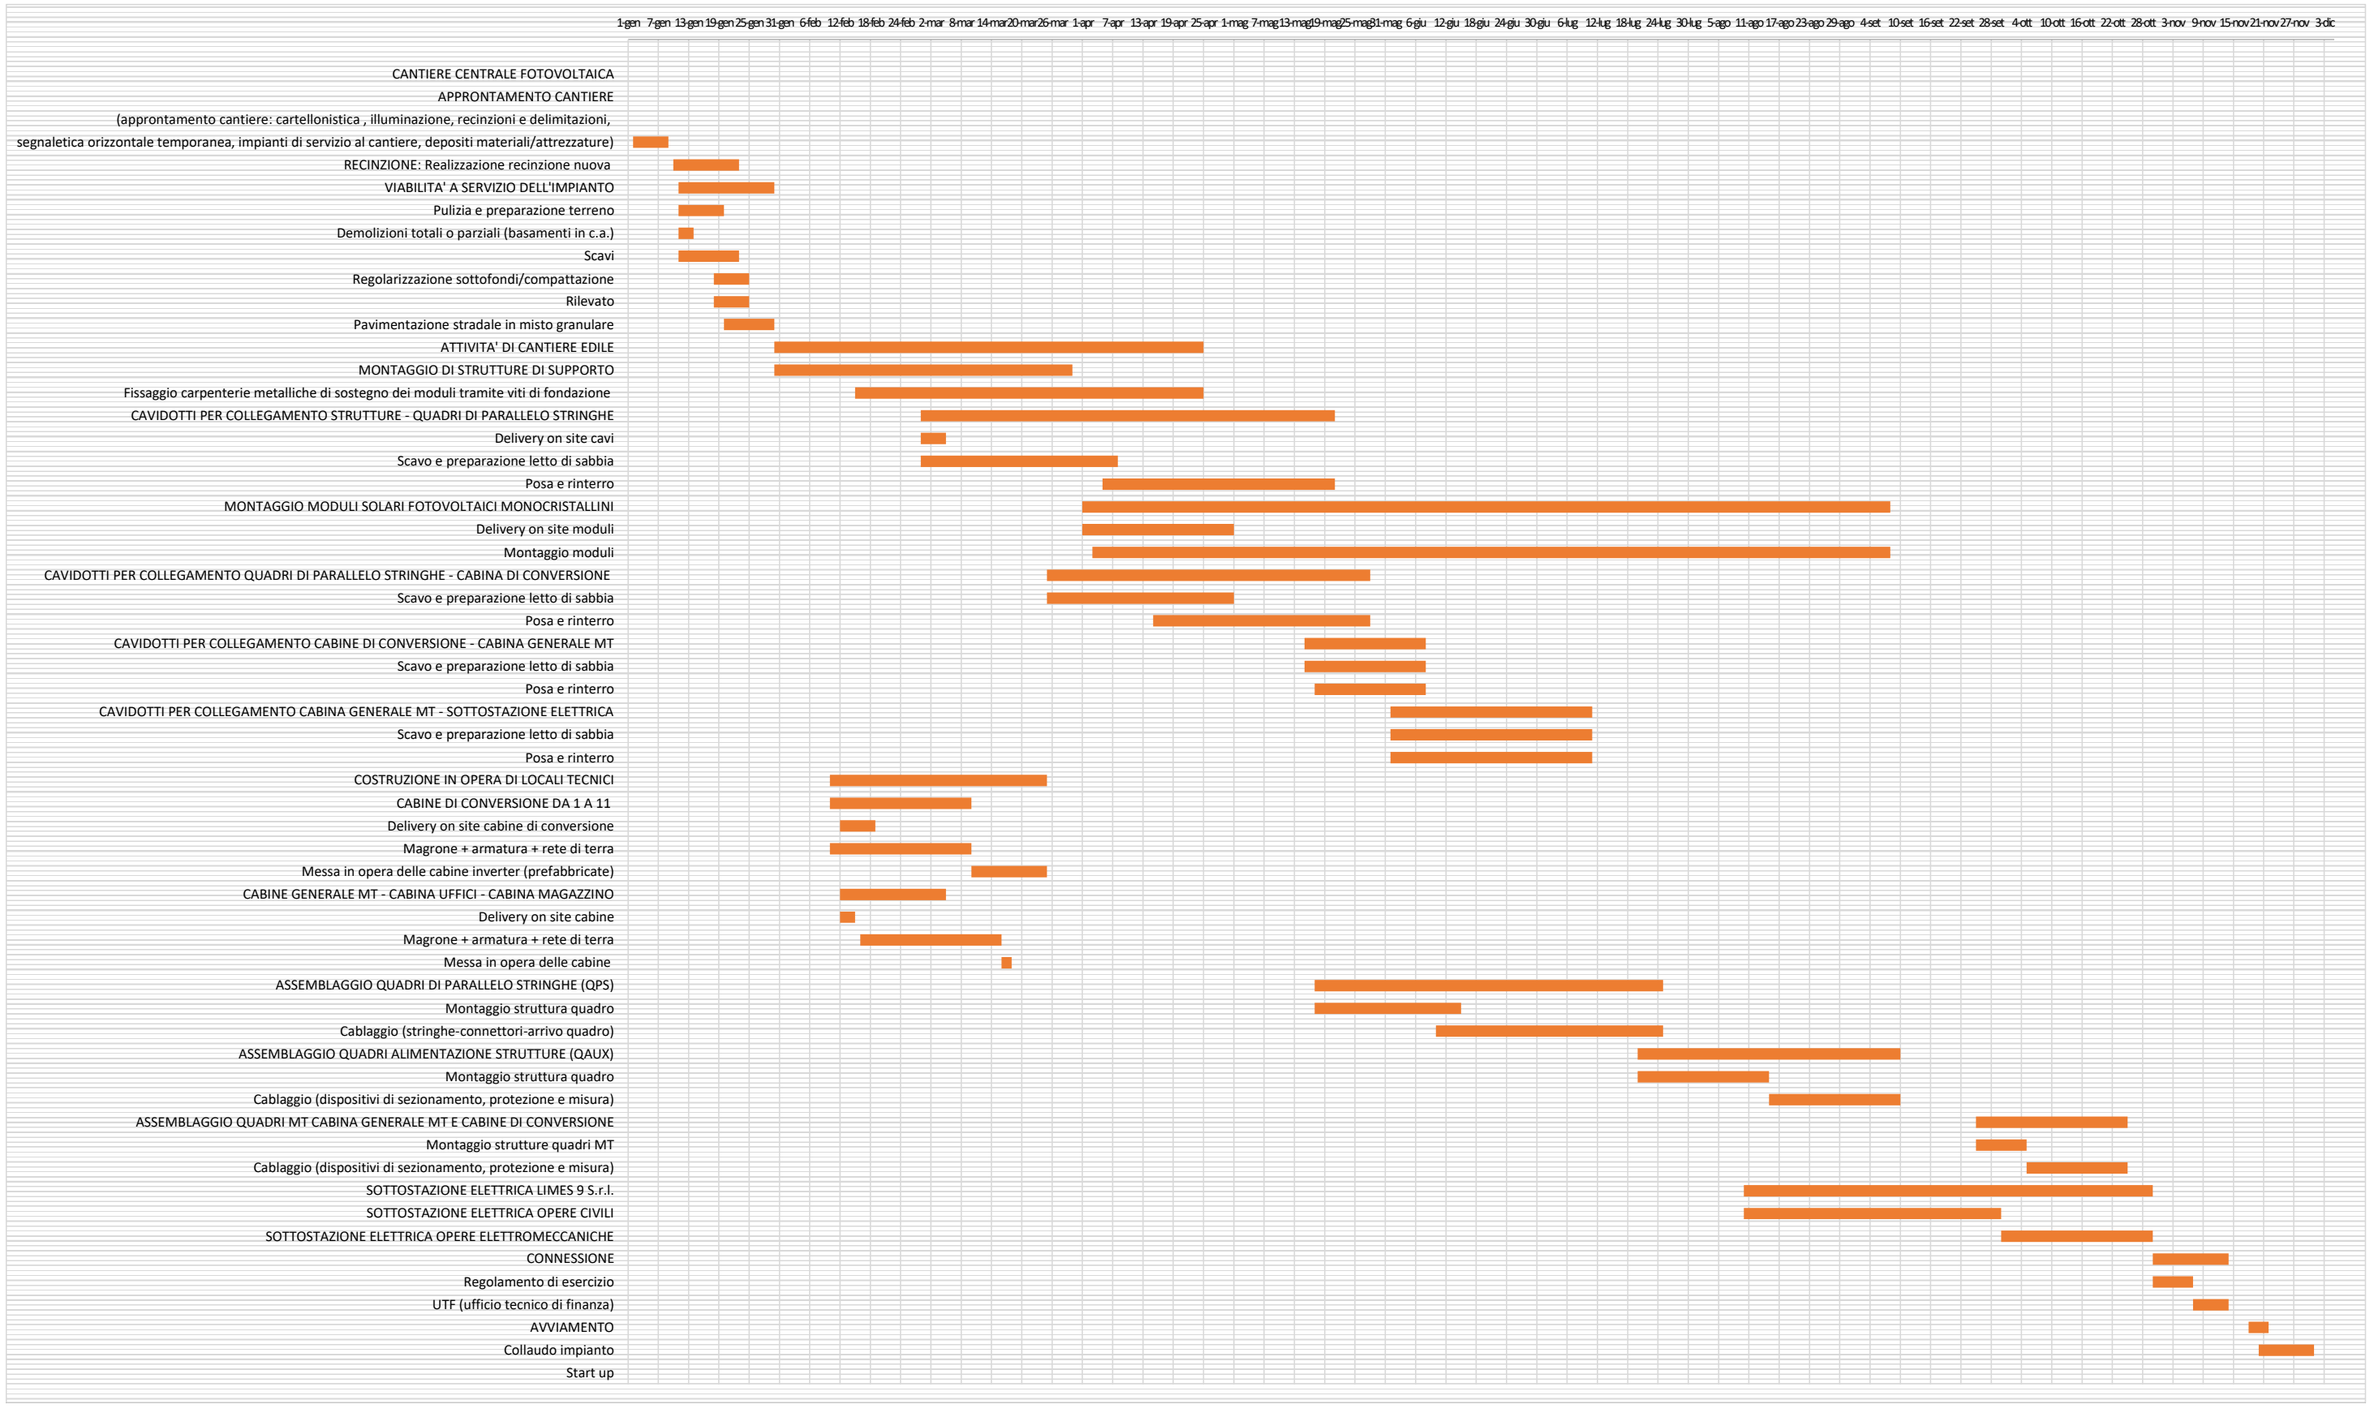
CRONOPROGRAMMA PROGETTO IMPIANTO FV FOGGIA - LIMES 9
