FASE 1 - Scala 1:500

-SMONTAGGIO MODULI FOTOVOLTAICI

Informazioni operative

Operazione: Rimozione moduli fotovoltaici

N° Operai = 20

N° Mezzi = 3

Tempo impiegato = 15 giorni

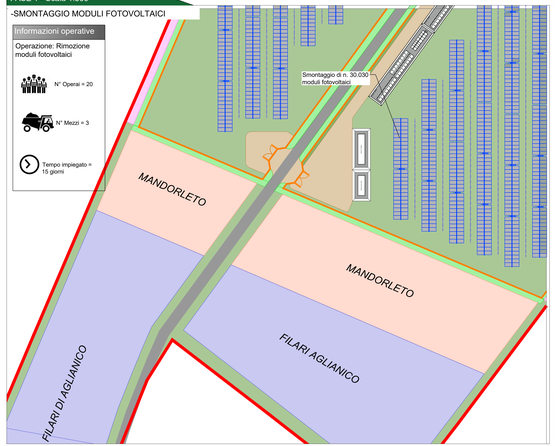

FASE 2 - Scala 1:500

-SMONTAGGIO STRUTTURE DI SOSTEGNO

Informazioni operative

Operazione: Smontaggio strutture di sostegno

N° Operai = 10

N° Mezzi = 2

Tempo impiegato = 29 giorni

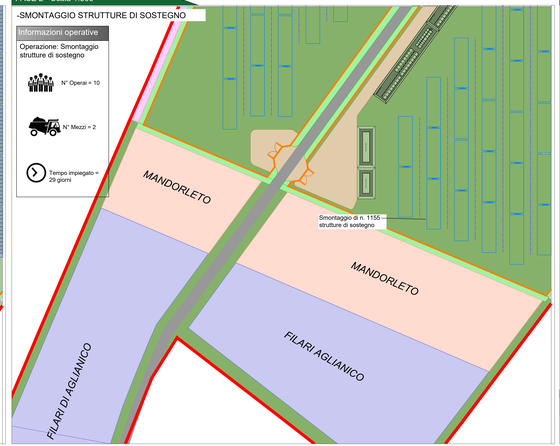

FASE 3 - Scala 1:500

-RIMOZIONE DELLE FONDAZIONI A PALI BATTUTI

Informazioni operative

Operazione: Rimozione delle fondazioni a pali battuti

N° Operai = 10

N° Mezzi = 3

Tempo impiegato = 17 giorni

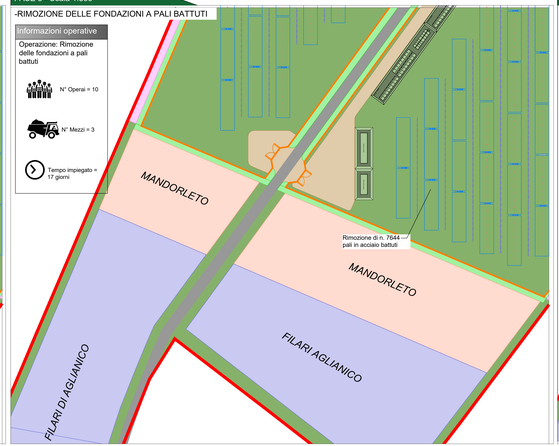

FASE 4 - Scala 1:500

-Rimozione di n.8 cabine elettriche;
-Rimozione di n.1 cabina di consegna;
-Rimozione di n.2 cabina servizi ausiliari;
-Rimozione di n.6 sistemi di Storage

Informazioni operative

Operazione: Rimozione cabine storage, trasformazione e consegna

N° Operai = 4

N° Mezzi = 2

Tempo impiegato = 9 giorni

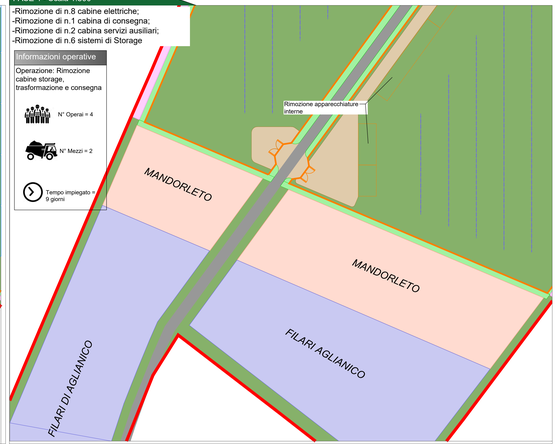

FASE 5 - Scala 1:500

-RIMOZIONE CAVI ELETTRICI DAI CAVIDOTTI BT/MT

Informazioni operative

Operazione: Rimozione cablaggi

N° Operai = 12

N° Mezzi = 2

Tempo impiegato = 20 giorni

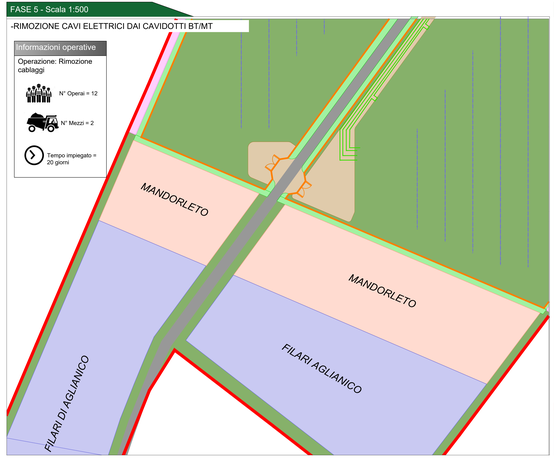

FASE 6 - Scala 1:500

-RIMOZIONE DELLE VASCHE DI FONDAZIONE DELLE CABINE

Informazioni operative

Operazione: Rimozione vasche di fondazione delle cabine

N° Operai = 10

N° Mezzi = 2

Tempo impiegato = 9 giorni

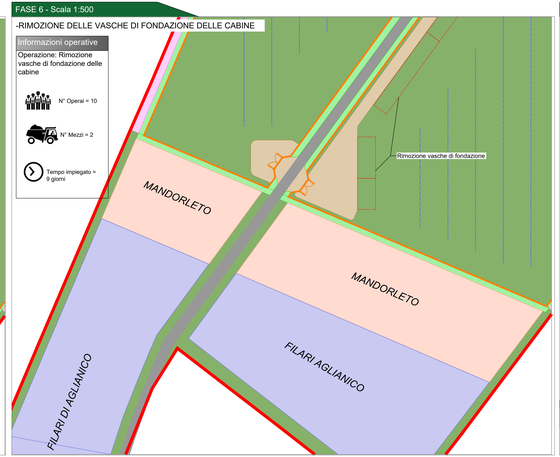

FASE 7 - Scala 1:500

Dettaglio fase 7:
-Rimozione tubi corrugati (15 giorni)
-Rimozione pozzetti di ispezione (7 giorni)
-Rimozione viabilità interna (7 giorni)
-Rimozione cavidotto esterno (43 giorni)

Informazioni operative

Operazione: Rimozione della viabilità interna, tubi corrugati interrati, pozzetti di ispezione e ripristino degli scavi rinvenienti dalla rimozione della viabilità, dei cavidotti

N° Operai = 15

N° Mezzi = 2

Tempo impiegato = 72 giorni

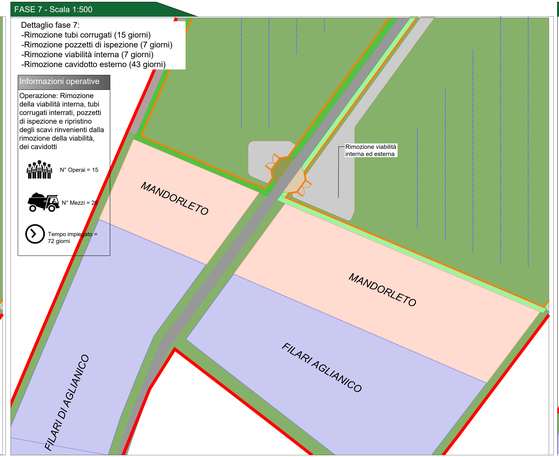

FASE 8 - Scala 1:500

RIMOZIONE di n.6 cancelli
RIMOZIONE di n. 1957 pali infissi di fondazione della recinzione

Informazioni operative

Operazione: Rimozione recinzione

N° Operai = 20

N° Mezzi = 4

Tempo impiegato = 80 giorni

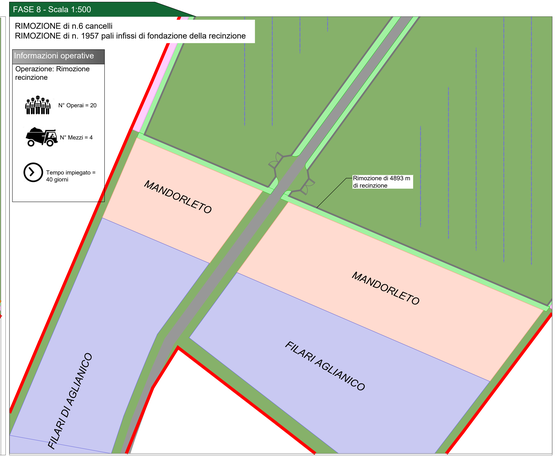

FASI DI DISMISSIONE IMPIANTO

- FASE 1: Smontaggio moduli fotovoltaici
- FASE 2: Smontaggio delle strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici
- FASE 3: Rimozione dei pali di fondazione delle strutture e dei pali di videosorveglianza
- FASE 4: Rimozione delle cabine di trasformazione, consegna e smontaggio e rimozione inverter, smontaggio delle apparecchiature elettromecaniche
- FASE 5: Rimozione cavi elettrici dai cavidotti
- FASE 6: Rimozione delle vasche di fondazione delle cabine
- FASE 7: Rimozione della viabilità interna, dei tubi corrugati interrati e dei pozzetti di ispezione e ripristino degli scavi
- FASE 8: Rimozione delle recinzioni perimetrali e dei cancelli di ingresso

N.B.: Le opere di mitigazione presenti nell'area di impianto non saranno oggetto di dismissione.

Legenda generale

- Ingresso campo fotovoltaico
- Perimetro catastale impianto
- Perimetro recinzione impianto
- Siepe autoctona perimetrale
- Filari di Aglianico del Vulture
- Stringhe di tipo 'tracker' composte da 26x2 e 26x3 moduli fotovoltaici da 655W
- Cabine trafomatore di campo, cabine utente e cabine di consegna
- Cabina di consegna e servizi ausiliari
- Cabine per energy storage
- Viabilità interna impianto
- Leguminose autoriseminanti
- Strisce di impollinazione

COMMITTENTE:

CanadianSolar

RE C.S. ABRUZZO S.r.l.
Sede legale: c/o Ghella Pedemontana Scarl
Società soggetta a Direzione e Coordinamento di Canadian Solar Inc. (100%)
Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle Imprese Chieti-Pescara
Codice Fiscale/ Partita IVA 02.486.000.693
PEC: renewables@ghella.pec.it

PROGETTAZIONE:

TEKNE Soc. Coop. Sociale Onlus
TEKNE srl
Via Vinciguerra Sabatini, 11 - 10153 ancona
Tel. 0039 (0)71 2904 1 - Fax 0039 (0)71 2904 200/201
www.progettekne.it - e-mail: info@progettekne.it

PROGETTISTA:
Ing. Giovanni Stefano Fantozzi
(Direttore Tecnico)

LEGALE RAPPRESENTANTE:
Ing. Giovanni Fantozzi

CONSULENTE:

PD PROGETTO DEFINITIVO	PROGETTO DI DISMISSIONE IMPIANTO FASI DI DISMISSIONE			Tavola: RE15-All.2	Filename: RE15-All.2-FASI-DI-DISMISSIONE-IMPIANTO-DISMISSIONE-IMPIANTO
Data l'emissione: Giugno 2022	Redatto: M. SANTONOCONNA	Verificato: G. PERTUSO	Approvato: A. PERTUSO	Scala: 1:500	Protocollo Tekne: TKA701

REVISIONI
N°	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
1					
2					
3					
4					
