Regione Lombardia | Provincia di Brescia | Comune di Bedizzole | Comune di Lonato del Garda

AGRIVOLTAICO "LONATO"

Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto agrivoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle relative opere e infrastrutture connesse, della potenza elettrica di 23.2MW, da realizzare nei Comuni di Bedizzole e Lonato del Garda (BS)

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA *Ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.*	Num. elaborato 01_R08	Scala disegno

CRONOPROGRAMMA DI DISMISSIONE

REVISIONI, VERIFICHE E APPROVAZIONI

DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
15/07/2022	prima emissione	ANTHEMIS	ANTHEMIS	ILOS

Proponente

ILOS
Società Consortile SRL

ING Le Cassette SRL
Piazza di Sant'Anastasia, n°7
00186 ROMA
melcocesare.ing@legalmail.it
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA
Ing. Cesare Melcoce n. 19000
Sez. A Settore A - Civile e Ambientale
Ing. Cesare Melcoce Via Cassiodoro, 7, 00186 Roma
Firmato Digitalmente

Copropriétà

Electro Power S.a.s. di Rije Ugo & C.
Piazza Affari, n°45
14100 Asti (AT)
+39 011 9034600
info@electro-power.net

SD PROGETTI
Via Lanzo Sermano, n°4
12084 MONDOVÌ (CN)
+39 012 477537
studio@sdprogetti.net

Tutti i diritti sono riservati. E' vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza l'autorizzazione scritta dell'autore.

Progettazione

ANTHEMIS ENVIRONMENT SRL
Via Lombardia, n°207
00187 ROMA (RM)
+39 011 8977307
info@anthemisenvironment.it

FASE LAVORATIVA	RUOLO	FINE SCADENZA	GIORNI
Disconnessione dell'impianto dalla rete elettrica ed eliminazione rischio di sovracarichi per gli operatori in campo			2
Messa in sicurezza dell'impianto con adeguata formazione del personale operante e installazione			8
Smontaggio dei cavi (cavone della stringa, stringa, esportazione in collettore) presso centri di recupero/smaltimento. Rimozione degli elementi strutturali ed opere accessorie			10
Rimozione dei moduli fotovoltaici e smaltimento e conferimento presso centri di recupero/smaltimento			13
Rimozione delle apparecchiature elettriche/elettroniche/inverter ecc. delle cabine e loro conferimento presso centri di raccolta autorizzati (RAEE)			9
Rimozione dei cavi interrati all'interno di corrugati e conferimento a centri di raccolta e recupero			3
Smontaggio della struttura metallica, eventuale trasportamento per il trasporto degli elementi e conferimento a centri di recupero			15
Smontaggio dell'impianto di illuminazione esterna, videosorveglianza, antifurto, ecc. e conferimento a centri presso centri autorizzati alla smaltimento o recupero (pali metallici, cavi, corpi illuminanti, telecamere, cablaggi RAEE in genere)			7
Rimozione dei tubi corrugati interrati e conferimento presso centri di raccolta, cosa anche eventuali pozzetti d'ispezione			7
Rimozione delle cabine prefabbricate e loro conferimento presso centri di smaltimento.			7
Demolizione delle fondazione sotto cabine realizzate in opera. Sarnano utilizzati mezzi meccanici e manuali. Conferimento delle macerie presso discariche autorizzate			4
Rimozione recinzione e cancelli metallici, pulizia area/opere e loro smaltimento presso centri di raccolta autorizzati			12
Demolizione e asportazione di tutti i manufatti in cemento armato, compresi dei pali della recinzione, pali cancelli, pali illuminazione di videosorveglianza, eventuali cisternone			5
Piantumazione delle aree perimetrali secondo alla mitigazione ambientale. Da ora procede la manutenzione del verde piantumato per un periodo di 3 anni (sostituzione delle fallanze)			10
Rimozione di eventuali materiali di riporto, con smaltimento presso siti autorizzati			4
Rimozione ghiaia delle strade di servizio perimetrali			4
Pulizia completa dell'area da ogni residuo delle opere di smontaggio			5
Rimozione dell'area cortile in ingresso, per livellamento del terreno, con mezzi meccanici, dumper, bocaccieri, scaiter con trattamento, compattazione ecc)			5
Restituzione del sito alla proprietà, dopo ispezione finale			1

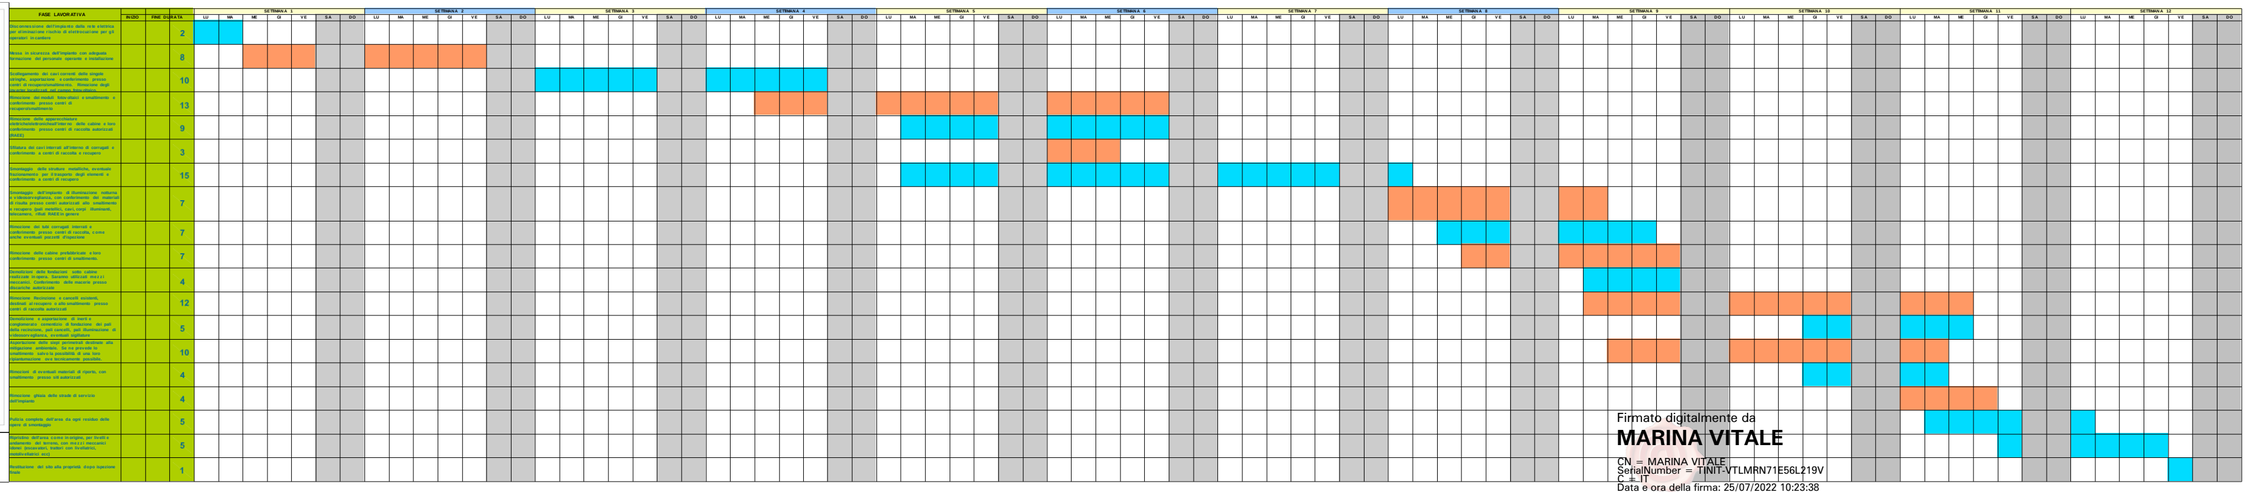

Firmato digitalmente da
MARINA VITALE
CN = MARINA VITALE
SerialNumber = TINIT-VTLMRN71E56L219V
C = IT
Data e ora della firma: 25/07/2022 10:23:38
