Firmato digitalmente da

Pablo Miguel Otin Pintado

C = IT

COMUNE DI

FOGGIA E MANFREDONIA

PROGETTO

Progetto relativo alla costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico con accumulo e relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale da realizzarsi in agro di Foggia e Manfredonia (FG), denominato “Tavernola” e avente potenza moduli pari a 49,66 MWp, potenza A.C. 45 MW, accumulo pari a 10 MW e potenza totale in immissione pari a 55 MW

ELABORATO

Cronoprogramma Realizzazione

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

LIV. PROG.	VERSIONE	TIPO DOC.	CODICE PROGETTO	CODICE ELABORATO	DATA	SCALA
PD	01	REL	IT0PW004.071024	IT0PW004.PD.01.REL.VIA2_2.CR	06/2022	

REVISIONI

REV	DATA	AUTORE	DESCRIZIONE	VER.	APP.
1.0	06/2022	MAYA	Cronoprogramma realizzazione opere	IVC	

PROGETTAZIONE

MAYA Engineering

Maya Engineering S.r.l.
Via M. D'Azeglio 2, 70017, Putignano (BA)
T: +39 080 8937976 | E: info@maya-eng.com
CF e P.IVA 08365980724

GRUPPO DI LAVORO

Dott. Ing. Vito Caliò
Via Sant'Antonio 3c, 70017, Putignano (BA)
M: +39 328 4819015
E: v.calio@maya-eng.com

Firmato digitalmente da: Vito Calio'
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digital identity
Data: 14/07/2022 17:22:04

SPAZIO RISERVATO AGLI ENTI

RICHIEDENTE

AMBRA SOLARE 7 S.R.L.

ID	Nome attività	Durata
1		**320 g**
2	**Impianto "Agrivoltaico"**	**300 g**
3	**Impianto Fotovoltaico**	**300 g**
4	Allestimento cantiere	2 s
5	Sbancamenti e livellazioni	3 s
6	Installazione recinzioni, accessi	2 s
7	Scavi cabine di campo e posa manufatti	3 s
8	Scavi e rinterri cavidotti interni	25 s
9	Cablaggi BT (DC e AC), MT	25 s
10	Tracciamenti e posa tracker	38 s
11	Montaggio moduli FV, quadri campo, e cablaggi DC	38 s
12	Installazione inverter, trasformatori, cablaggi AC (bt/MT)	4 s
13	Installazione impianti telecontrollo e collegamenti	4 s
14	Scavi e rinterri elettrodotti collegamento lotti imp. (ext)	7 s
15	Cabaglli cavi MT di collegamento lotti imp. (ext)	2 s
16	Impianti ausiliari (sorveglianza, illuminazione)	2 s
17	Ripristino strade (ove previsto)	2 s
18	**Stazione Utente (150 kV)**	**245 g**
19	Allestimento cantiere (macro area)	2 s
20	Sbancamenti e livellazioni	3 s
21	Piste di accesso , recinzione e accesso	3 s
22	Scavi per fabbricati servizi	2 s
23	Realizzazione fabbricato servizi	12 s
24	Scavi sottoservizi	10 s
25	Installazione sottoservizi	6 s
26	Scavi apparati AT	10 s
27	Installazione apparati AT	7 s
28	Scavi per impianto trattamento acque	4 s
29	Realizzazione impianto trattamento acque	4 s
30	Cabalggi elettrici (MT/AT)	9 s
31	Installazione trasformatori MT/AT	4 s
32	Scavi e rinterri elettrodotto AT di collegamento a SE TERNA	2 s
33	Posa in opera di cavo AT di collegamento a SE TERNA	2 s
34	**Collaudi e commissioning**	**10 g**
35	Collaudi e misure impianto agrivoltaico	2 s
36	Collaudi e misure Stazione Utente	2 s
37	**Smobilizzi**	**10 g**
38	Smobilizzo cantiere impianto agrivoltaico	2 s
39	Smobilizzo cantiere SU	2 s

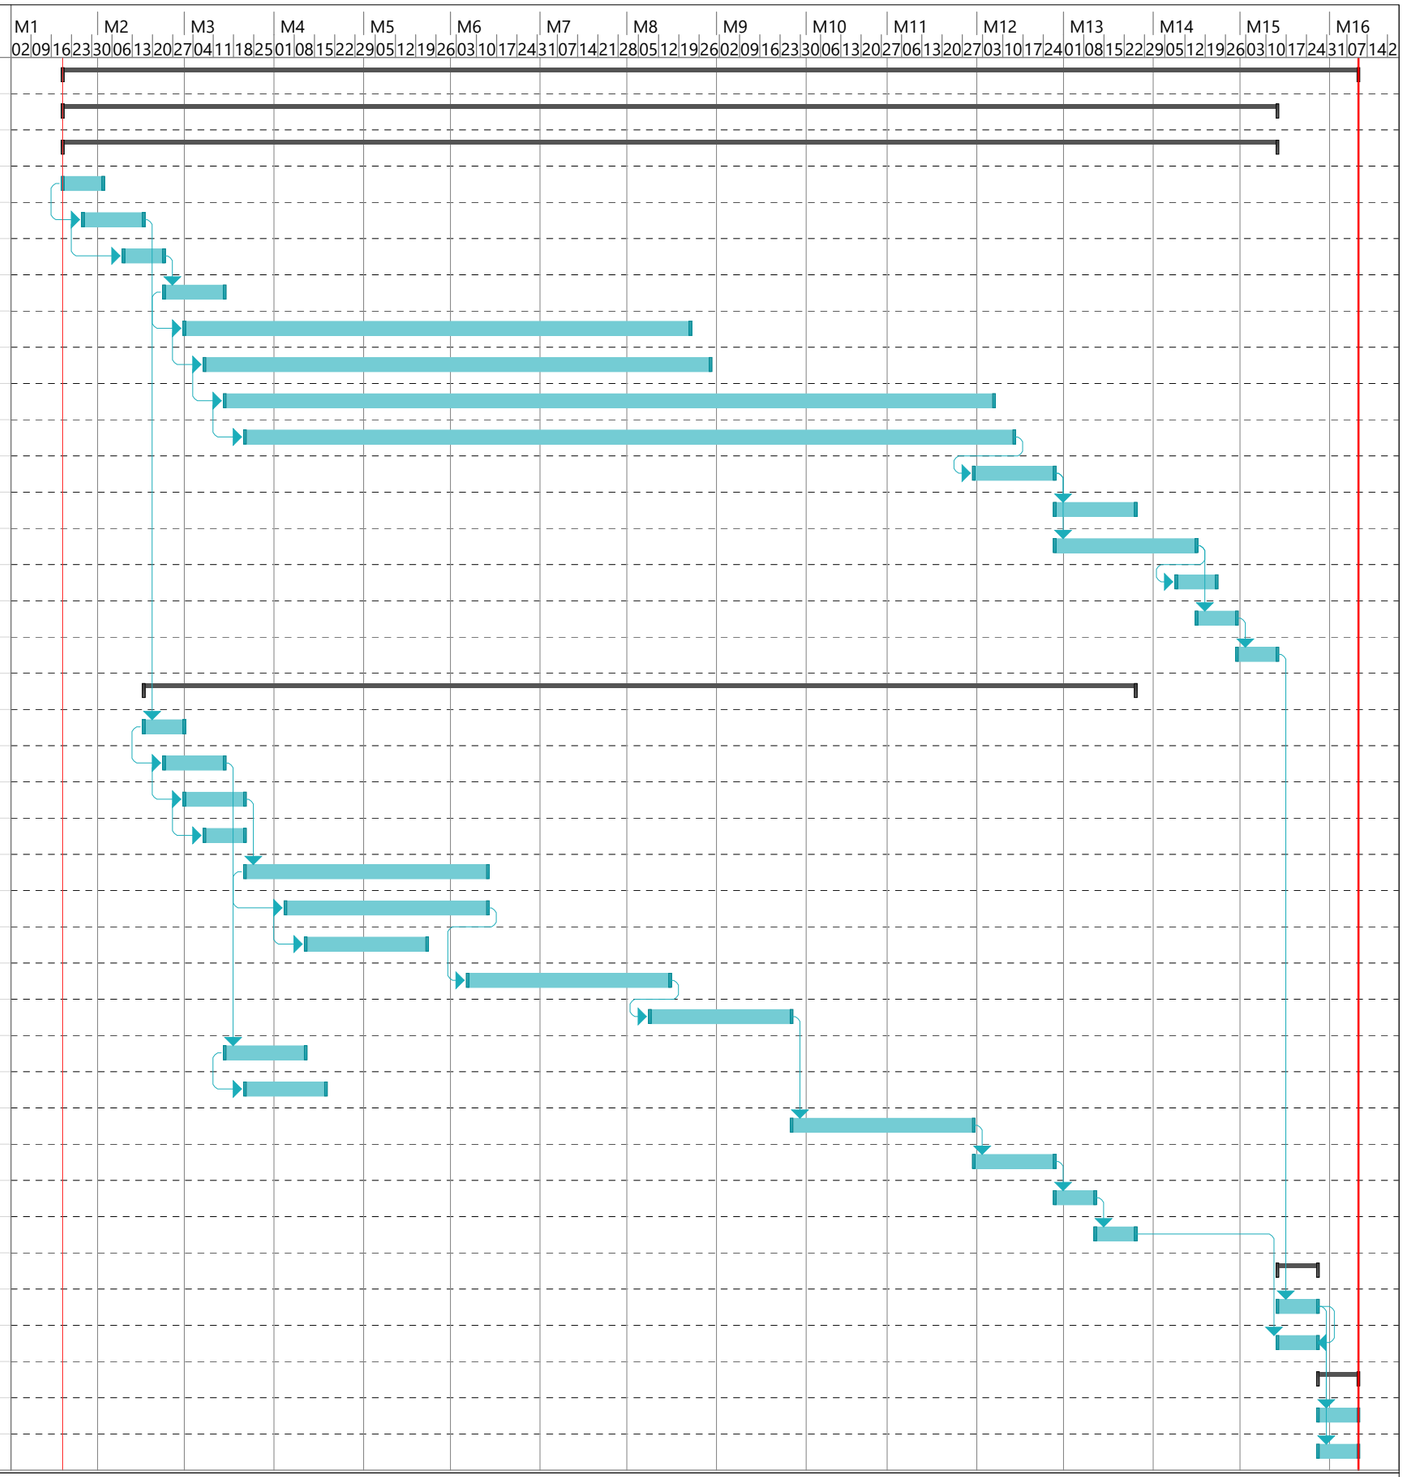

Cronoprogramma Realizzazione

Attività		Riepilogo progetto		Attività manuale		Solo inizio		Scadenza	
Divisione		Attività inattiva		Solo-durata		Solo-fine		Avanzamento	
Cardine		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Attività esterne		Avanzamento manuale	
Riepilogo		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Cardine esterno			
