Struttura Territoriale Marche
Via Isonzo, 15 - 60124 Ancona T [+39] 071 / 5091
Pec anas.marche@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)
Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 – C.F. 80208450587

S.S. 78 "SARNANO - AMANDOLA"

LAVORI DI ADEGUAMENTOE/O MIGLIORAMENTO TECNICO FUNZIONALE DELLA SEZIONE STRADALE IN T.S. E POTENZIAMENTO DELLE INTERSEZIONI - 1° STRALCIO

PROGETTO DEFINITIVO

IMPRESA ESECUTRICE

bruno teodoro

GRUPPO DI LAVORO ANAS

PROGETTAZIONE

Ingegneria del Territorio s.r.l.

TECH PROJECT ingegneria integrata ®

Deerns

RESPONSABILE DEI LAVORI

IL PROGETTISTA

Ing. Valerio BAJETTI
Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma n°A26211
(Diretto tecnico Ingegneria del Territorio)

BAJETTI VALERIO
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
Ingegnere
07.04.2023 09:52:50 GMT+00:00

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Ing. Fabrizio BAJETTI
Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma n°10112
(Diretto tecnico Ingegneria del Territorio)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Marco MANCINA

PROTOCOLLO	DATA

N. ELAB.

M002

CAPITOLO M - CANTIERIZZAZIONE

M0 - CANTIERIZZAZIONE

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO: D2201	M002 - T00CA00CANCR01_A.dwg		
	CODICE ELAB.: T00CA00CANCR01	A	--------

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
D					
C					
B					
A	**PRIMA EMISSIONE**	**MARZO 2022**	**ING. VALERIO BAJETTI**	**ING. GIANCARLO TANZI**	**ING. VALERIO BAJETTI**

ID	Nome attività	Durata
1	**1° Stralcio, lungo la S.S. n. 78 "Picena"; lotto 2 "Sarnano - Amandola"**	**1050 g**
2	**Attività preliminari e propedeutiche (non oggetto di appalto progettazione e lavori)**	**180 g**
3	Espropri ed occupazioni temporanee	180 g
4	Bonifiche Ordigni Bellici	180 g
5	Risoluzione interferenze	180 g
6	**Durata appalto**	**1050 g**
7	Durata dell' appalto	1050 g
8	**Redazione ed approvazione progetto definitivo**	**56 g**
9	Redazione ed approvazione progetto definitivo	56 g
10	**Redazione ed approvazione progetto esecutivo**	**96 g**
11	Redazione ed approvazione progetto esecutivo	96 g
12	**Consegna dei lavori**	**1050 g**
13	Consegna dei lavori	1 g
14	Monitoraggi ambientali ante operam ed in corso opera	1050 g
15	**ESECUZIONE DEI LAVORI**	**898 g**
16	Esecuzione dei lavori (compresi 86 gg di andamento stagionale sfavorevole)	898 g
17	Allestimento cantieri base	90 g
18	Realizzazione accessi e piste di cantiere	120 g
19	Perfezionamento attività di espropri ed occupazione temporanea	180 g
20	**Tratto 1**	**736 g**
21	Asse principale e viabilità secondaria - movimenti terra	180 g
22	Asse principale e viabilità secondaria - sovrastruttura stradale	360 g
23	Asse principale e viabilità secondaria - pavimentazioni e finiture	388 g
24	**Tratto 2**	**788 g**
25	Asse principale e viabilità secondaria - movimenti terra	180 g
26	Asse principale e viabilità secondaria - sovrastruttura stradale	360 g
27	Asse principale e viabilità secondaria - pavimentazioni e finiture	388 g
28	**Tratto 3**	**788 g**
29	Asse principale e viabilità secondaria - movimenti terra	180 g
30	Asse principale e viabilità secondaria - sovrastruttura stradale	360 g
31	Asse principale e viabilità secondaria - pavimentazioni e finiture	388 g
32	**Opere d' arte maggiori**	**392 g**
33	Viadotto 1 - Tratto 2 - scavi, fondazioni	150 g
34	Viadotto 1 - Tratto 2 - elevazioni	180 g
35	Viadotto 1 - Tratto 2 - impalcato e finiture	240 g
36	Viadotto 2 - Tratto 2 - scavi, fondazioni	120 g
37	Viadotto 2 - Tratto 2 - elevazioni	150 g
38	Viadotto 2 - Tratto 2 - impalcato e finiture	210 g
39	**Opere d' arte minori**	**193 g**
40	OS 01 - Paratia SX su Tratto 2 - da progr. 0+355 a progr. 0+435	180 g
41	OS 02 - Paratia SX su Tratto 2 - da progr. 0+935 a progr. 1+993	150 g
42	OS 03 - Paratia SX su Tratto 2 - da progr. 1+100 a progr. 1+170	150 g
43	OS 04 - Muro di sostegno DX su V04	180 g
44	OS 05 - Muro di sostegno SX su V08	150 g
45	OS 06 - Muro di sostegno SX su V08	120 g
46	TM 01 - Tombino 1 su VS02	90 g
47	**Opere di mitigazione ambientale**	**383 g**
48	Opere di mitigazione ambientale	383 g
49	**Dismissione cantiere - ripristini**	**383 g**
50	Dismissione del cantiere e ripristini	383 g

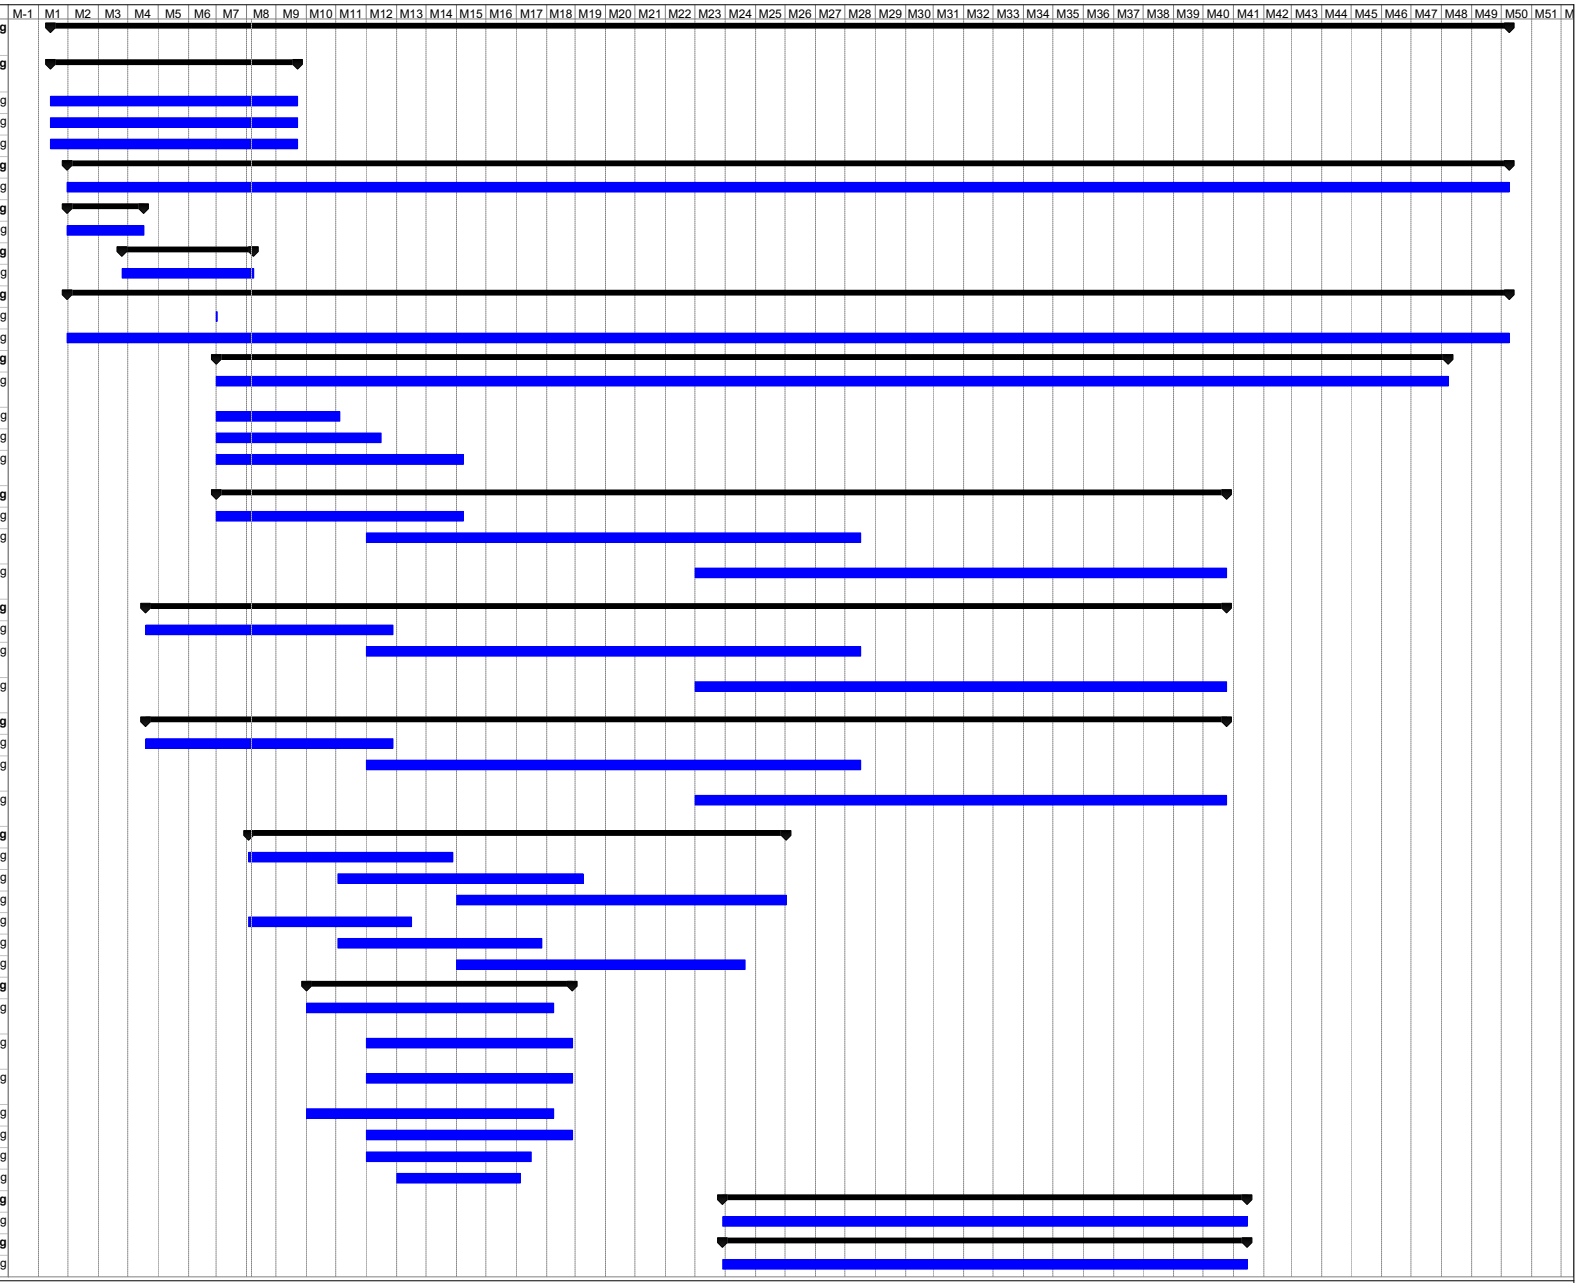

Progetto: PNRR - Lotto 1 - 13-09-202
Data: gio 06/04/23

Attività · Divisione · Cardine · Riepilogo · Riepilogo progetto · Attività esterne · Cardine esterno · Cardine inattiva · Riepilogo inattiva · Attività manuale · Solo-durata · Riporto riepilogo manuale · Riepilogo manuale · Solo inizio · Solo-fine · Attività esterne · Cardine esterno · Avanzamento · Scadenza
