ADEGUAMENTO STATICO ED IDRAULICO DELLA DIGA DI CASSIGLIO
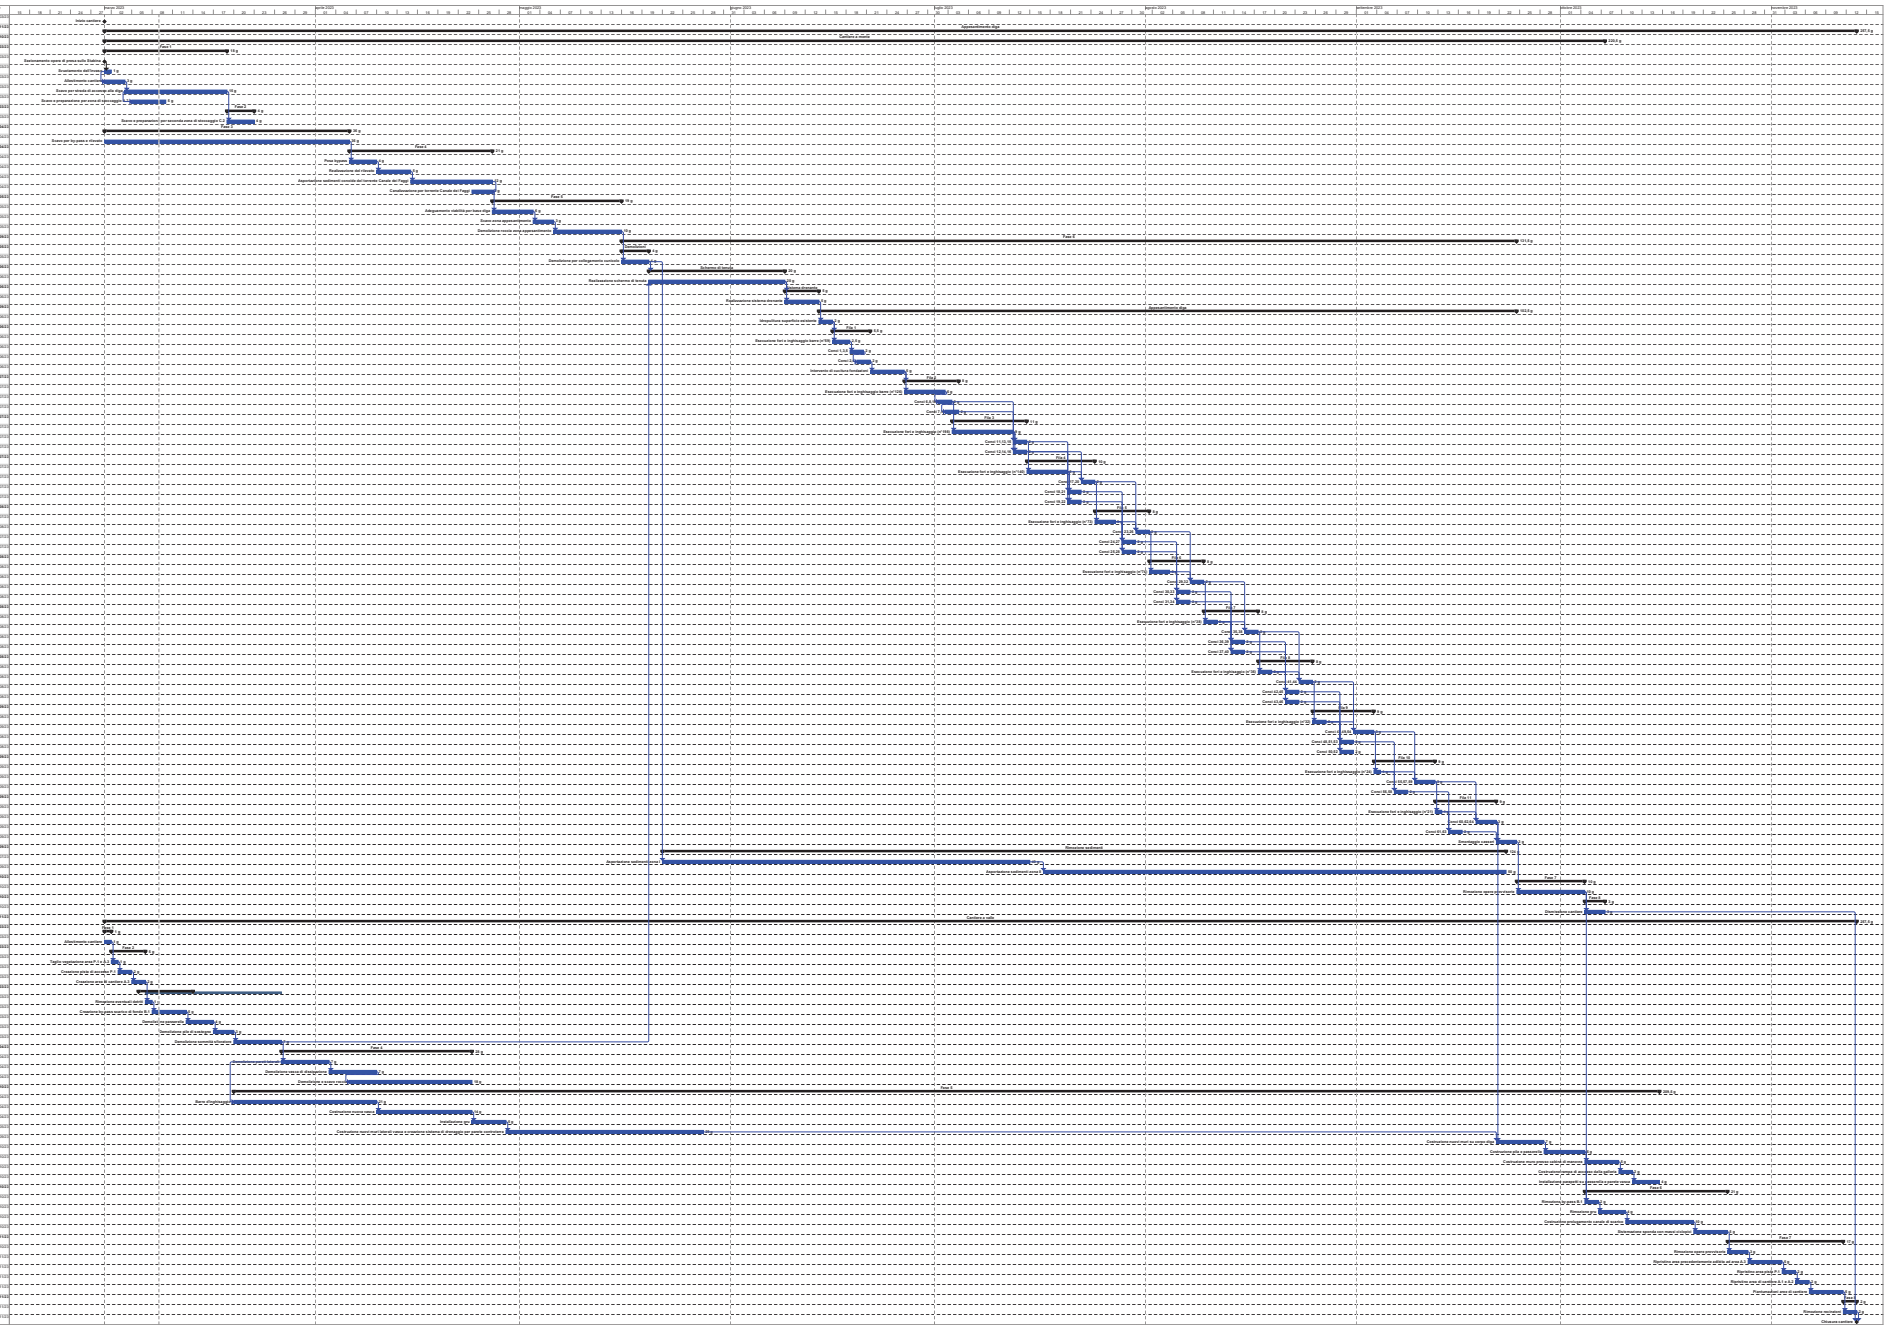
ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine
1	Inizio cantiere	0 g	ven 01/05/20	ven 01/05/20
2	**Approvvigionamento diga**	**207,0 g**	**ven 01/05/20**	**lun 15/11/21**
3	**Cantiere a monte**	**235,0 g**	**ven 01/05/20**	**sab 27/11/21**
4	**Fase 1**	**10 g**	**ven 01/05/20**	**sab 16/05/20**
5	Sistemazione opere di presa sulla Diabine	0 g	ven 01/05/20	ven 01/05/20
6	Sradicamento dell'incolto	1 g	ven 01/05/20	ven 01/05/20
7	Abbattimento cantiere	3 g	ven 01/05/20	sen 03/05/20
8	Scavo per strada di accesso alla diga	10 g	sab 02/05/20	sab 16/05/20
9	Scavo e preparazione per sonda di sbarraggio A-3	5 g	lun 11/05/20	gio 16/05/20
10	**Fase 2**	**4 g**	**dom 19/05/20**	**ven 22/05/20**
11	Scavo e preparazione per sonda zona di sbarraggio C-2	4 g	dom 19/05/20	ven 22/05/20
12	**Fase 3**	**36 g**	**ven 01/05/20**	**mer 03/06/20**
13	Scavo per by pass e clinale	36 g	ven 01/05/20	mer 03/06/20
14	**Fase 4**	**21 g**	**gio 05/06/20**	**ven 26/06/20**
15	Prova bypass	4 g	gio 05/06/20	dom 08/06/20
16	Realizzazione del clinale	5 g	lun 15/06/20	ven 19/06/20
17	Asportazione sedimenti sovralle dal torrente Canale del Faggi	12 g	sab 13/06/20	mer 26/06/20
18	Canalizzazione per torrente Canale del Faggi	3 g	lun 24/06/20	mer 26/06/20
19	**Fase 5**	**19 g**	**gio 27/04/20**	**lun 18/05/20**
20	Adeguamento stabilità per base diga	8 g	gio 27/04/20	ven 05/05/20
21	Scavo zona appoggiimento	3 g	mer 03/05/20	sen 05/05/20
22	Demolizione nuova zona appoggiimento	10 g	sab 09/05/20	lun 18/05/20
23	**Fase 6**	**131,0 g**	**mer 13/05/20**	**ven 24/09/20**
24	**Demolizioni**	**4 g**	**mer 13/05/20**	**ven 18/05/20**
25	Demolizione per collegamento cunicolo	4 g	mer 13/05/20	sen 16/05/20
26	**Schema di tenuta**	**20 g**	**sab 20/06/20**	**gio 09/09/20**
27	Realizzazione scherma di tenuta	20 g	sab 20/06/20	gio 09/09/20
28	**Sistema drenante**	**9 g**	**ven 05/06/20**	**mer 15/06/20**
29	Realizzazione sistema drenante	9 g	ven 05/06/20	mer 15/06/20
30	**Appoggiimento diga**	**102,0 g**	**mer 13/06/20**	**ven 24/09/20**
31	Idropulitura superficie esistente	2 g	ven 13/06/20	gio 18/06/20
32	**Fila 1**	**6,0 g**	**ven 19/06/20**	**mer 21/06/20**
33	Eseguiamo fori in inghiaggio barre (n°68)	2,0 g	ven 19/06/20	dom 28/06/20
34	Conci 1,3,5	2 g	ven 19/06/20	mer 21/06/20
35	Conci 2,4	2 g	ven 19/06/20	mer 21/06/20
36	Intervento di cucitura fondazioni	3 g	ven 21/06/20	lun 26/06/20
37	**Fila 2**	**8 g**	**lun 29/06/20**	**ven 03/07/20**
38	Eseguiamo fori in inghiaggio barre (n°104)	8 g	lun 29/06/20	dom 05/07/20
39	Conci 6,8,10	2 g	sab 01/07/20	lun 03/07/20
40	Conci 7,9	2 g	dom 02/07/20	ven 03/07/20
41	**Fila 3**	**11 g**	**lun 03/07/20**	**ven 10/07/20**
42	Eseguiamo fori in inghiaggio (n°168)	9 g	lun 03/07/20	mer 12/07/20
43	Conci 11,13,15	2 g	mer 12/07/20	ven 14/07/20
44	Conci 12,14,16	2 g	mer 12/07/20	ven 14/07/20
45	**Fila 4**	**10 g**	**ven 14/07/20**	**lun 24/07/20**
46	Eseguiamo fori in inghiaggio (n°140)	8 g	ven 14/07/20	gio 23/07/20
47	Conci 17,20	2 g	sab 23/07/20	lun 24/07/20
48	Conci 18,21	2 g	gio 23/07/20	sab 25/07/20
49	Conci 19,22	2 g	gio 23/07/20	sab 25/07/20
50	**Fila 5**	**9 g**	**lun 24/07/20**	**mer 31/08/20**
51	Eseguiamo fori in inghiaggio (n°70)	3 g	lun 24/07/20	gio 27/08/20
52	Conci 23,26	2 g	dom 26/07/20	mer 31/08/20
53	Conci 24,27	2 g	dom 26/07/20	dom 30/07/20
54	Conci 25,28	2 g	dom 26/07/20	dom 30/07/20
55	**Fila 6**	**8 g**	**mer 31/08/20**	**ven 08/09/20**
56	Eseguiamo fori in inghiaggio (n°70)	3 g	mer 31/08/20	sen 05/09/20
57	Conci 29,32	2 g	lun 07/09/20	ven 08/09/20
58	Conci 30,33	2 g	sab 05/09/20	lun 07/09/20
59	Conci 31,34	2 g	sab 05/09/20	lun 07/09/20
60	**Fila 7**	**8 g**	**ven 08/09/20**	**gio 17/09/20**
61	Eseguiamo fori in inghiaggio (n°38)	2 g	ven 08/09/20	sen 11/09/20
62	Conci 36,38	2 g	ven 10/09/20	gio 17/09/20
63	Conci 36,39	2 g	dom 13/09/20	mer 16/09/20
64	Conci 37,40	2 g	dom 13/09/20	mer 16/09/20
65	**Fila 8**	**8 g**	**gio 17/09/20**	**ven 25/09/20**
66	Eseguiamo fori in inghiaggio (n°38)	2 g	gio 17/09/20	sab 19/09/20
67	Conci 41,44	2 g	ven 23/09/20	sen 26/09/20
68	Conci 42,45	2 g	lun 21/09/20	mer 23/09/20
69	Conci 43,46	2 g	lun 21/09/20	mer 23/09/20
70	**Fila 9**	**9 g**	**ven 25/09/20**	**dom 27/09/20**
71	Eseguiamo fori in inghiaggio (n°50)	2 g	ven 25/09/20	dom 27/09/20
72	Conci 47,50,52	3 g	gio 27/09/20	dom 30/09/20
73	Conci 48,51,53	3 g	ven 25/09/20	gio 01/09/20
74	Conci 50,52	2 g	ven 25/09/20	gio 01/09/20
75	**Fila 10**	**9 g**	**dom 03/09/20**	**mer 12/09/20**
76	Eseguiamo fori in inghiaggio (n°24)	1 g	dom 03/09/20	lun 03/09/20
77	Conci 55,57,59	3 g	sab 05/09/20	mer 12/09/20
78	Conci 56,58	2 g	sab 05/09/20	sen 08/09/20
79	**Fila 11**	**9 g**	**lun 12/09/20**	**gio 21/09/20**
80	Eseguiamo fori in inghiaggio (n°31)	1 g	lun 12/09/20	mar 15/09/20
81	Conci 60,62,63	3 g	lun 19/09/20	gio 21/09/20
82	Conci 61,63	2 g	gio 14/09/20	sab 16/09/20
83	Smontaggio casseri	3 g	gio 21/09/20	dom 24/09/20
84	**Rimozione sedimenti**	**124 g**	**lun 22/06/20**	**ven 23/09/21**
85	Asportazione sedimenti zona I	60 g	lun 22/06/20	sen 19/09/20
86	Asportazione sedimenti zona II	90 g	lun 17/07/20	ven 23/09/21
87	**Fase 7**	**10 g**	**dom 24/09/20**	**mer 28/10/20**
88	Rimozione opere provvisorie	10 g	dom 24/09/20	mer 28/10/20
89	**Fase 8**	**3 g**	**ven 23/10/20**	**sab 27/10/20**
90	Dismissione cantiere	3 g	ven 23/10/20	sab 27/10/20
91	**Cantiere a valle**	**207,0 g**	**mer 01/05/20**	**lun 15/11/21**
92	**Fase 1**	**1 g**	**ven 01/05/20**	**ven 01/05/20**
93	Abbattimento cantiere	1 g	ven 01/05/20	ven 01/05/20
94	**Fase 2**	**8 g**	**gio 05/05/20**	**lun 18/05/20**
95	Taglio vegetazione aree P.1 e A.3	1 g	gio 05/05/20	gio 05/05/20
96	Creazione pista di accesso P.1	2 g	ven 05/05/20	sab 06/05/20
97	Creazione area di cantiere A.3	2 g	dom 08/05/20	lun 09/05/20
98	**Fase 3**	**8 g**	**lun 09/05/20**	**lun 18/05/20**
99	Rimozione eventuali detriti	1 g	mer 07/05/20	mar 07/05/20
100	Creazione by pass scarico di fondo B.1	5 g	lun 09/05/20	dom 13/05/20
101	Demolizione paraevolta	4 g	lun 13/05/20	gio 16/05/20
102	Demolizione pile di sostegno	3 g	ven 17/05/20	dom 19/05/20
103	Demolizione sommità sfioratore	7 g	lun 20/05/20	dom 26/05/20
104	**Fase 4**	**20 g**	**lun 27/05/20**	**dom 28/06/20**
105	Demolizione pareti laterali	7 g	lun 27/05/20	dom 02/06/20
106	Demolizione vasca di dissipazione	7 g	lun 03/06/20	dom 09/06/20
107	Demolizione e tratto intonaco	16 g	gio 09/06/20	dom 28/06/20
108	**Fase 5**	**208,0 g**	**lun 29/06/20**	**dom 18/10/20**
109	Barre d'inghiaggio	21 g	lun 29/06/20	dom 26/06/20
110	Costruzione nuova vasca	16 g	lun 13/06/20	dom 23/06/20
111	Installazione gru	5 g	ven 24/06/20	ven 26/06/20
112	Costruzione nuovi muri laterali vasca e creazione sistema di drenaggio per parete sovrallzata	28 g	sab 28/06/20	sab 27/08/20
113	Costruzione nuovi muri su corpo diga	7 g	gio 27/08/20	gio 28/08/20
114	Costruzione pila e paraevolta	6 g	gio 28/08/20	ven 05/09/20
115	Costruzione nuova protezione calotte di marmore	5 g	ven 05/09/20	lun 08/10/20
116	Costruzione cempa di accesso dalla galleria	2 g	lun 08/10/20	mer 11/10/20
117	Installazione passaporti su paraevolta e parete vasca	4 g	mer 11/10/20	dom 15/10/20
118	**Fase 6**	**31 g**	**mer 04/10/20**	**mer 28/10/20**
119	Rimozione by-pass B. 1	2 g	mer 04/10/20	sen 06/10/20
120	Rimozione gru	4 g	ven 08/10/20	mar 15/10/20
121	Costruzione polygonometro canale di scarico	10 g	mer 15/10/20	dom 25/10/20
122	Esecuzione ripresa con mezzi cingolati	5 g	ven 20/10/20	mer 25/10/20
123	**Fase 7**	**17 g**	**ven 23/10/20**	**sab 15/11/20**
124	Rimozione opere provvisorie	3 g	ven 23/10/20	sab 28/10/20
125	Ripristino area precedentemente adibita ad area A.3	5 g	sab 28/10/20	gio 02/11/20
126	Ripristino area pista P.1	2 g	gio 02/11/20	sab 04/11/20
127	Ripristino area di cantiere A.1 e A.2	2 g	sab 04/11/20	lun 06/11/20
128	Piantumazioni aree di cantiere	3 g	lun 06/11/20	sab 11/11/20
129	**Fase 8**	**3 g**	**sab 11/11/20**	**lun 13/11/20**
130	Rimozione recinzioni	2 g	sab 11/11/20	lun 13/11/20
131	Chiusura cantiere	0 g	lun 13/11/20	lun 13/11/20
