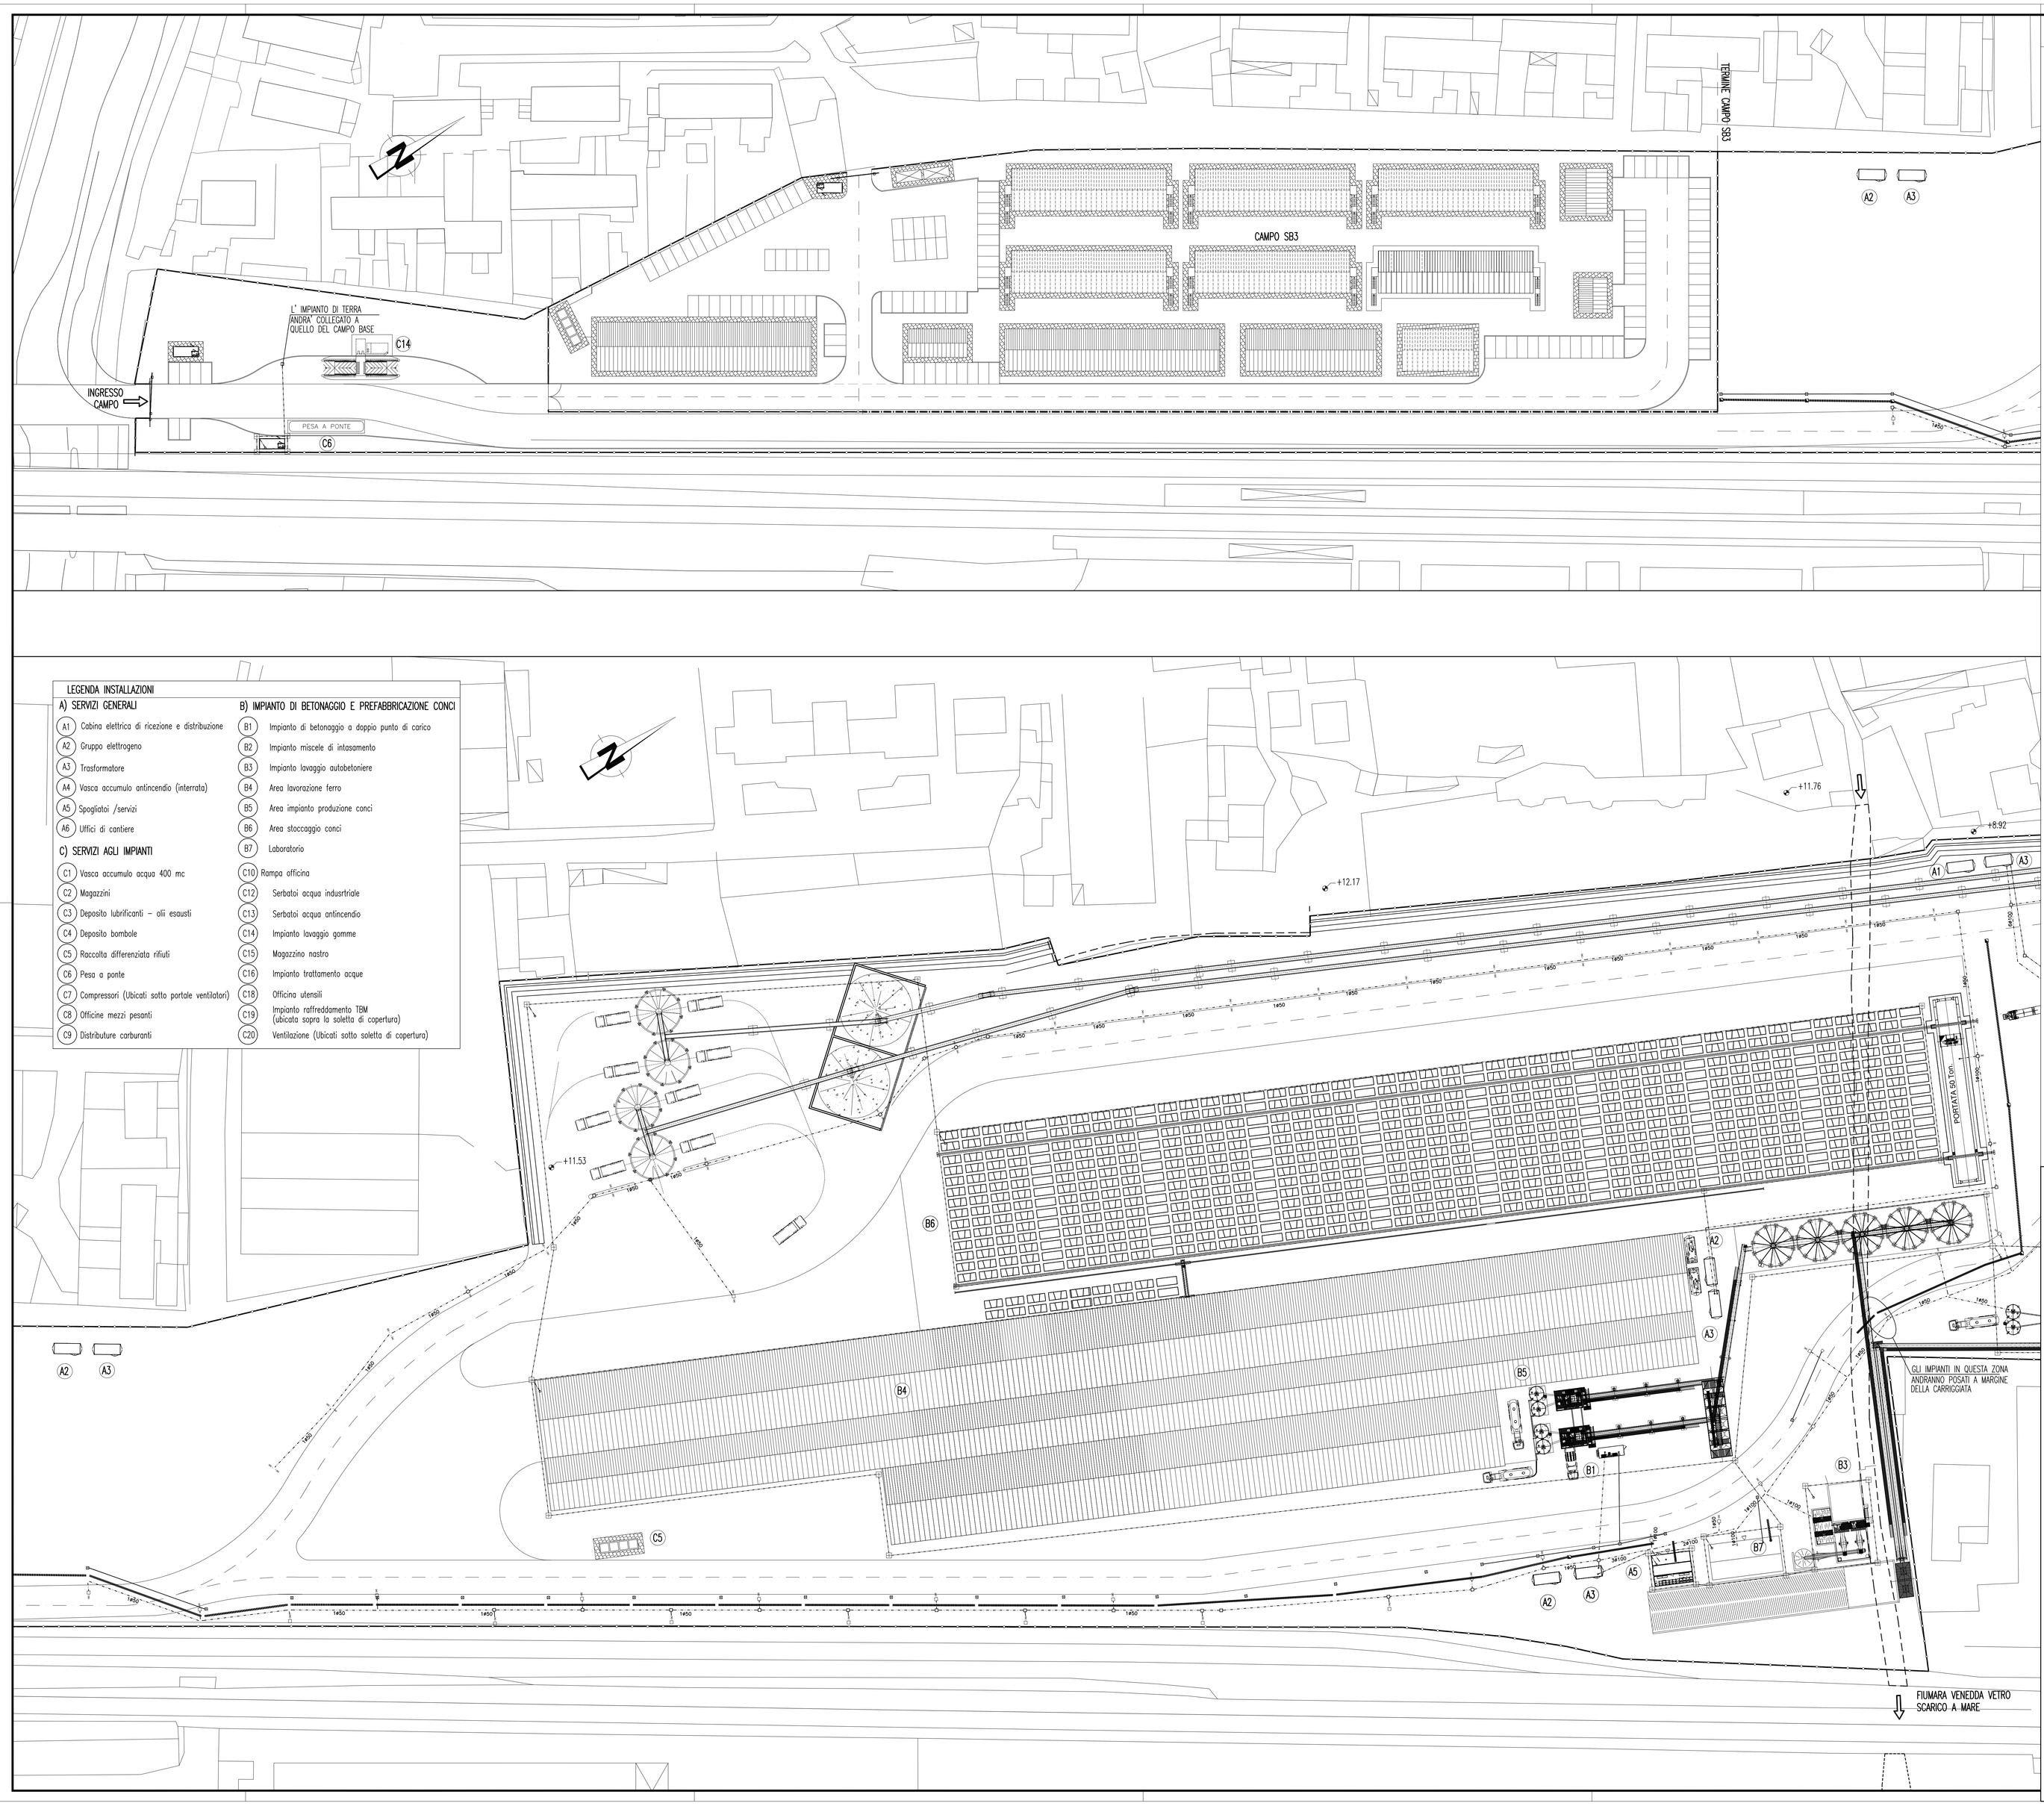

LEGENDA INSTALLAZIONI

A) SERVIZI GENERALI

- (A1) Cabina elettrica di ricezione e distribuzione
- (A2) Gruppo elettrogeno
- (A3) Trasformatore
- (A4) Vasca accumulo antincendio (interrata)
- (A5) Spogliatoi /servizi
- (A6) Uffici di cantiere

C) SERVIZI AGLI IMPIANTI

- (C1) Vasca accumulo acqua 400 mc
- (C2) Magazzini
- (C3) Deposito lubrificanti – olii esausti
- (C4) Deposito bombole
- (C5) Raccolta differenziata rifiuti
- (C6) Pesa a ponte
- (C7) Compressori (Ubicati sotto portale ventilatori)
- (C8) Officine mezzi pesanti
- (C9) Distributure carburanti

B) IMPIANTO DI BETONAGGIO E PREFABBRICAZIONE CONCI

- (B1) Impianto di betonaggio a doppio punto di carico
- (B2) Impianto miscele di intasamento
- (B3) Impianto lavaggio autobetoniere
- (B4) Area lavorazione ferro
- (B5) Area impianto produzione conci
- (B6) Area stoccaggio conci
- (B7) Laboratorio
- (C10) Rampa officina
- (C12) Serbatoi acqua industrtriale
- (C13) Serbatoi acqua antincendio
- (C14) Impianto lavaggio gomme
- (C15) Magazzino nastro
- (C16) Impianto trattamento acque
- (C18) Officina utensili
- (C19) Impianto raffreddamento TBM (ubicata sopra la soletta di copertura)
- (C20) Ventilazione (Ubicati sotto soletta di copertura)

NOTE GENERALI

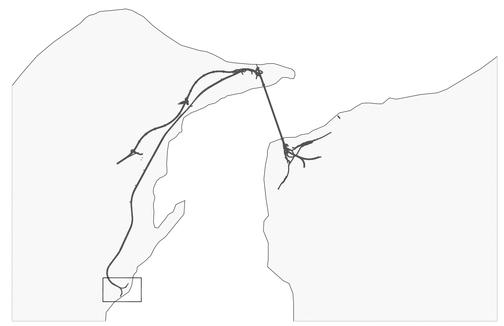

LEGENDA

IMPIANTO ELETTRICO

- Forza motrice m.t./b.t. tubazione in pvc
- Allacciamento forza motrice
- Pozzetto di ispezione: – 60x60 o 40x40 in calcestruzzo carrabili – 25x25 in PVC a ridosso dei fabbricati

IMPIANTO ILLUMINAZIONE

- Armatura stradale con lampada SAP150W
- Lampada a Tubi Fluorescenti 1x18W gruppo ausiliario incorporato fissaggio a parete o su palo (per illuminazione di sicurezza)
- Plafoniera con lampada fluorescente FLC2x18W fissaggio a parete (alimentazione da circuito interno baracca)
- Pozzetto di ispezione in calcestruzzo con chiusino carrabile in ghisa sferoidale
- Proiettore a parete con lampada SAP 400 W
- Lampioncini h = 1.2 m con lampada SAP 70W
- Torre faro H 30mt 12 x SAP 400W

MESSA A TERRA

- Treccia di messa a terra (prevedere n.2 puntazze per ogni prefabbricato)
- Allacciamento messa a terra
- Pozzetti con dispersore in Acciaio Zincato a Croce 50x50x5mm Lunghezza 1,5m
- Pozzetto di ispezione in calcestruzzo con chiusino carrabile in ghisa sferoidale

IMPIANTO TELEFONICO

- Allacciamento pubblica utenza telefonica
- Rete telefonica – 2 TUBI PVC ø125mm
- Pozzetto telefonia
- Cabina telefonica
- Armadietto telefonia 200x100 cm

IMPIANTO TV

- Allacciamento rete tv
- Rete tv – 2 TUBI PVC ø125mm
- Pozzetto rete tv

NOTA:
PER I DATI DI DETTAGLIO RELATIVI AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI VEDI RELAZIONE DESCRITTIVA DELL'OPERA RIF. ELAB. CG2600PRODSCZC3C059000001A

Stretto di Messina

Concessionaria per la progettazione, realizzazione e gestione del collegamento stabile tra la Sicilia e il Continente
Organismo di Diritto pubblico
(Legge n° 1158 del 17 dicembre 1971, modificata dal D.Lgs. n° 114 del 24 aprile 2002)

EurolinK

PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA

PROGETTO DEFINITIVO

EUROLINK S.C.p.A.
IMPREGILO S.p.A. (Mandataria)
SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.p.A. (Mandante)
COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - C.M.C. di Ravenna Soc. Coop. a.r.l. (Mandante)
SACYR S.A.U. (Mandante)
ISHIKAWAJIMA - HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO. Ltd. (Mandante)
A.C.I. S.C.P.A. - CONSORZIO STABILE (Mandante)

IL PROGETTISTA	IL CONTRAENTE GENERALE	STRETTO DI MESSINA	STRETTO DI MESSINA
MB SERVICE s.r.l. Dott. Ing. M. Lacava Ordine Ingegneri Roma n° 10433 Dott. Ing. E. Pagani Ordine Ingegneri Milano n° 15408	Project Manager (Ing. P.P. Marchesell)	Direttore Generale e RUP Validazione (Ing. C. Fiammenghi)	Amministratore Delegato (Dott. P. Ciucci)

COLLEGAMENTI VERSANTE SICILIA

CZ0342_F0

CANTIERI
OPERATIVI – LOGISTICI
CANTIERI OPERATIVI – CO.59. – Contesse
SI6 – Planimetria Impianti e Attrezzature – Impianti elettrici Tav. 1 di 2

CODICE: C G 2 6 0 0 P P 8 D S C Z C 3 C O 5 9 0 0 0 0 0 5 F0 — SCALA: 1:500

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
F0	20-06-2011	EMISSIONE FINALE	MB SERVICE	MARCHESI	LACAVA

NOME DEL FILE: CZ0342_F0.dwg
