II°Tratto Operativo - Km 7+800 ----------> Km 12+ 700

Fase 0:

Opere provvisie
- Contatti con gli Enti e risoluzione delle interferenze
- Espropri ed immissioni in possesso
- Appresiamento aree di cantiere e viabilità provvisoria

Fase 1:

Viabilità in progetto
- Tronco 13 (sx) dal km 7+800 al km 8+660
- Tronco 14 (sx) dal km 8+660 al km 9+550
- Tronco 20 (sx) dal km 10+100 al km 10+150
- Tronco 21 (sx) dal km 10+875 al km 11+950
- Tronco 24 (sx) dal km 12+400 al km 12+675
- Tronco 25 (sx) dal km 12+675 al km 12+700
- Tronco 23 (dx) dal km 7+800 al km 9+450
- Tronco 26 (dx) dal km 10+000 al km 10+100
- Carreggiata al km 10+100
- Tronco 23-22 (dx) dal km 11+825 al km 12+600
- Tronco 29-27-28-29 (dx) dal km 12+400 al km 12+700
- Asse sx dal km 10+275 al km 11+950
- Tratto sud tronco 22 dal km 11+950 al km 12+300 al km 12+450

Opere d'arte da realizzare
- Ponte Serra V16 dx - 40,00 m
- Viadotto Favarella V02 sx - 132,00 m
- Viadotto Favarella V02 sx - 132,00 m
- Galleria naturale Papazzo GN01 dx - 740,00 m
- Galleria naturale Papazzo GN01 sx - 747,00 m
- Viadotto Fosso Mumia V03 dx - 40,00 m
- Viadotto Fosso Mumia V03 sx - 402,50 m
- Galleria artificiale San Cataldo GA02 dx - 157,00 m
- Galleria artificiale San Cataldo GA02 sx - 167,00 m
- Ponte Cavalcaferrovia Grotticelle VI17 dx - 45,00 m

Opere d'arte da demolire

Deviazione e canalizzazione del traffico
- Traffico sulla S.S. 640 esistente

Fase 2:

Viabilità in progetto
- Tronco 19 (sx) dal km 10+100 al km 10+175
- Tronco 22 (sx) dal km 11+950 al km 12+600
- Tronco 18 (dx) dal km 9+825 al km 10+325
- Tronco 30 (dx) dal km 12+225 al km 12+425
- Asse Sx dal km 7+800 al km 10+025 e dal km 11+950 al km 12+250
- Asse Dx dal km 7+800 al km 10+025 e dal km 11+950 al km 12+250

Opere d'arte da realizzare
- Ponte Inoncuspana Serra V16 sx - 29,00 m
- Galleria artificiale Favarella Sx - 285,00 m
- Galleria artificiale Favarella Dx - 238,00 m

Opere d'arte da demolire

Deviazione e canalizzazione del traffico
- Traffico sul Tronco 18 dal km 7+800 al km 9+450
- Traffico sulla S.P. 5 - Bivio S. Cataldo - S.S. 640 esist. e Bivio Serradifalco Caltanissetta Sud - S.S. 640 esist. dal km 9+450 al km 12+700

Fase 3:

Viabilità in progetto
- Completamento Tronco 24 dal km 10+025 al km 10+075
- Completamento Asse Dx dal km 10+025 al km 10+075
- Asse Sx dal km 12+250 al km 12+700
- Asse Dx dal km 12+450 al km 12+700

Opere d'arte da realizzare
- Ponte cavalcaferrovia Grotticelle VI17 sx - 45,00 m

Opere d'arte da demolire

Deviazione e canalizzazione del traffico
- Traffico sulla nuova S.S. 640 SxDx dal km 7+800 al km 9+550
- Traffico sulla S.S. 640 esist. - Bivio Serradifalco-Caltanissetta Sud e sulla S.S. 640 esistente dal km 9+450 al km 11+950
- Traffico sul tronco 22 dal km 11+950 al km 12+250
- Traffico sul tronco 27 dal km 12+250 al km 12+700

Fase 4:

Viabilità in progetto
- Completamento Tronco 22 da dal km 12+225 al km 12+325
- Completamento Asse Dx dal km 12+250 al km 12+350

Opere d'arte da realizzare

Opere d'arte da demolire

Deviazione e canalizzazione del traffico
- Traffico sulla nuova S.S. 640 SxDx dal km 7+800 al km 12+250
- Traffico sulla nuova S.S. 640 Sx dal km 12+250 al km 12+300
- Traffico sulla nuova S.S. 640 SxDx dal km 12+300 al km 12+700

Area di cantiere:	n°2	km 7+600	Svincolo Delia - Sommatino	Logistica
		km 9+650	Galleria Favarella	Operativa
		km 10+250	Galleria GN01	Operativa
		km 12+050	Galleria GN02/	Operativa
		km 12+650	Galleria GA02	Operativa
	n°3	km 12+400	Svincolo Caltanissetta Sud	Logistica
Aree estrattive:	Bifaria	Calcare	Comune di Caltanissetta	Distanza media 4,00 km dal km 7+800
	Rarella Cardè	Calcare	Comune di Caltanissetta	Distanza media 10,00 km dal km 7+800
Discariche inerti:	Grottarossa SEC		Comune di Caltanissetta	Distanza media 2,50 km dal km 0+000
	Turodili		Comune di Villarosa (En)	Distanza media 4,15 km dal km 24+000
	Trabonella		Comune di Caltanissetta	Distanza media 10,10 km dal km 23+000

Viabilità interna di cantiere: Area di sedime del nuovo tracciato

Viabilità alternativa: Dallo svincolo Caltanissetta alto svincolo Caltanissetta Sud (13 km): S.S. 122, S.P. 40, S.P. 5, S.S. 640
Dallo svincolo Caltanissetta Sud allo svincolo con la S.S. 626 (15,8 km) - S.S. 626

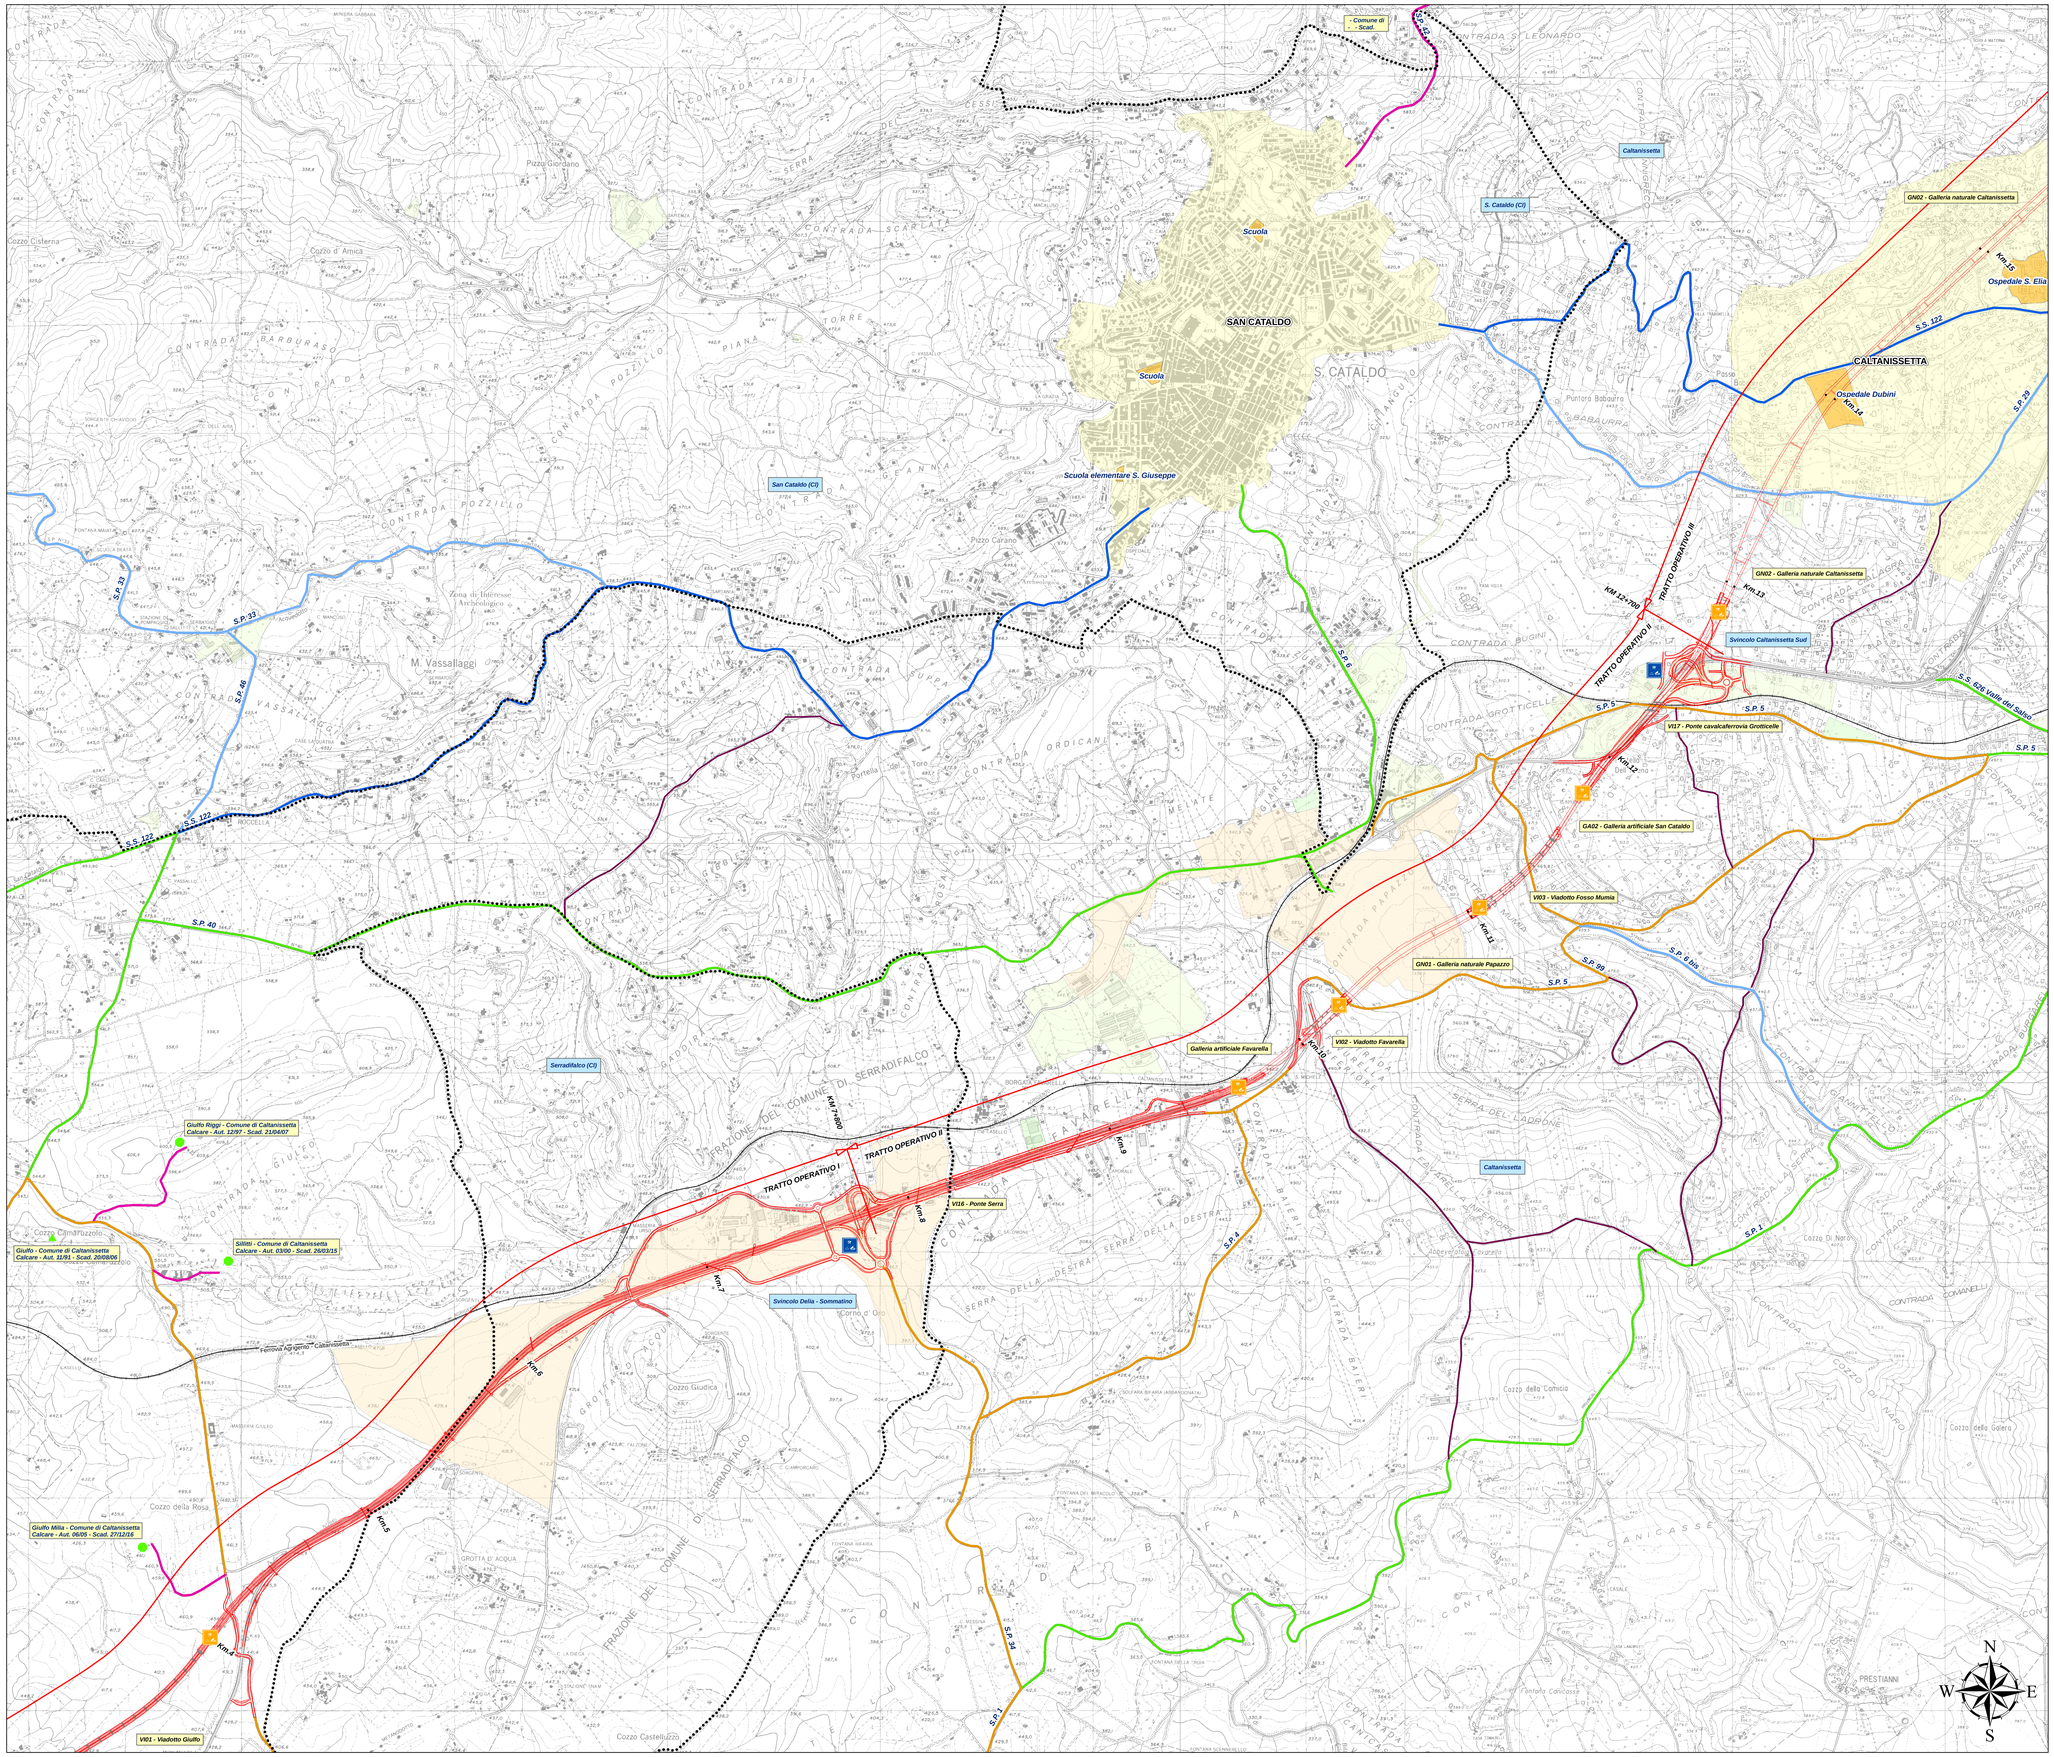
SAN CATALDO
S. CATALDO
CALTANISSETTA
Caltanissetta
Serradifalco (CJ)
San Cataldo (CJ)
S. Cataldo (CJ)
Scuola elementare S. Giuseppe
Ospedale S. Elia
Ospedale Dubini
Svincolo Caltanissetta Sud
Svincolo Delia - Sommatino
GN02 - Galleria naturale Caltanissetta
GA02 - Galleria artificiale San Cataldo
GN01 - Galleria naturale Papazzo
Galleria artificiale Favarella
VI03 - Viadotto Fosso Mumia
VI02 - Viadotto Favarella
VI17 - Ponte cavalcaferrovia Grotticelle
VI16 - Ponte Serra
VI01 - Viadotto Giulfo
Giulfo Riggi - Comune di Caltanissetta Calcare - Aut. 12/97 - Scad. 21/04/07
Giulfo - Comune di Caltanissetta Calcare - Aut. 11/91 - Scad. 20/08/00
Silitti - Comune di Caltanissetta Calcare - Aut. 03/00 - Scad. 26/03/15
Giulfo Milia - Comune di Caltanissetta Calcare - Aut. 06/05 - Scad. 27/12/16
TRATTO OPERATIVO I
TRATTO OPERATIVO II
TRATTO OPERATIVO III
KM 7+800
KM 12+700
Km 5
Km 6
Km 7
Km 8
Km 9
Km 10
Km 11
Km 12
Km 13
Km 14
Km 15
S.S. 122
S.P. 5
S.P. 1
S.P. 2
S.P. 33
S.P. 40
S.P. 46
S.P. 99
S.P. 29
S.P. 34
S.S. 626 Valle del Salso
Ferrovia Agrigento - Caltanissetta
Zona di Interesse Archeologico
M. Vassallaggi
Pizzo Giordano
Pizzo Carano
Cozzo Cisterna
Cozzo Cimarruzzolo
Cozzo della Rosa
Cozzo Giudica
Cozzo Castellazzo
Cozzo Di Naro
Cozzo della Galera
Cozzo del Camicia
Cozzo Di Napo
Cozzo Di Mezzo
Cozzo Di Mezzo
Cozzo Di Mezz
