PLANIMETRIA GENERALE 1:5000

APPRESTAMENTI AREA DI CANTIERE PLANIMETRIA 1:250

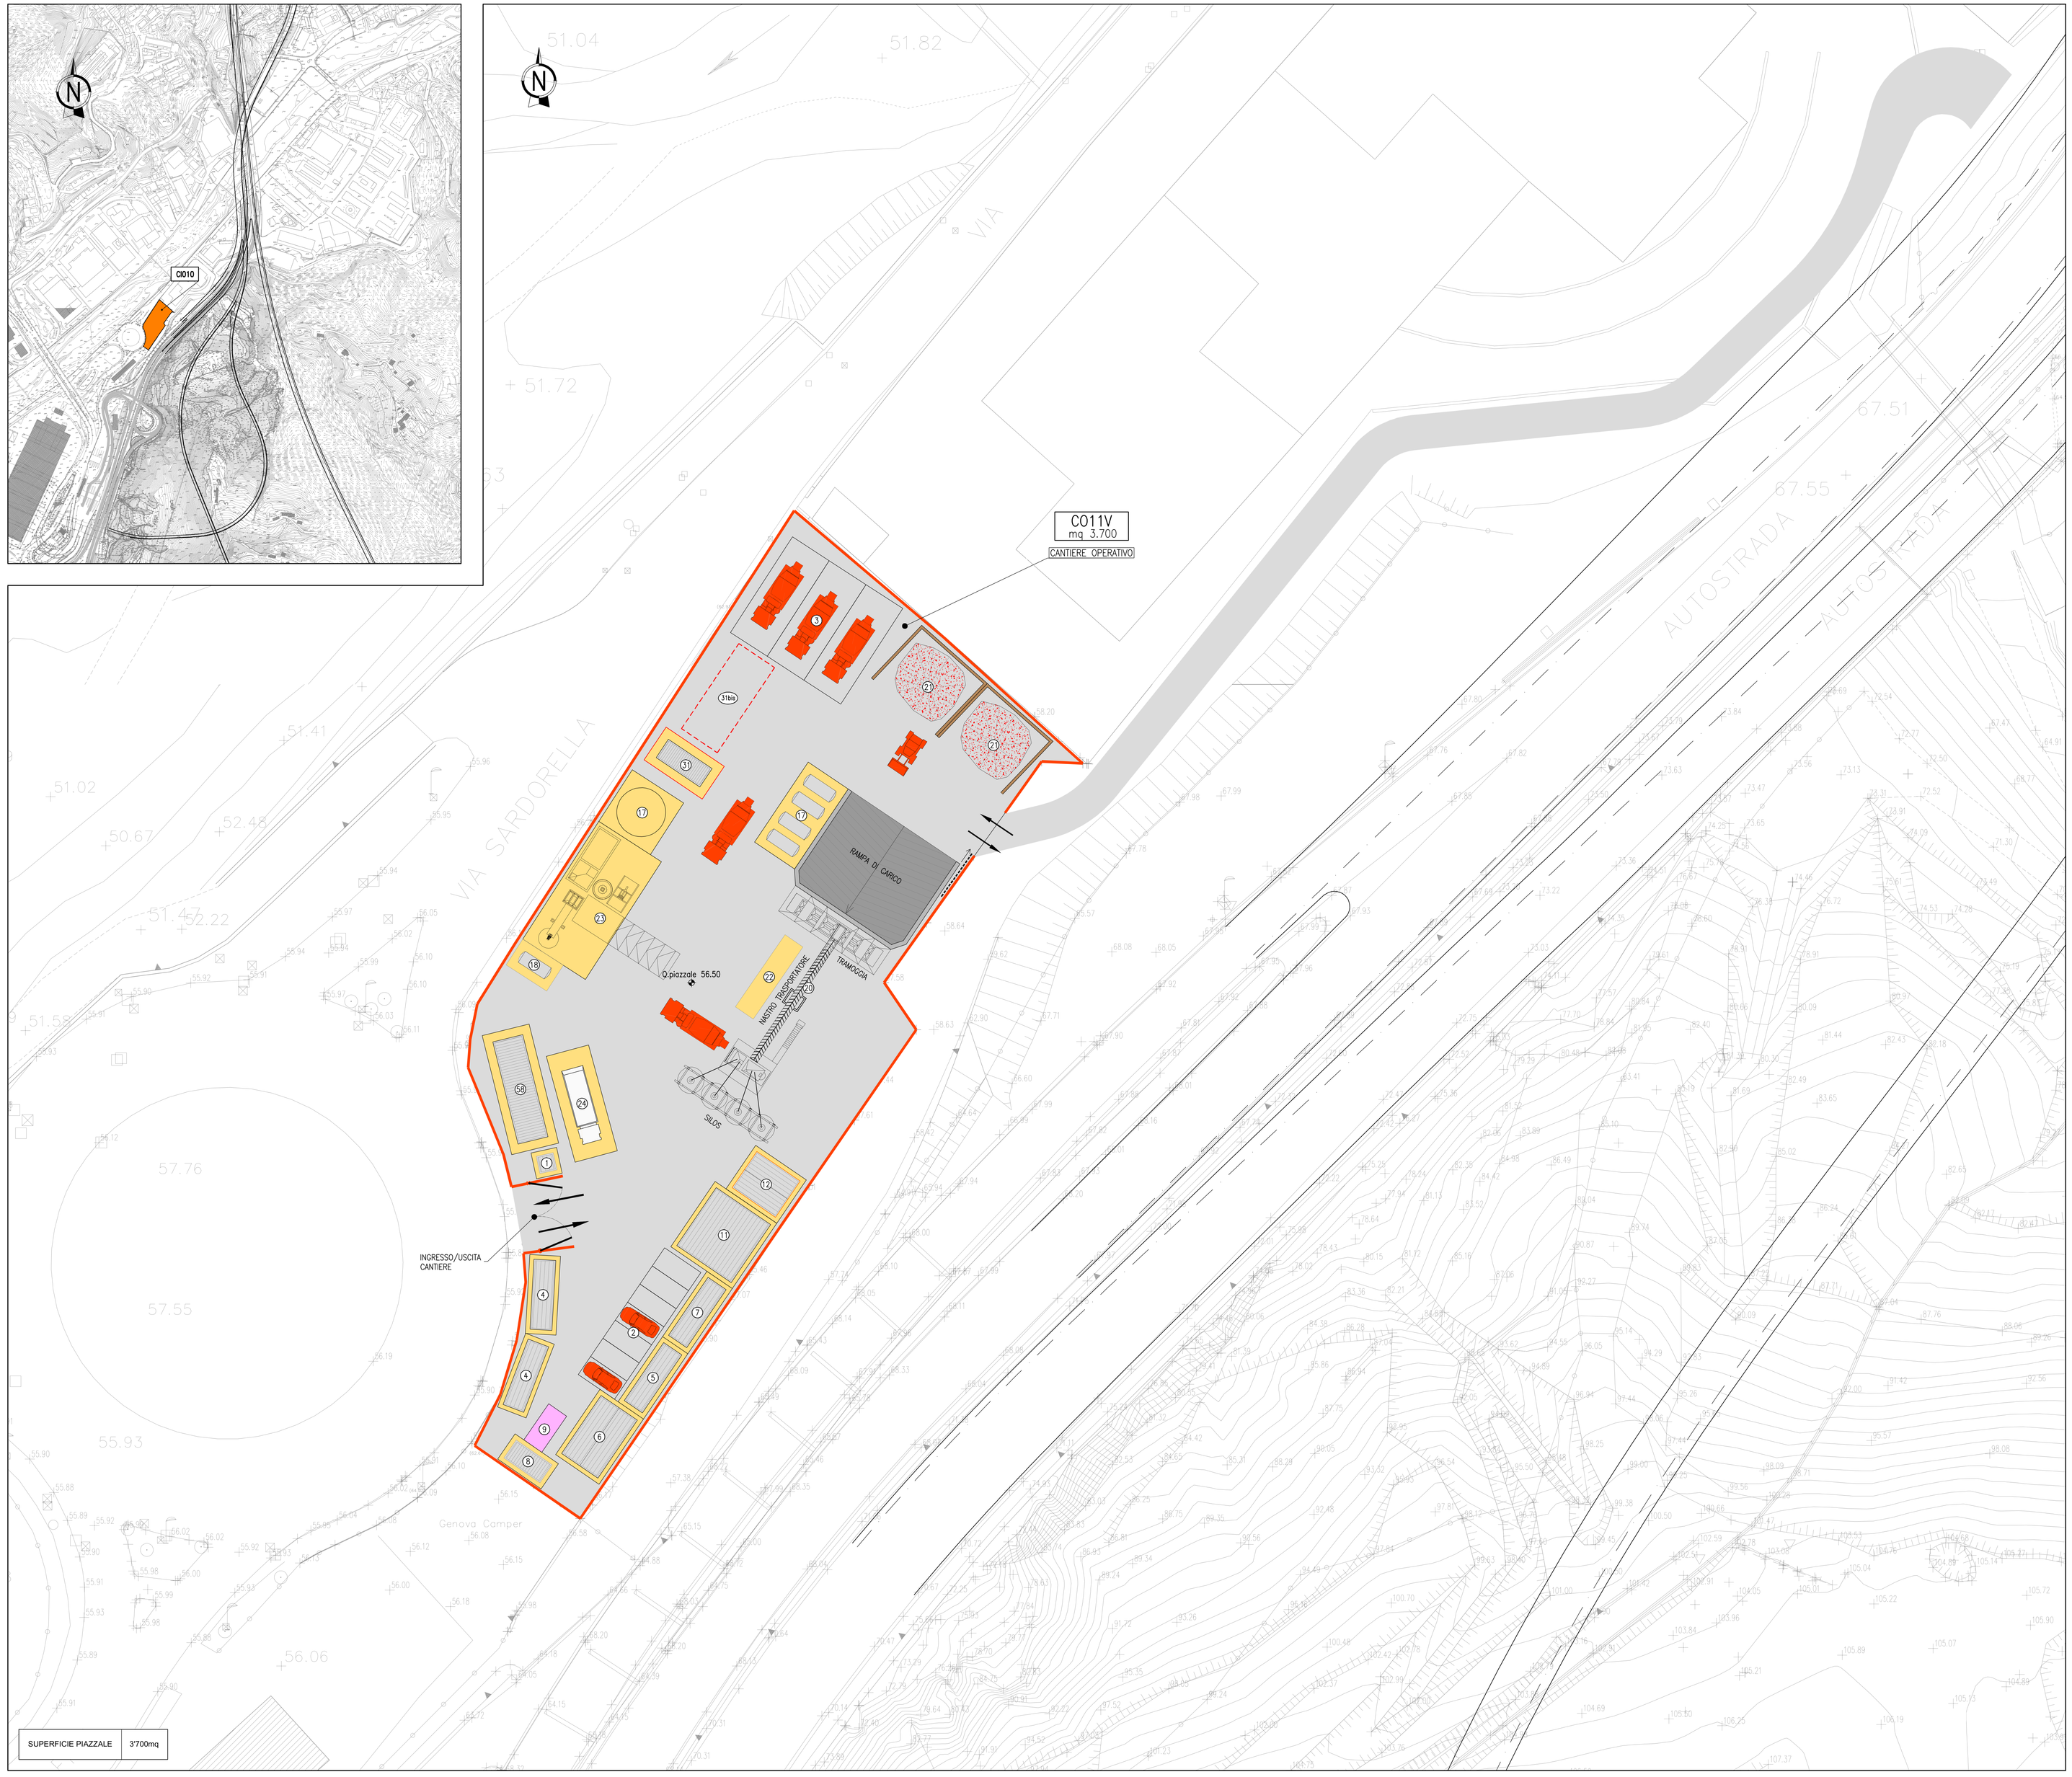

SUPERFICIE PIAZZALE	3'700mq

KEY-MAP

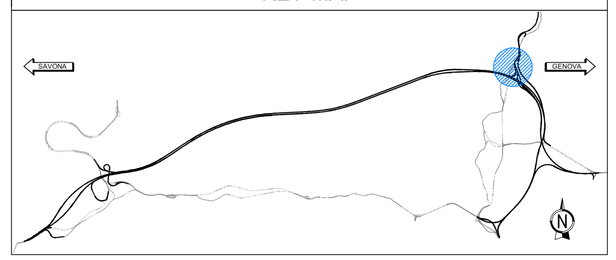

LEGENDA APPRESTAMENTI DI CANTIERE

		N°	mq	mq tot
1	GUARDIOLA INGRESSO CANTIERE (2x2)	1	4	4
2	PARCHEGGI AUTOVETTURE (2,5x5)	7	12,5	87,5
3	AREA DI SOSTA MEZZI DI CANTIERE (5x13)	3	65	195
4	BOX UFFICI CANTIERE (2,5x8)	2	20	40
5	BOX LOCALI SPOGLIATOI (2,5x8)	1	20	20
6	SERVIZI IGIENICI/LAVABI/WC E DOCCE (5x8)	1	40	40
7	RICOVERO/RISTORO (2,5x8)	1	20	20
8	BOX INFERMERIA/DOTAZIONI PRONTO SOCCORSO (2,5x5)	1	12,5	12,5
9	PUNTO INCONTRO EMERGENZA 118 (2,5x5)	1	12,5	12,5
11	DEPOSITO/OFFICINA DI CANTIERE (7,5x8)	1	60	60
12	BOX MAGAZZINO ATTREZZATURE E MATERIALI PER IMPIANTO CLS (5x6)	1	30	30
17	SERBATOI ACQUA PER IMPIANTI	2		
18	SERBATOIO CARBURANTE	1		
20	IMPIANTO DI BETONAGGIO	1		
21	AREA STOCCAGGIO INERTI (8,30x10)	3	83	249
22	AREA STOCCAGGIO SILICATI SPRITZ-BETON (2,5x10)	1	25	25
23	VASCA LAVAGGIO CANALE AUTOBETONIERA (8,5x16)	1	136	136
24	PESA PONTE (5x12,5)	1	62,5	62,5
31	CHIARIFLOCULAZIONE CON SEDIMENTAZIONE FINALE, DISOLEATURA E CORREZIONE DEL PH (2,5x6)	1		
31bis	VASCA VOLANO INTERRATA	1		
58	CABINA DI TRASFORMAZIONE (3,5x12)	1		

RECINZIONE IN RETE METALLICA ELETTROSALDATA, RETE PLASTIFICATA ARANCIONE E MONTANTI IN ACCIAIO H=2.00m

AREA CANTIERE

PIAZZALE IN ASFALTO

BASAMENTI IN CLS

autostrade per l'italia

NODO STRADALE E AUTOSTRADALE DI GENOVA

Adeguamento del sistema
A7 - A10 - A12

Ambito Bolzaneto e ambito Torbella

PROGETTO DEFINITIVO

CANTIERIZZAZIONE

Aree di cantiere

Campo Operativo CO11V

Appresta menti di cantiere - Planimetria di progetto
Planimetrie

VERIFICA a cura di:	RESAME a cura di:	VALIDAZIONE INTERNA a cura di:
IL PROGETTISTA SPECIALISTICO Ing. Giovanni Pierangeli Ord. Ingg. Roma N. 21996 Responsabile Cantierabilità	IL RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE Ing. Marco Trovato Ord. Ingg. Messina N. 3802	IL DIRETTORE TECNICO Ing. Andrea Tanzi Ord.Ingg.Parma N.1154 T.A. EXECUTION

CODICE IDENTIFICATIVO													ORDINATORE
RIFERIMENTO PROGETTO				RIFERIMENTO DIRETTORIO				RIFERIMENTO ELABORATO					-
Codice Commessa	Lotto, Sub-Prog. Funz. Tratto	Fase	Capitolo	Paragrafo	W.B.S.	Parte d'opera	Tip	Disciplina	Progressivo	Rev.	SCALA
T0863	LLE1	PD	CN	ACN	CO11V	00000	D	CNT	1311	00	Varie

TECNE Sostenibile Engineering	ENGINEERING COORDINATOR: Ing. Mario Brugnoli Ord. Ingg. Roma N. A24308 SUPPORTO SPECIALISTICO:	REVISIONE		
		N.	descrizione	data
		00	PRIMA EMISSIONE	GENNAIO 2024

CODIFICA ASPI	Codice Commessa	Fase	Origine	Disciplina	W.B.S.	Tipo	Progressivo	Classe	Stato	Rev.
	0G276-PD-TECN-CNT-CO11V-DGE-000002							1	APD	00

VISTO DEL COMMITTENTE	VISTO DEL CONCEDENTE
autostrade per l'italia IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ing. Claudio Nucci	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO SCRITTO DELLA SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.. SUDA UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARA' PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED OR PUBLISHED, EITHER IN PART OR IN ITS ENTIRETY, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.. UNAUTHORIZED USE WILL BE PROSECUTED BY LAW.

SCALA DI STAMPA: 1=1
