C.B CAMPO BASE POTABILIZZATORE FASE 1

SCALA 1:200

FASE 1
Delimitazione dell'area di cantiere e installazione dei presidi necessari per lo svolgimento delle attività di cantiere; predisposizione delle aree deputate allo stoccaggio e alla movimentazione dei mezzi; installazione del muro di contenimento e dello scannafosso, adiacente al capannone in progetto, necessario alle opere di scavo e successivo getto del manufatto.

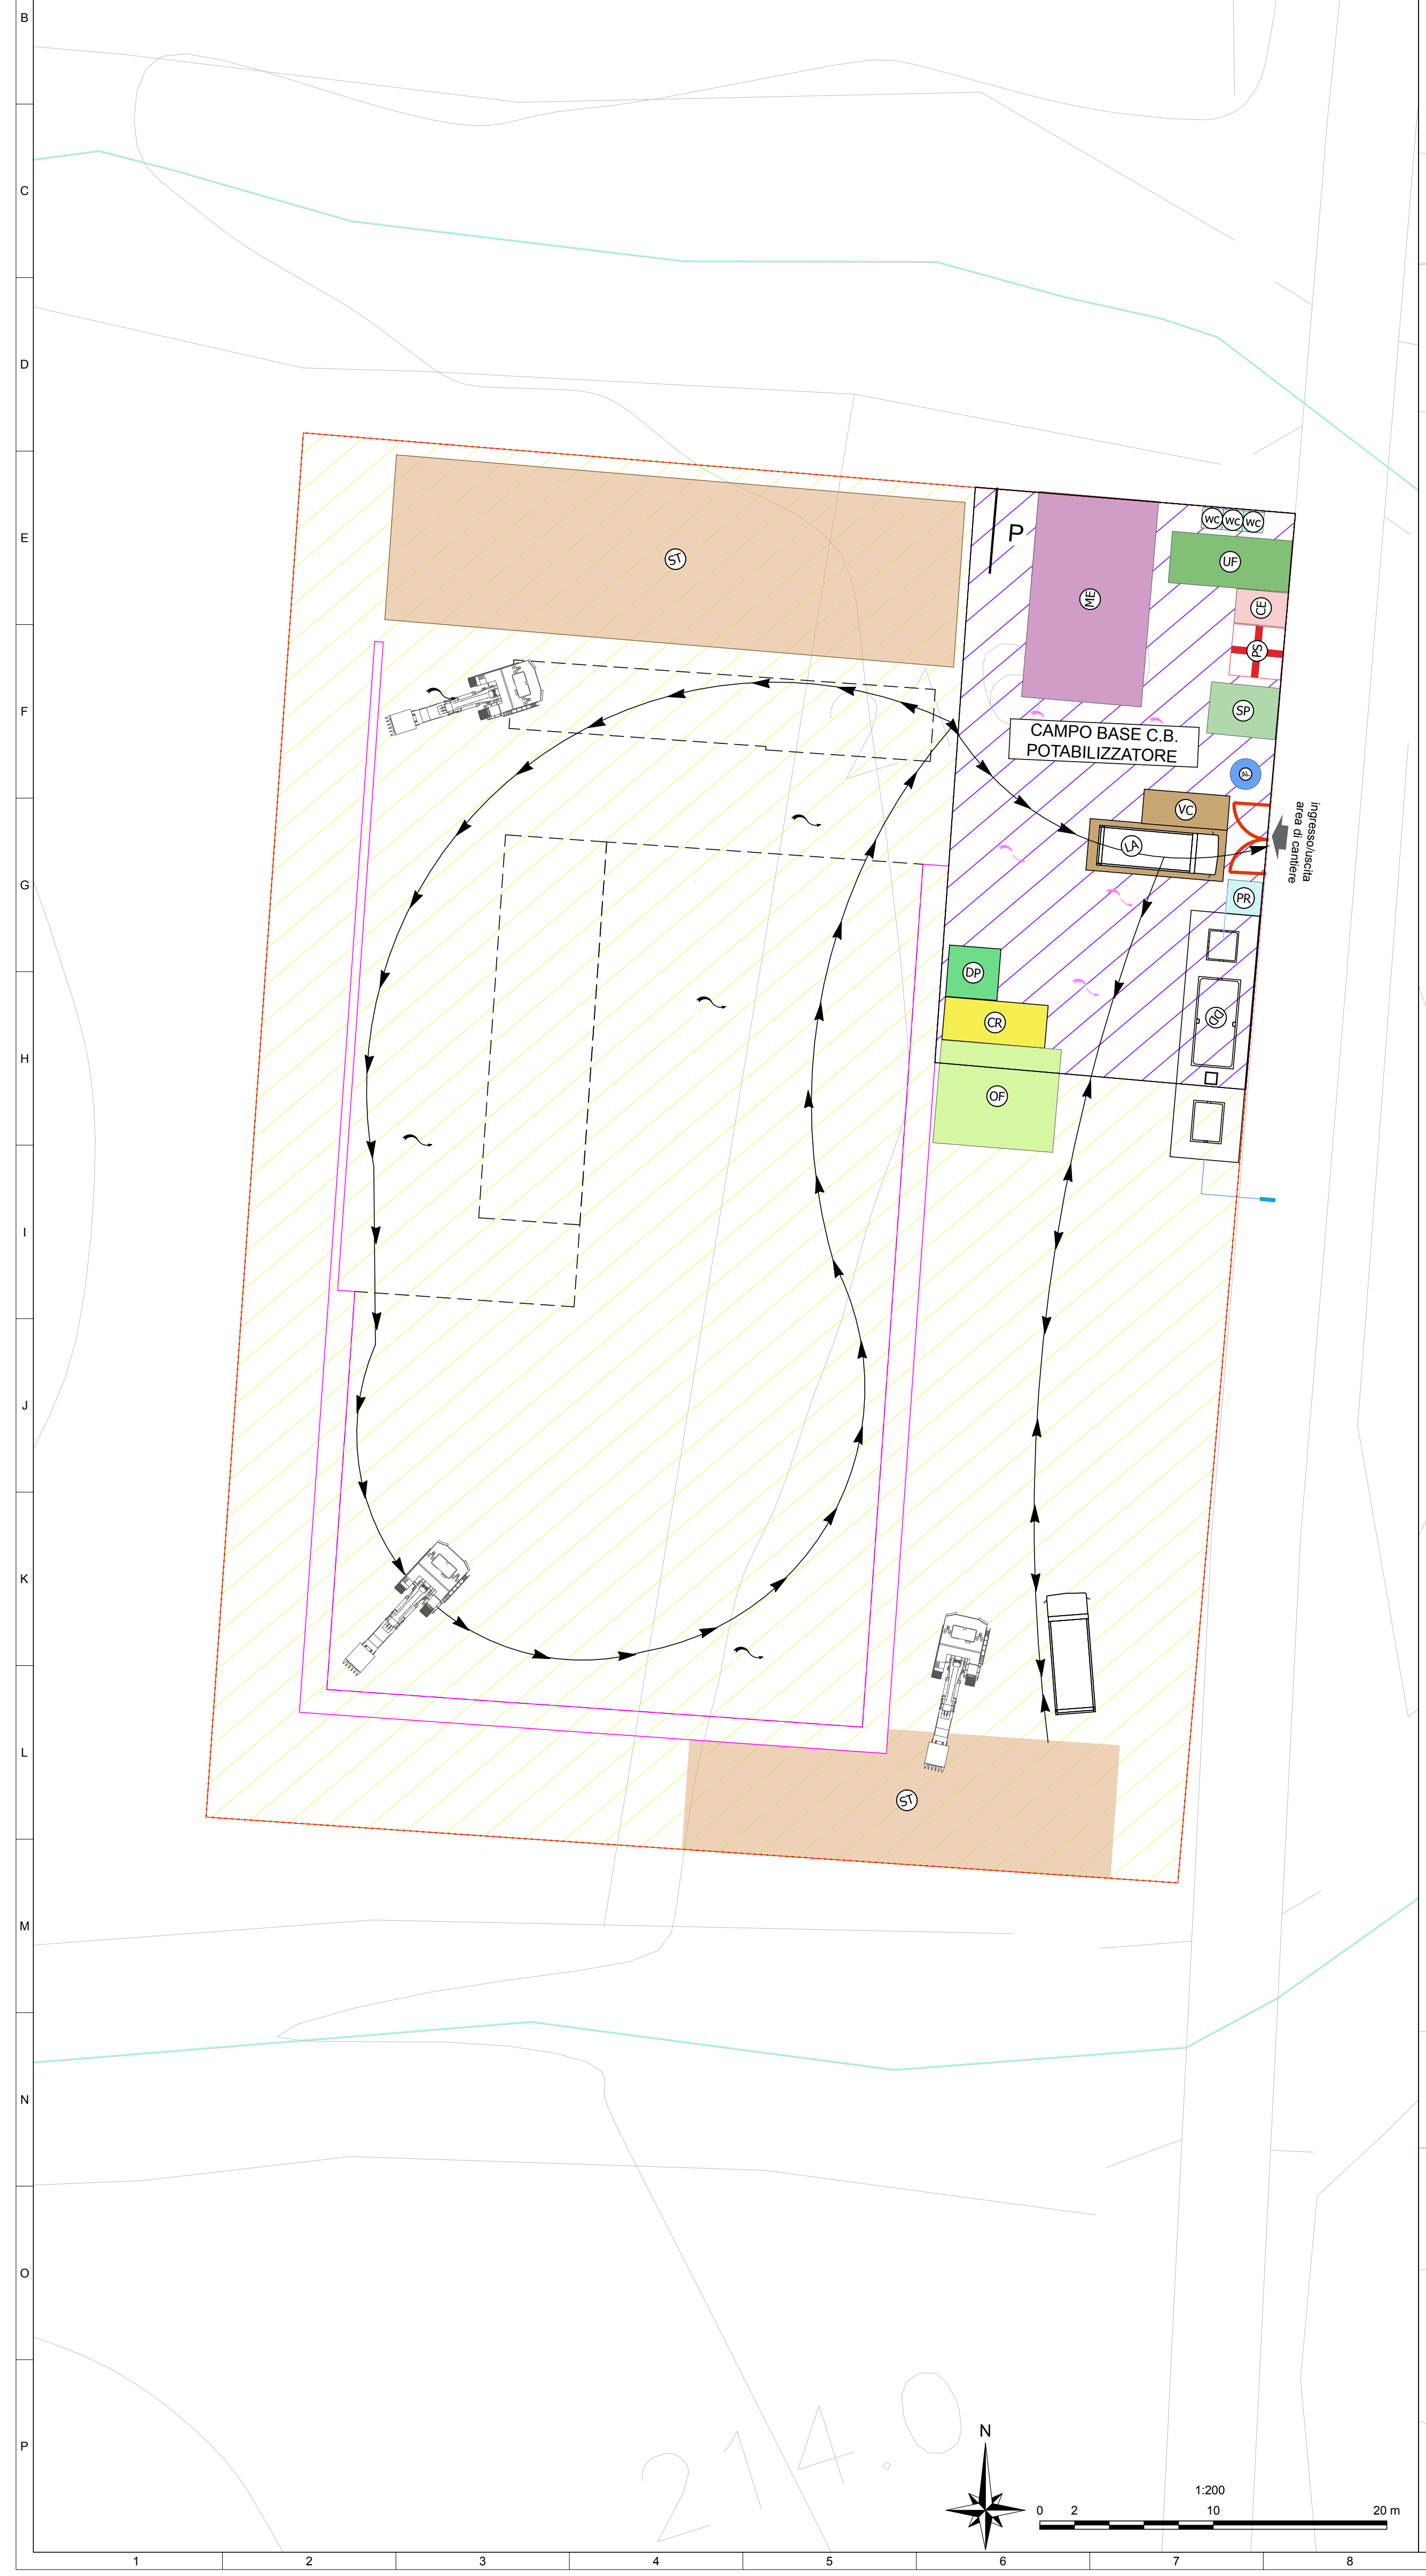
ST
P
ME
WC WC WC
UF
CE
PS
SP
AL
CAMPO BASE C.B. POTABILIZZATORE
VC
LA
ingresso/uscita area di cantiere
PR
DD
DP
CR
OF
ST
N
1:200
0 2 10 20 m

C.B CAMPO BASE POTABILIZZATORE FASE 2

SCALA 1:200

FASE 2
Casseratura e getto del calcestruzzo mediante autobetoniera, disarmo. Approfondimento dello scavo fino a quota fondazione e sistemazione del materiale scavato in aree di stoccaggio perimetralmente all'impianto.

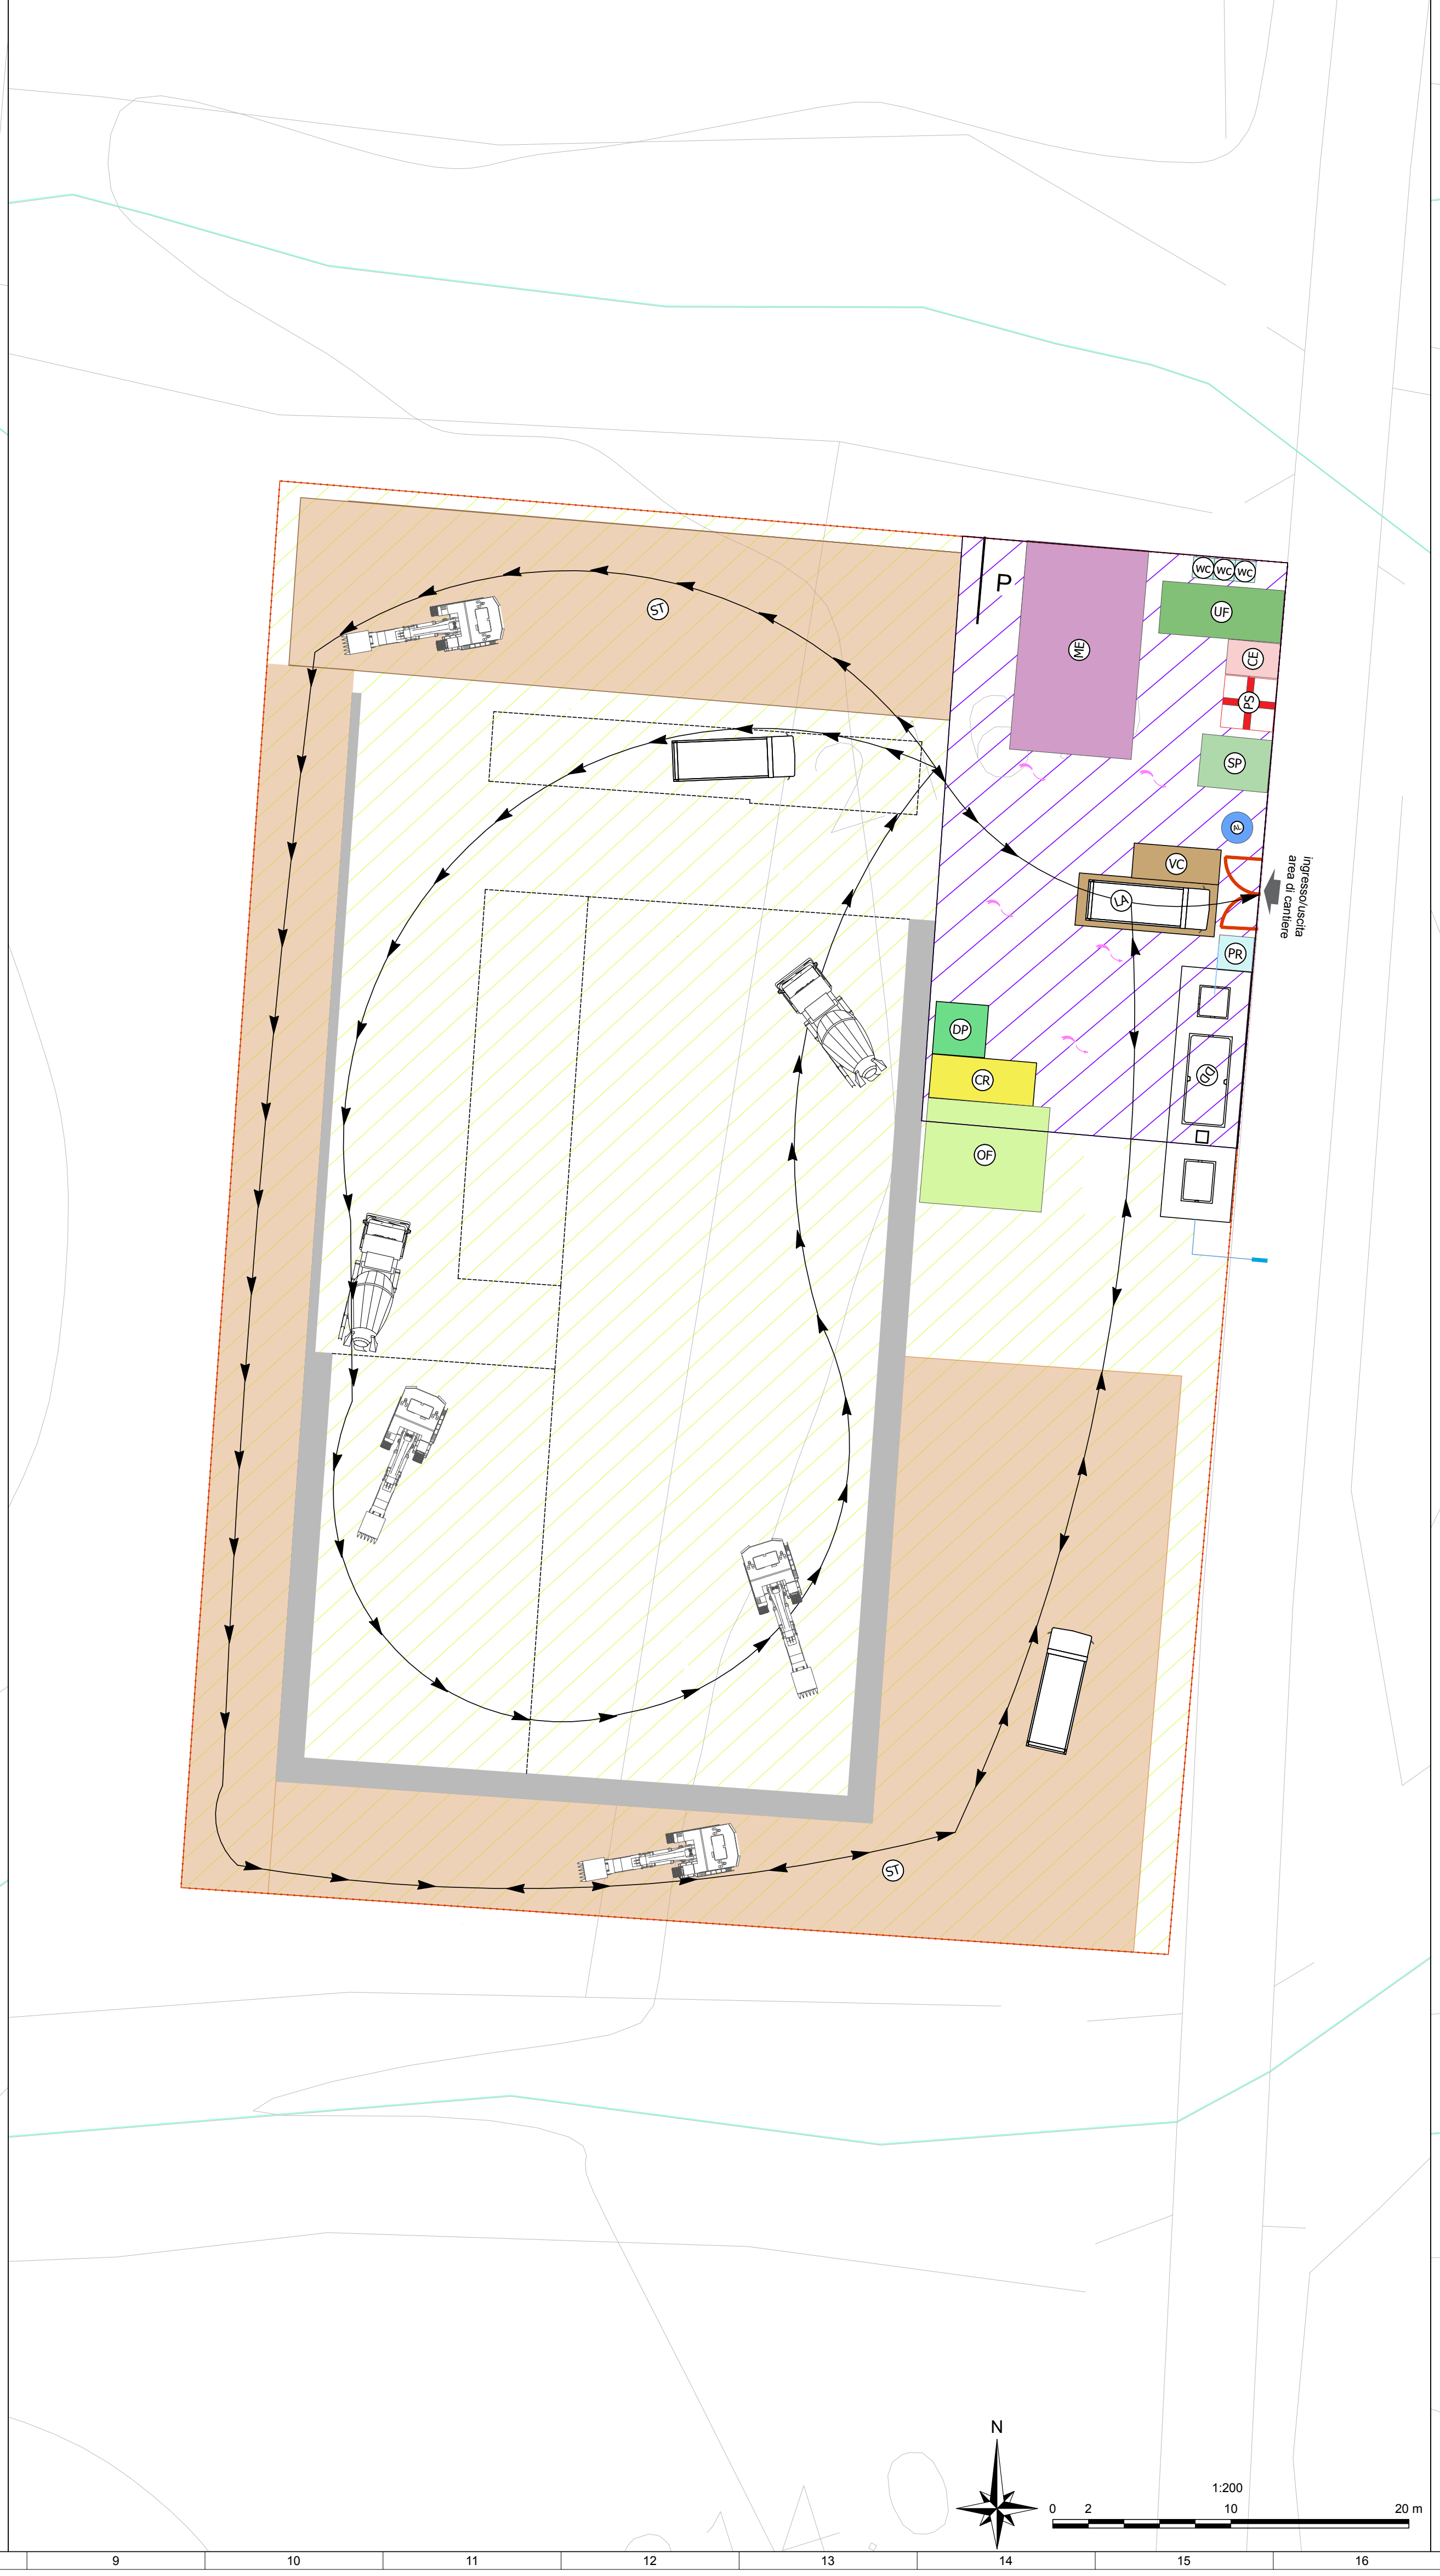

C.B CAMPO BASE POTABILIZZATORE FASE 3

SCALA 1:200

FASE 3
Preparazione del piano di posa per la fondazione, e del muro laterale al gruppo elettreogeno e alla cabina elettrica. Una volta completata l'armatura in ferro della fondazione, si inseriscono le tubazioni per gli impianti in platea e inizia la fase di casseratura con pannelli in legno. Con l'aiuto di un'autopompa viene steso uno strato di calcestruzzo armato, lasciando le riprese dei pilastri e il ferro d'armo dei cordoli. Disarmo dei casseri.

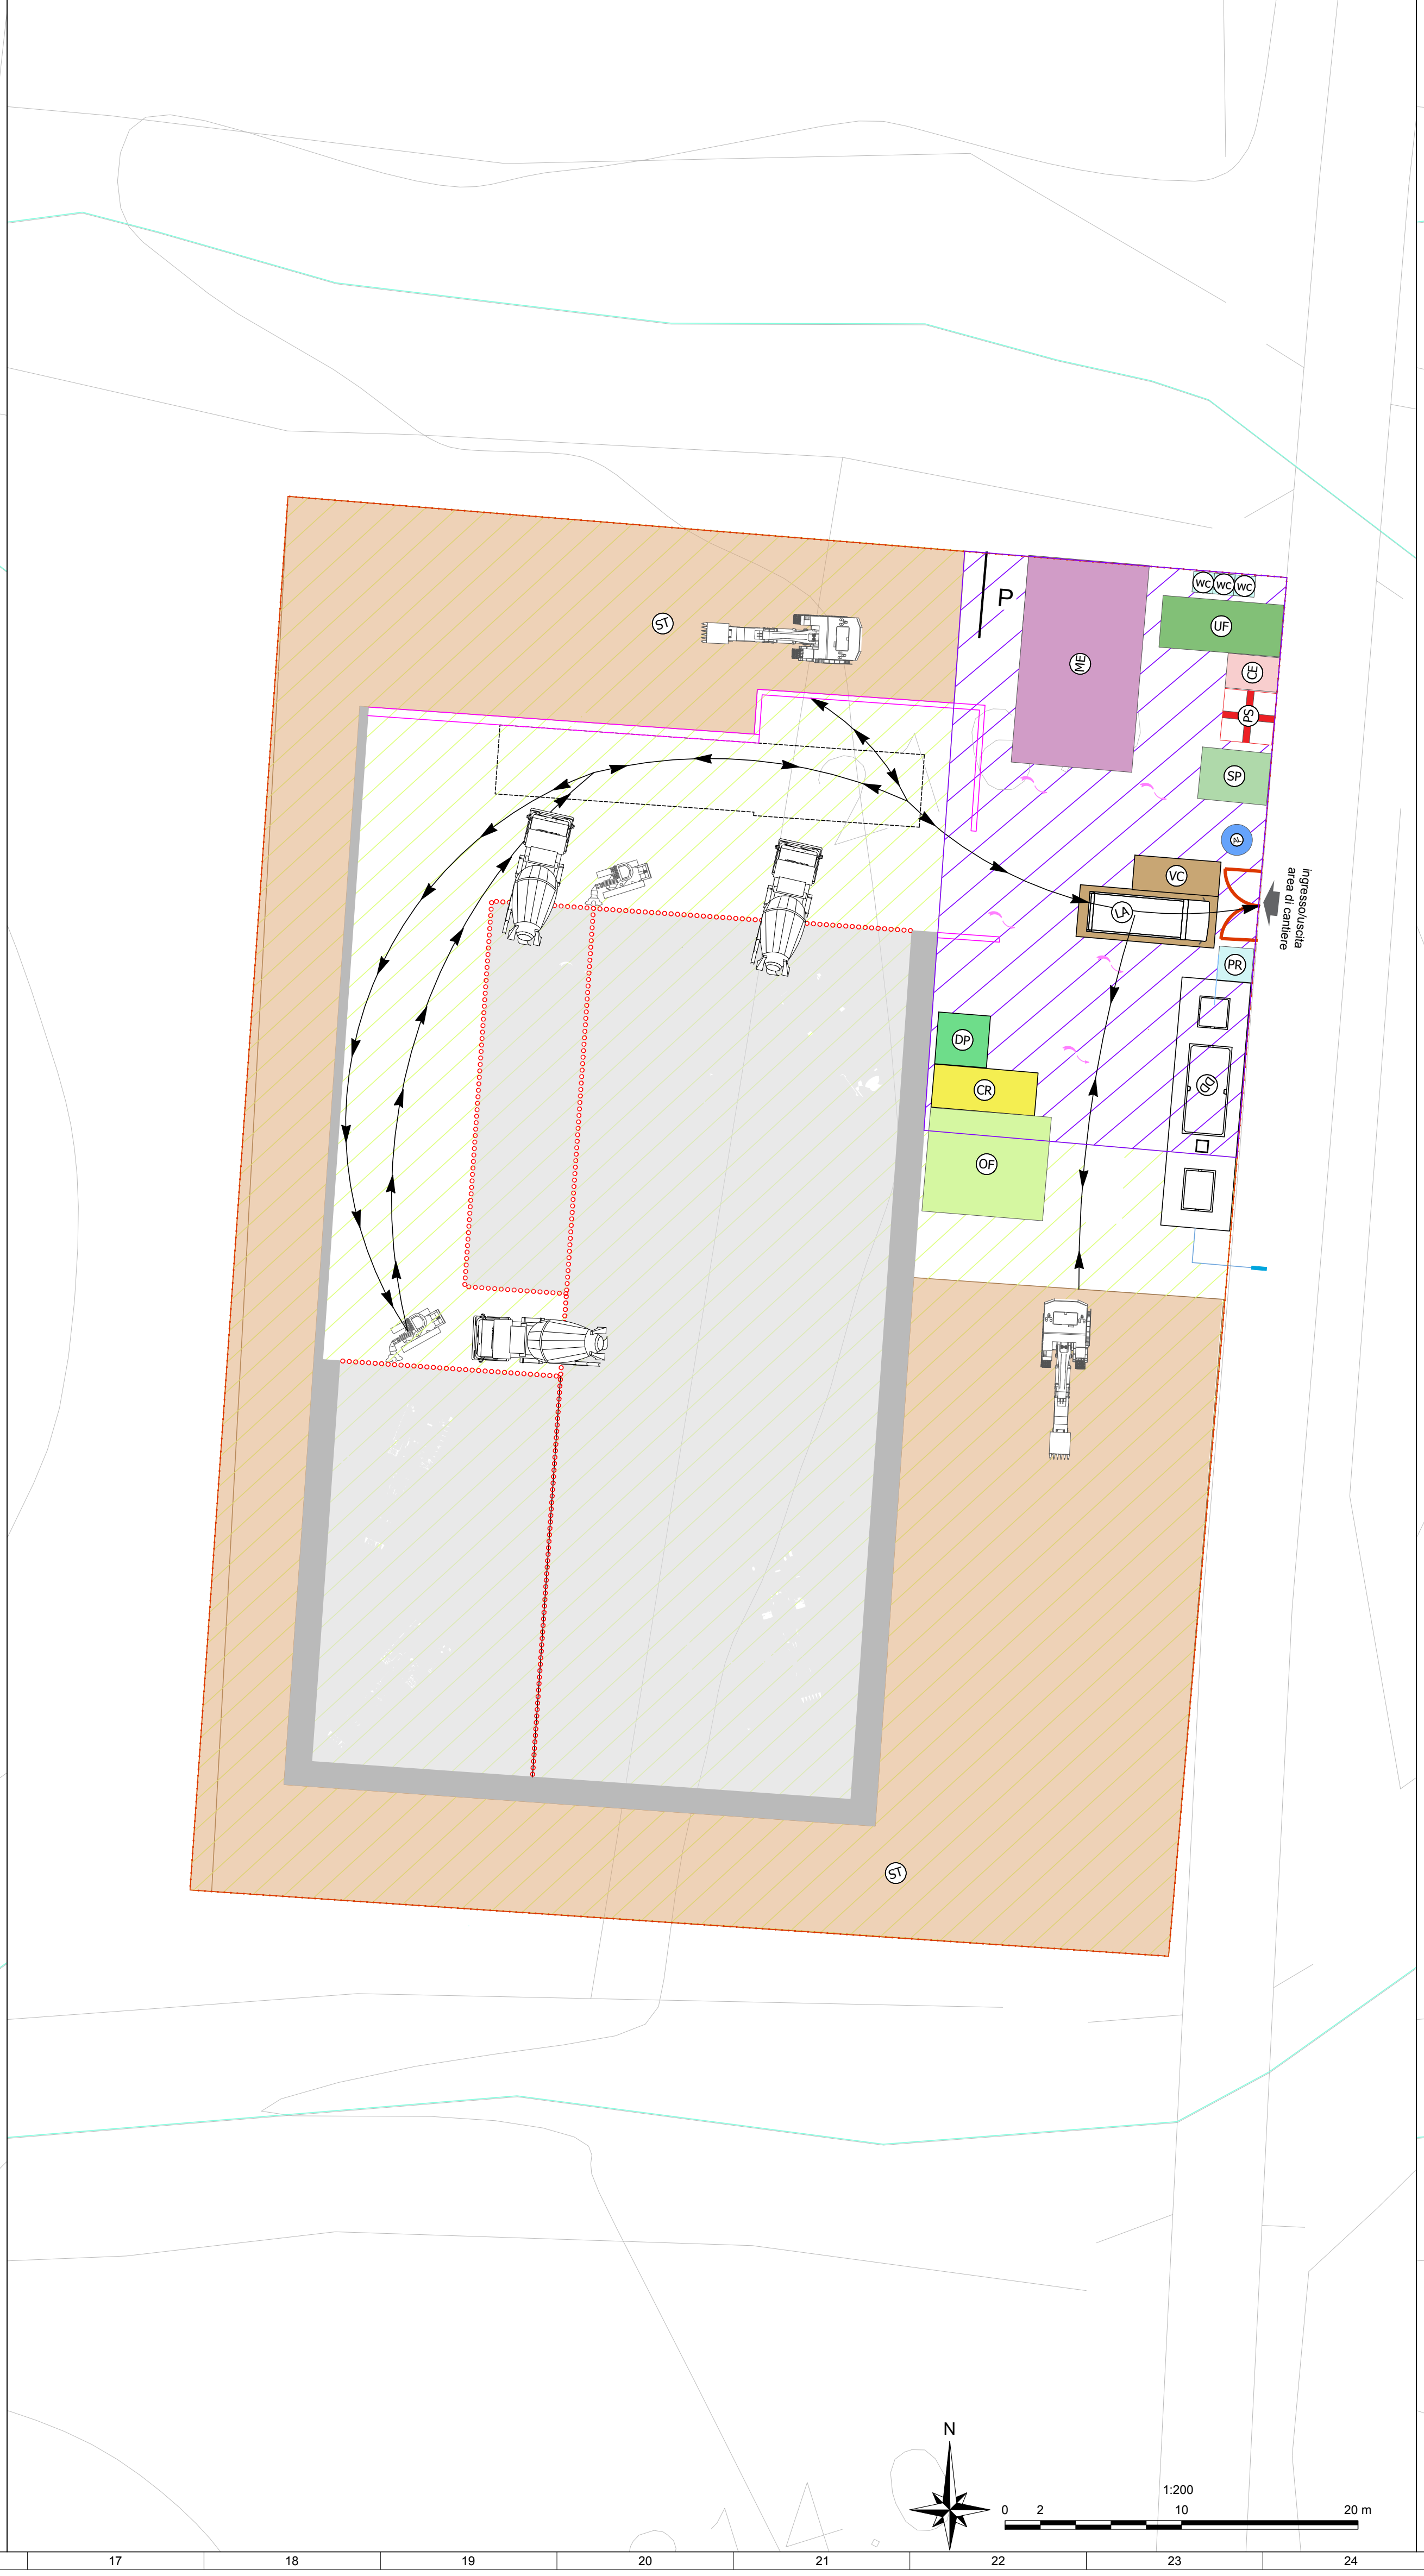

C.B CAMPO BASE POTABILIZZATORE FASE 4

SCALA 1:200

FASE 4
Realizzazione della struttura in elevazione, platea di alloggio gruppo elettrogeno e cabina elettrica, e sistemazione viabilità interna. Sistemazione del materiale scavato realizzando terrapieni in prossimità dei confini dell'area dell'impianto.

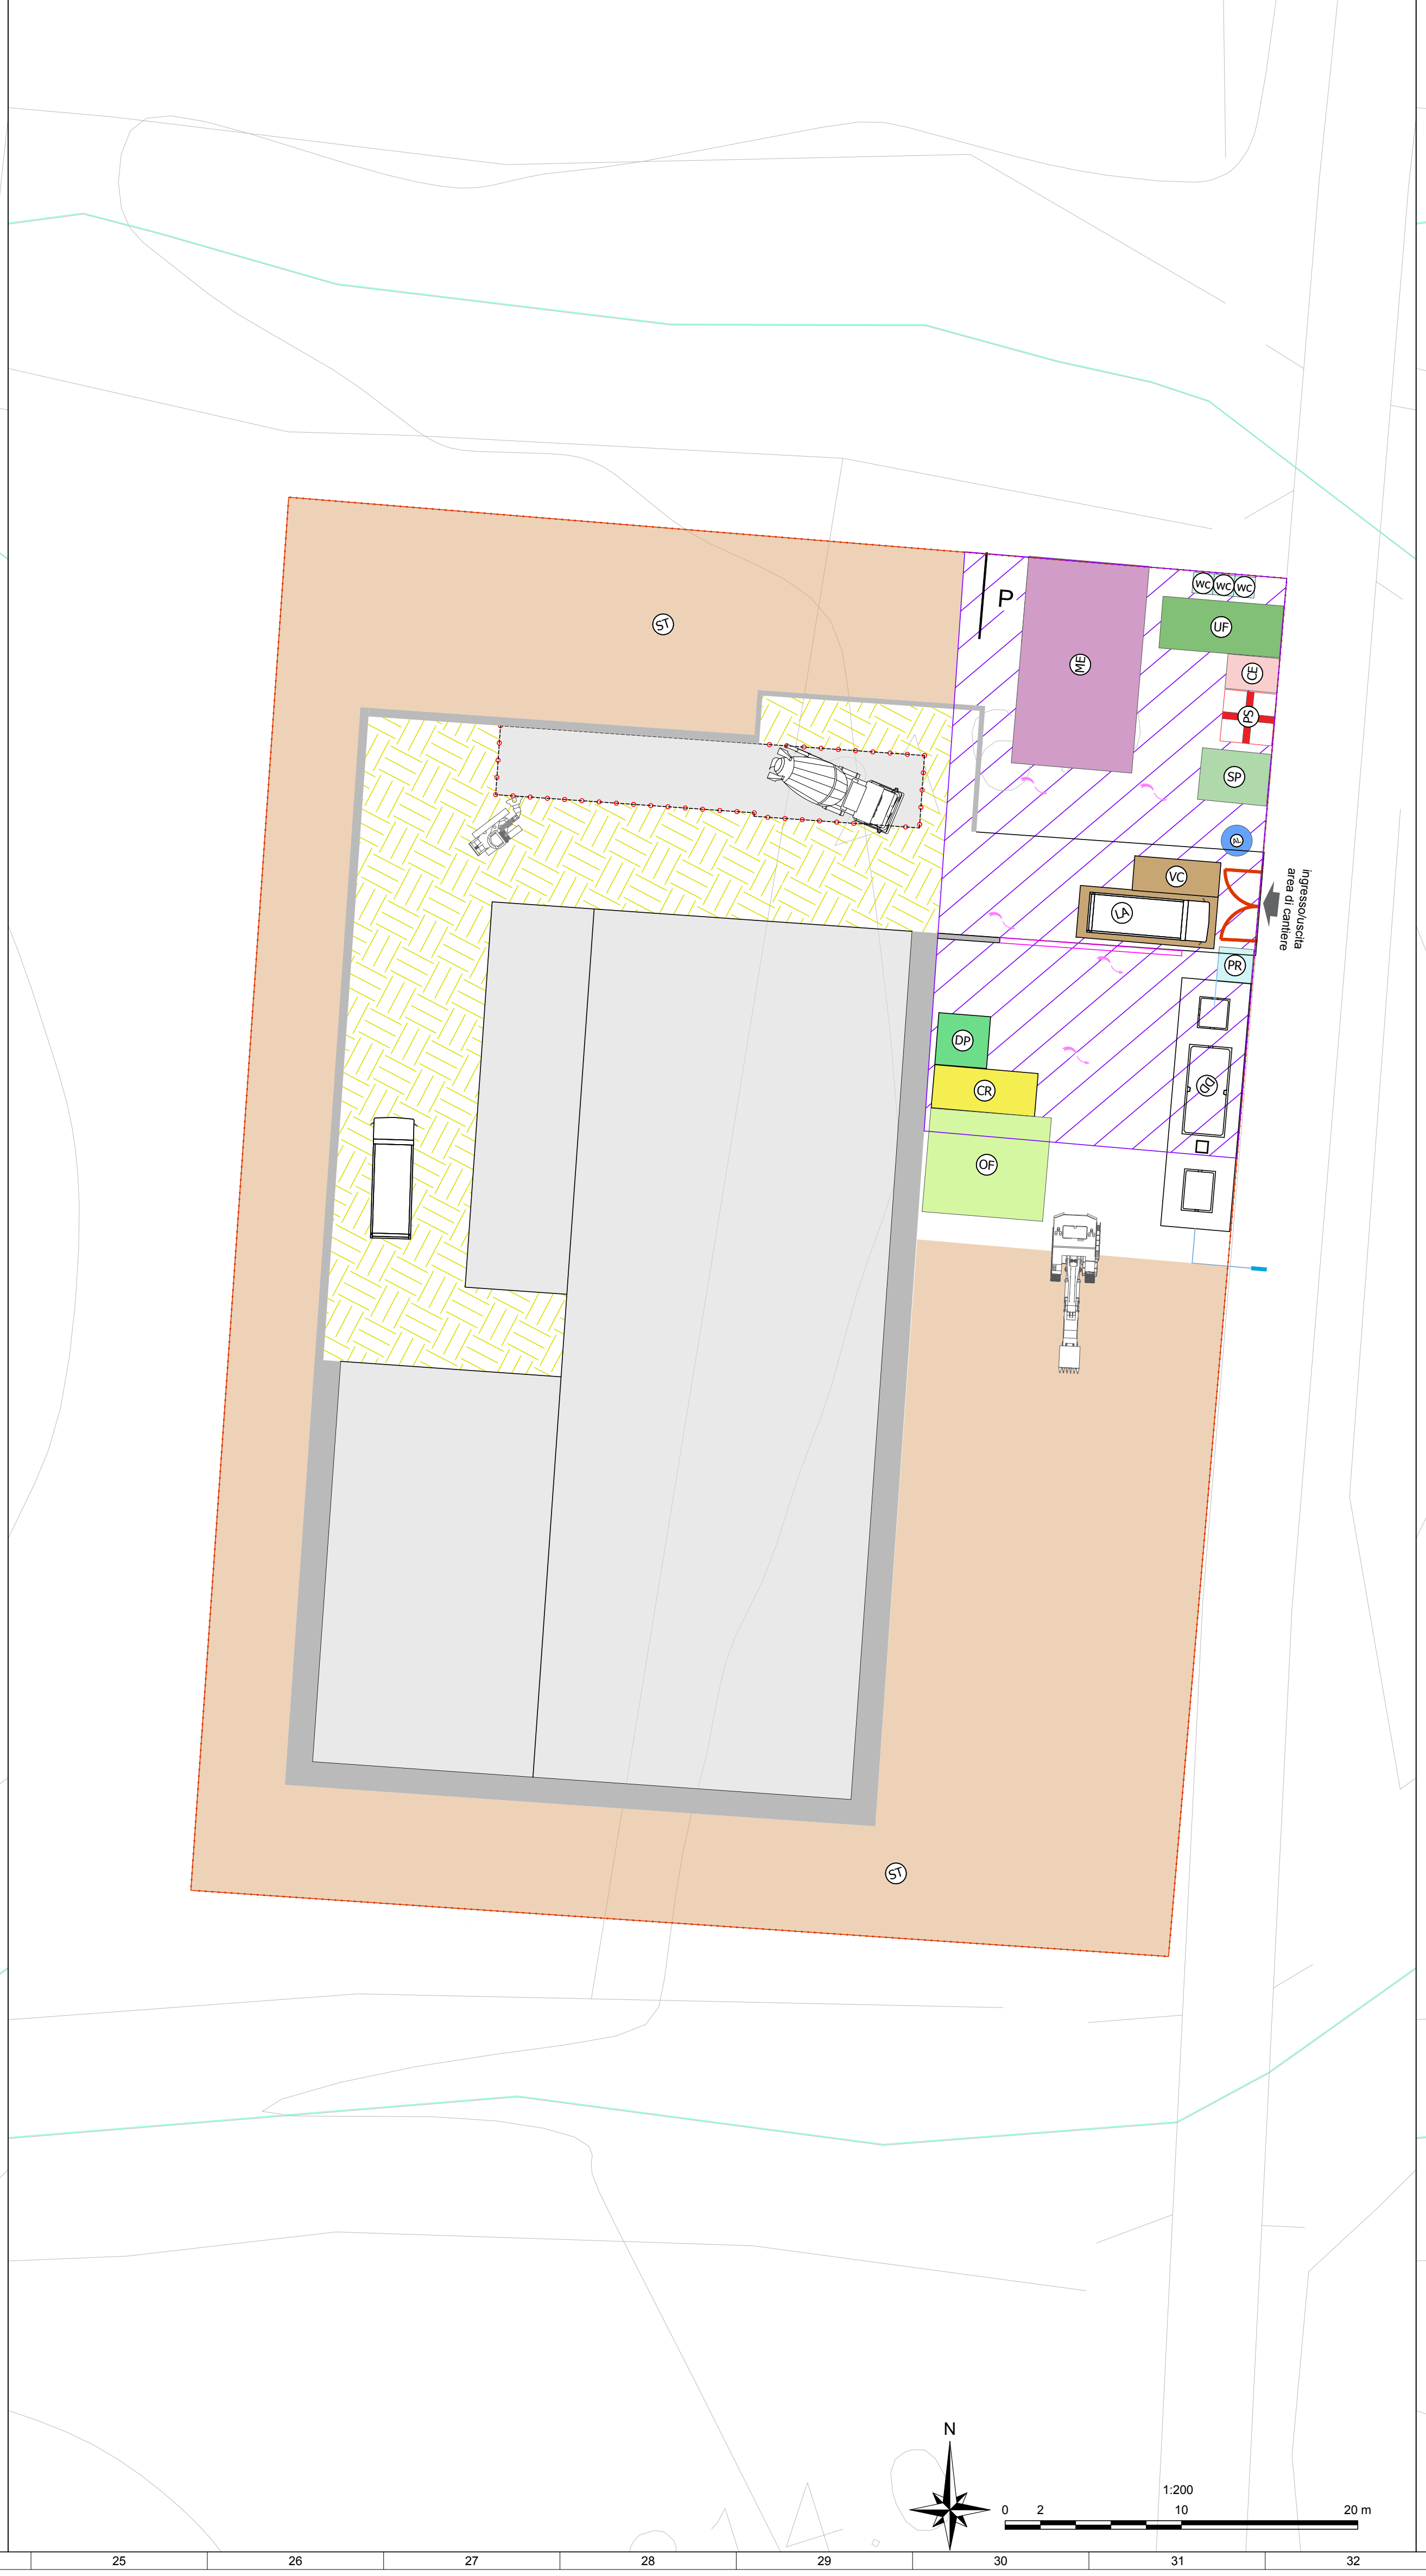

C.B CAMPO BASE POTABILIZZATORE FASE 5

SCALA 1:200

FASE 5
Sistemazione finale interna e perimetrale all'area di impianto: installazione di alberature, copertura del capannone del muro e dello scannafosso con "tetto giardino" (per garantire la continuità della rete ecologica), installazione di pannelli fotovoltaici nella restante parte di tetto (nel rispetto di approvvigionare l'energia elettrica da fonti rinnovabili a garanzia dei principi DNSH e carbon footprint), ultimazione della pavimentazione in biostrass e recinzione dell'impianto.
Dismissione del cantiere

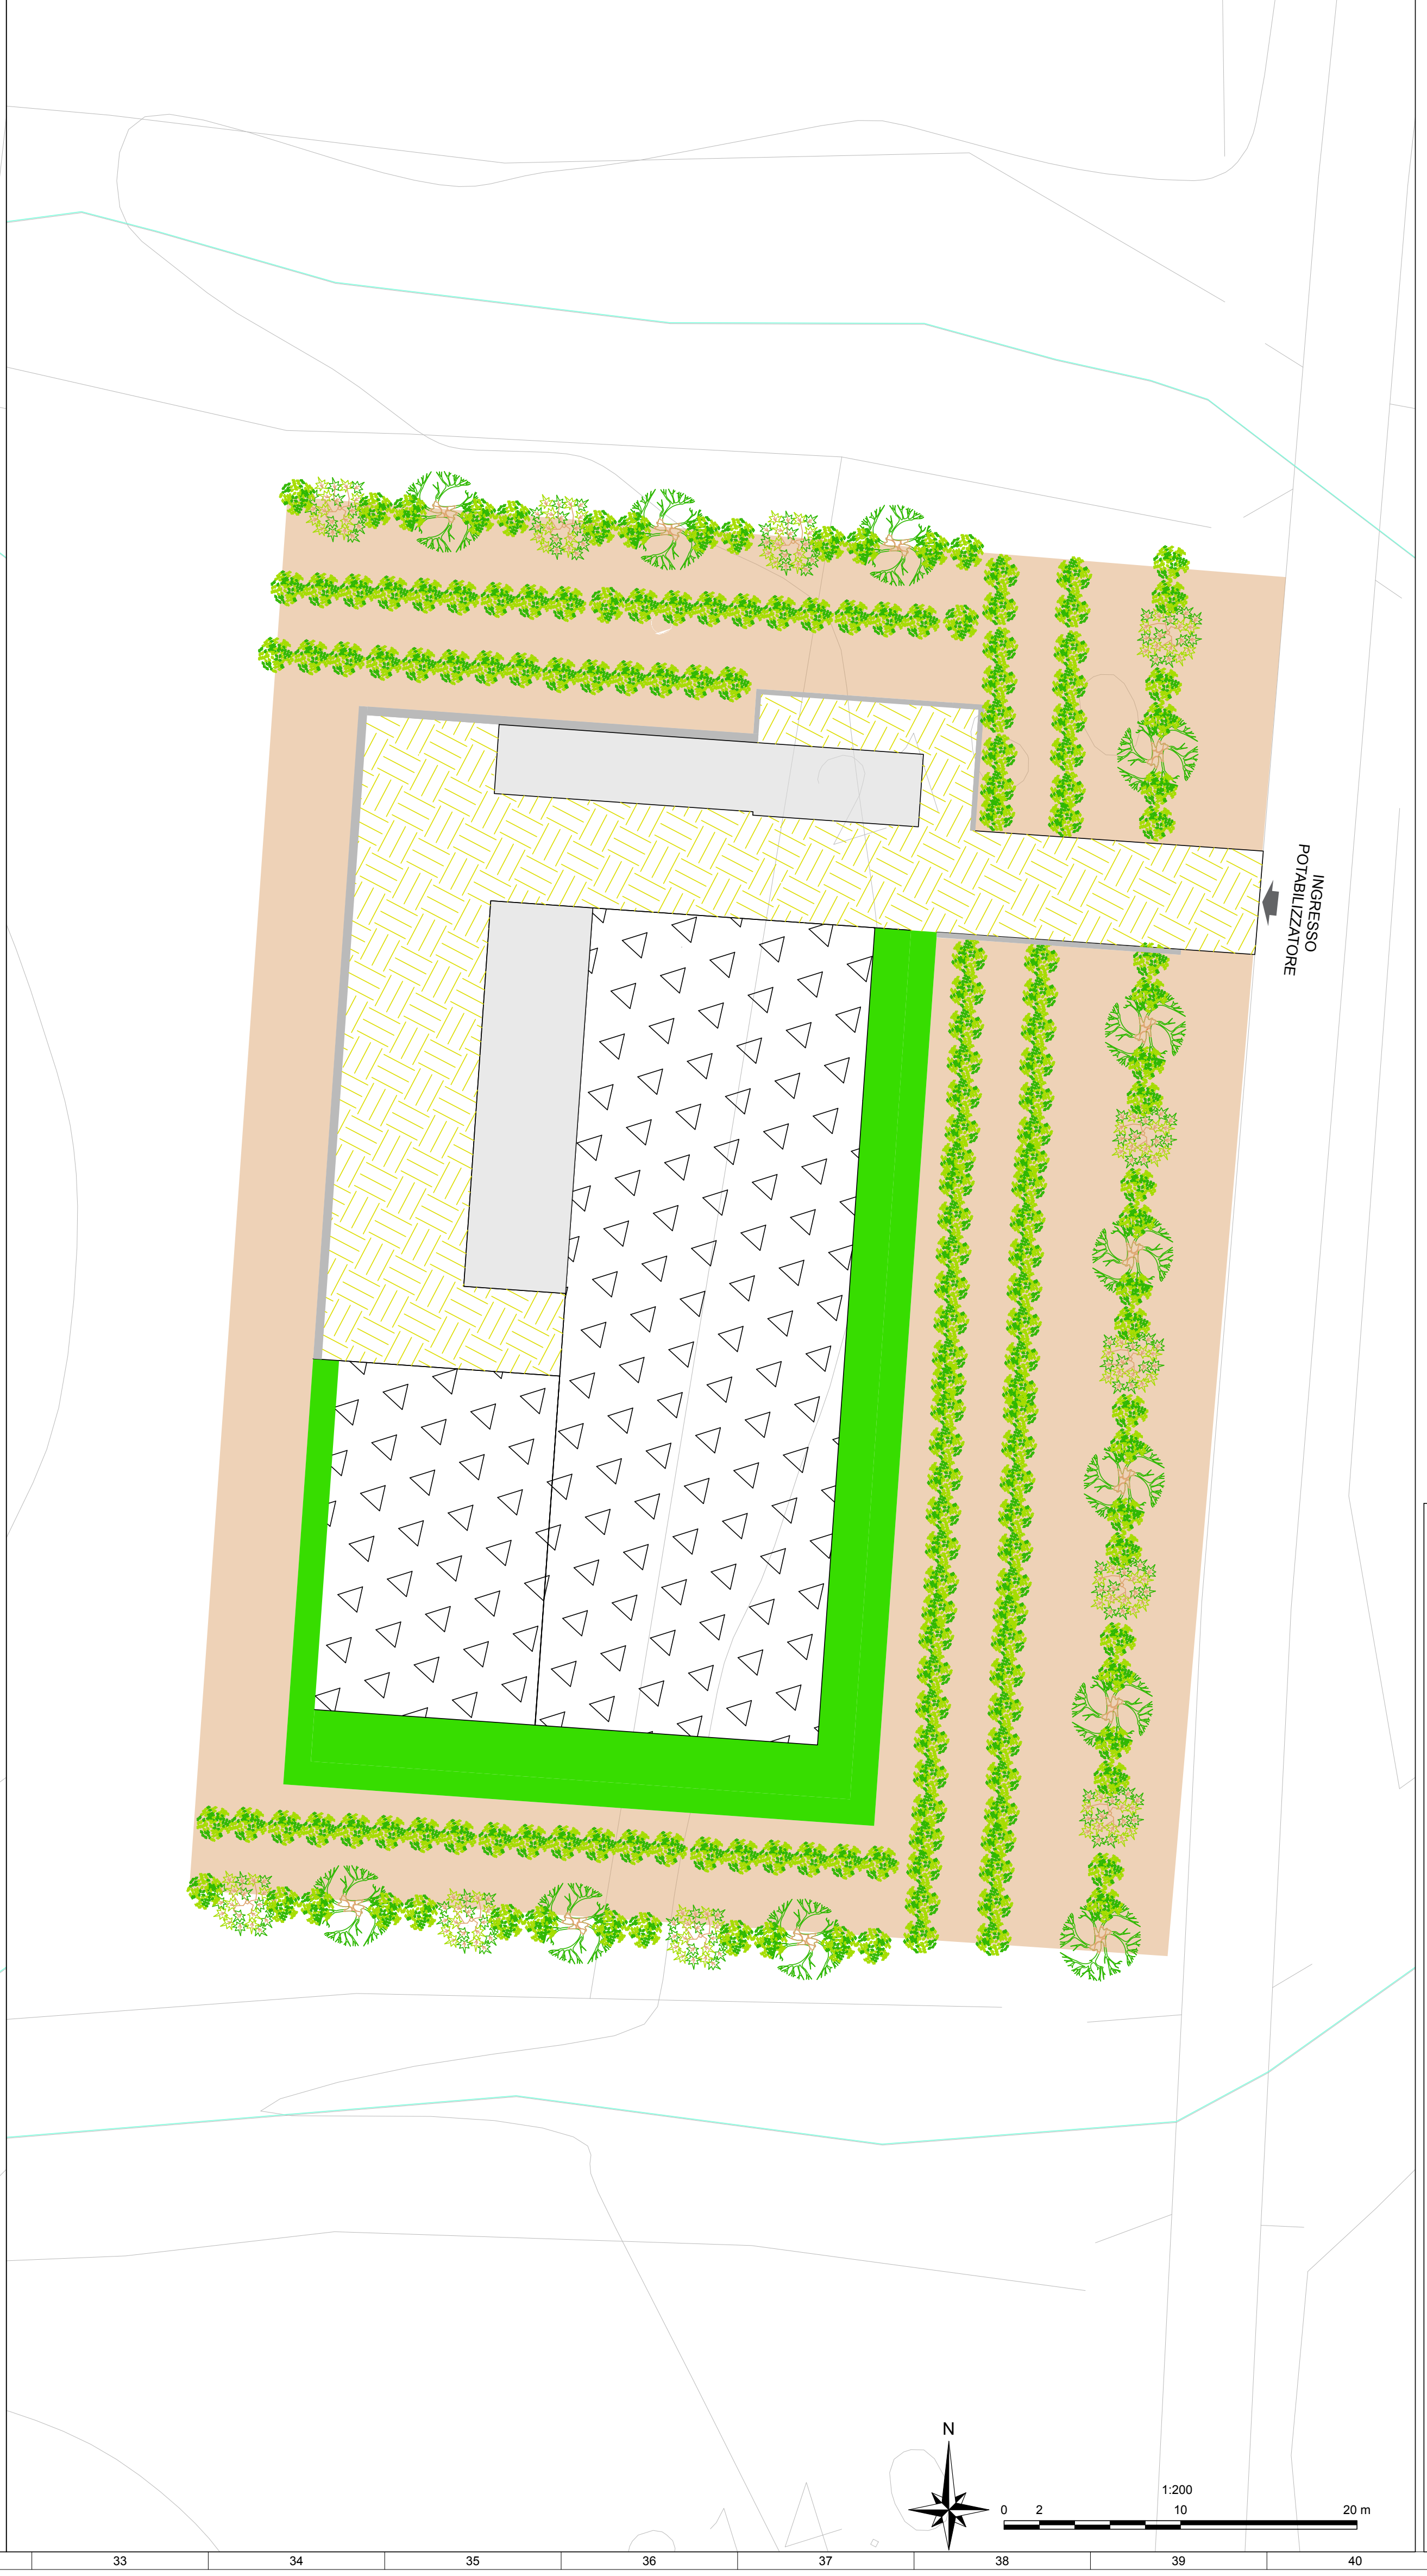

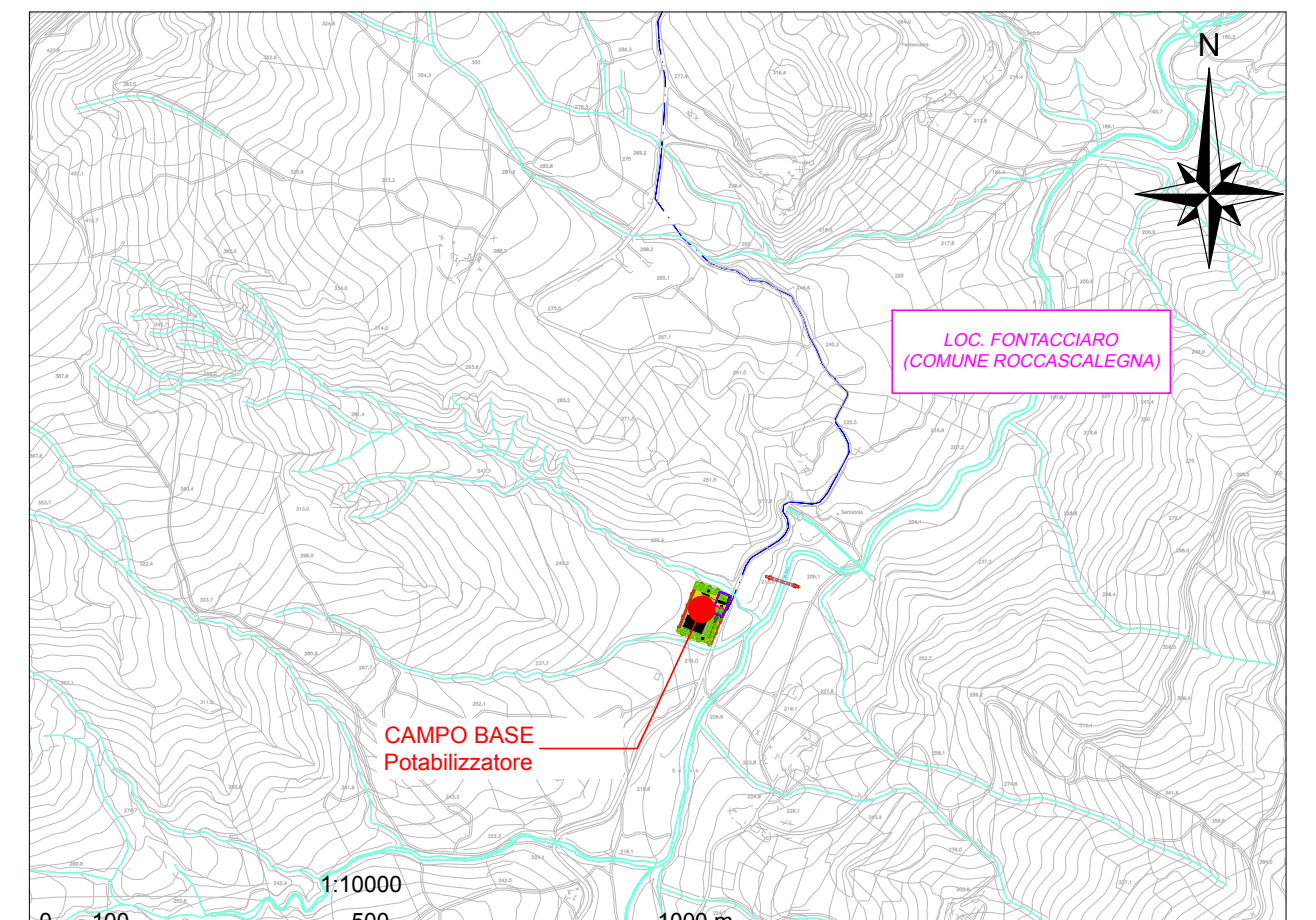
N
LOC. FONTACCIARO (COMUNE ROCCASCALEGNA)
CAMPO BASE Potabilizzatore
1:10000
0 100 500 1000 m

FASI DI CANTIERIZZAZIONE

FASE 1
Delimitazione dell'area di cantiere e installazione dei presidi necessari per lo svolgimento delle attività di cantiere; predisposizione delle aree deputate allo stoccaggio e alla movimentazione dei mezzi; installazione del muro di contenimento e dello scannafosso, adiacente al capannone in progetto, necessario alle opere di scavo e successivo getto del manufatto.

FASE 2
Casseratura e getto del calcestruzzo mediante autobetoniera, disarmo. Approfondimento dello scavo fino a quota fondazione e sistemazione del materiale scavato in aree di stoccaggio perimetralmente all'impianto.

FASE 3
Preparazione del piano di posa per la fondazione, e del muro laterale al gruppo elettreogeno e alla cabina elettrica. Una volta completata l'armatura in ferro della fondazione, si inseriscono le tubazioni per gli impianti in platea e inizia la fase di casseratura con pannelli in legno. Con l'aiuto di un'autopompa viene steso uno strato di calcestruzzo armato, lasciando le riprese dei pilastri e il ferro d'armo dei cordoli. Disarmo dei casseri.

FASE 4
Realizzazione della struttura in elevazione, platea di alloggio gruppo elettrogeno e cabina elettrica, e sistemazione viabilità interna. Sistemazione del materiale scavato realizzando terrapieni in prossimità dei confini dell'area dell'impianto.

FASE 5
Sistemazione finale interna e perimetrale all'area di impianto: installazione di alberature, copertura del capannone del muro e dello scannafosso con "tetto giardino" (per garantire la continuità della rete ecologica), installazione di pannelli fotovoltaici nella restante parte di tetto (nel rispetto di approvvigionare l'energia elettrica da fonti rinnovabili a garanzia dei principi DNSH e carbon footprint), ultimazione della pavimentazione in biostrass e recinzione dell'impianto.
Dismissione del cantiere

Legenda:

- ━ RECINZIONE DI CANTIERE
- ～ ACQUE DI PIAZZALE
- ▨ AREA DI CANTIERE - SUPERFICIE OPERATIVA
- ▨ AREA DI CANTIERE - SUPERFICIE LOGISTICA
- ■ TERRENO SCAVATO E RIUTILIZZATO IN SITO
- 🟩 CORRIDOIO ECOLOGICO
- ◁◁◁ IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL TETTO DEL CAPANNONE
- ▨ VIABILITÀ INTERNA IN BIOSTRASS

TAG	APPRESTAMENTO
UF	UFFICI
SP	SPOGLIATOIO
ME	MENSA
WC	WC
CE	CABINA ELETTRICA
ST	AREA DI STOCCAGGIO
OF	OFFICINA
PS	PRESIDIO SANITARIO
AL	ACQUA PER LAVAGGIO AUTOMEZZI
LA	LAVAGGIO AUTOMEZZI
VC	VASCA DI CONTENIMENTO
CR	RACCOLTA RIFIUTI
DP	DEPOSITO
DD	DISSABBIATURA/DISOLEATURA
PR	POZZETTO RACCOLTA ACQUE

REGIONE ABRUZZO
S.A.S.I. SPA
Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Mims Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

POTENZIAMENTO DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO "VERDE"
Aumento disponibilità della risorsa idrica e interconnessione tra i sistemi acquedottistici

III Stralcio funzionale Potabilizzatore e Interconnessioni
CUP: E61B21004440006
PNRR-M2C4-I4.1-A2-36

PROGETTO ESECUTIVO

L'APPALTATORE ATI:
COLANZI SRL
protecno
ANGELO DE CESARIS
almacis

IL PROGETTISTA RTP:
BOUVENGIT
protecno
Ing. Eleonora Sablone
Dott. Geologo Tiziano Marini

TITOLO ELABORATO	SCALA	FOGLIO
CAMPO BASE POTABILIZZATORE	1:200	A0+5

FASE	TIPO DI DOCUMENTO	CODICE ELABORATO
PE	TAVOLA	B2343.E.A07.05.LY.00

R.U.P.
P.A. Pio Ercole D'Ippolito

AGGIORNAMENTI:

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLL.	APPROV.
00	Maggio 2024		Ing. G. Murrocu	Ing. E. Napoli	Ing. A. Giovannini
