FASE 1
SCALA 1:200

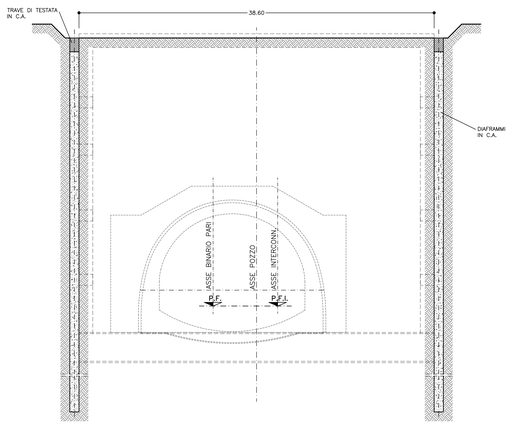

FASE 4
SCALA 1:200

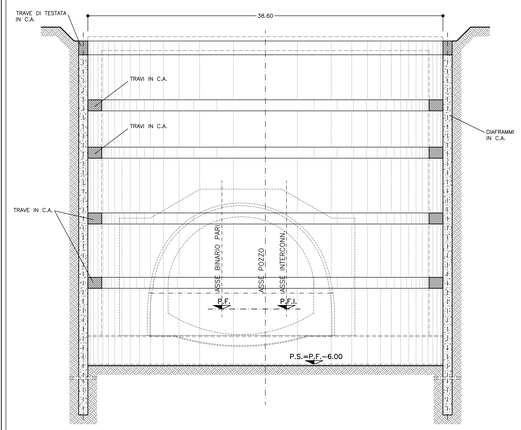

FASE 7
SCALA 1:200

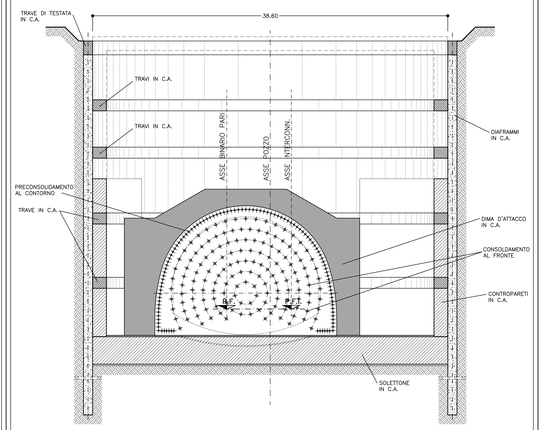

FASE 10
SCALA 1:200

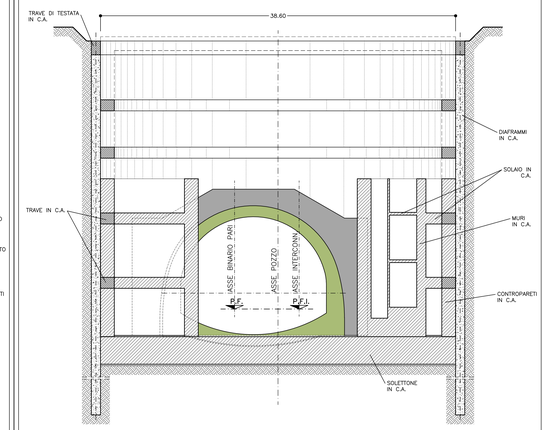

FASE 2
SCALA 1:200

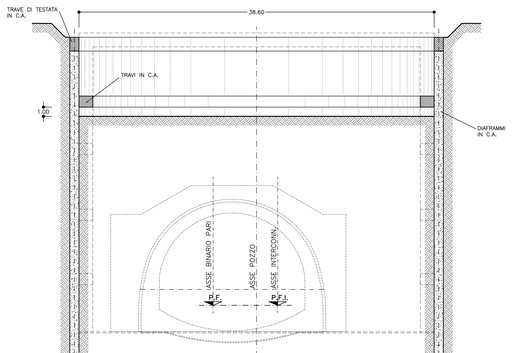

FASE 5
SCALA 1:200

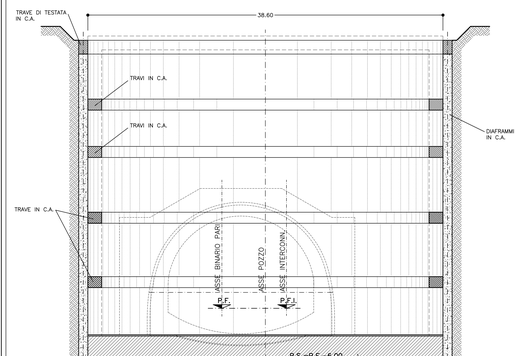

FASE 8
SCALA 1:200

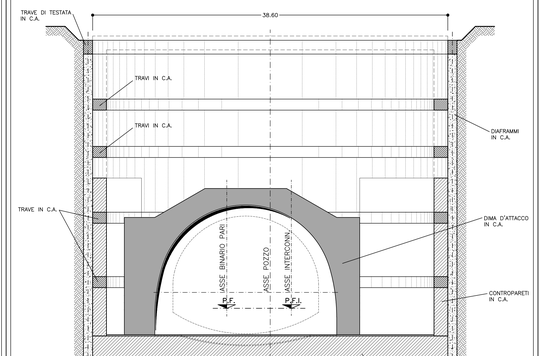

FASE 11
SCALA 1:200

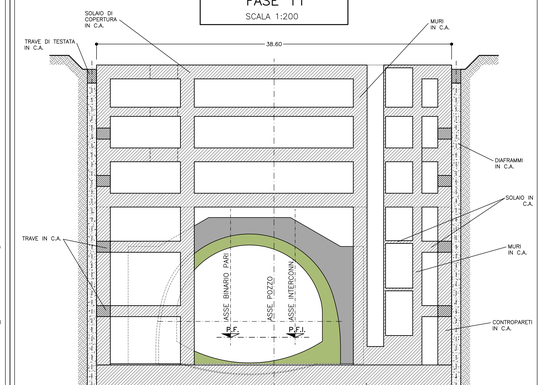

FASE 3
SCALA 1:200

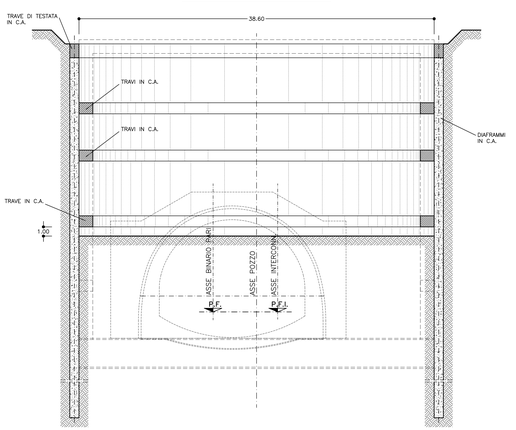

FASE 6
SCALA 1:200

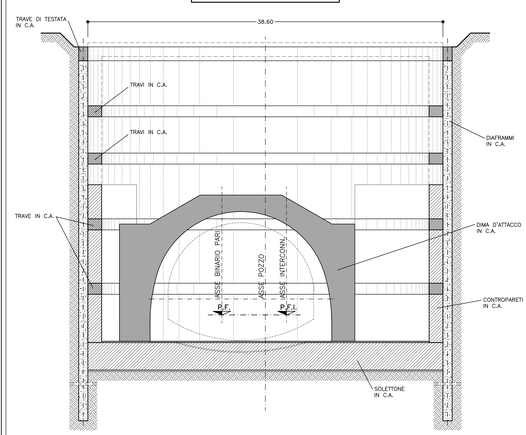

FASE 9
SCALA 1:200

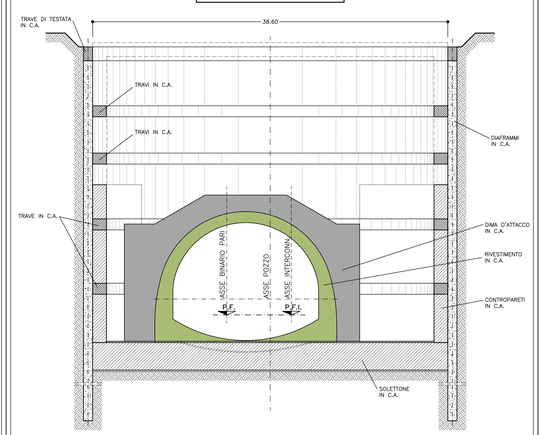

QUADRO "GENERALE" DELLE FASI ESECUTIVE

FASE 1 :
- ESECUZIONE SCAVO A QUOTA PIANO DI TESTA DIAFRAMMI
- REALIZZAZIONE DIAFRAMMI E RELATIVA TRAVE DI TESTATA

FASE 2 :
- SCAVO DI RIBASSO FINO ALLA QUOTA IDONEA PER LA REALIZZAZIONE DELLA TRAVE AD ANELLO IN C.A. N°1
- PROSECUZIONE DELLO SCAVO DI RIBASSO E REALIZZAZIONE DELLE TRAVI AD ANELLO IN C.A. N°2 CON LE MODALITA' DI CUI SOPRA.

FASE 3 :
- SCAVO DI RIBASSO FINO ALLA QUOTA IDONEA PER LA REALIZZAZIONE DELLA TRAVE AD ANELLO IN C.A. N°3
- PROSECUZIONE SCAVO CON LE MODALITA' DI CUI SOPRA FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL PIANO DI SCAVO SUCCESSIVO.

FASE 4 :
- SCAVO DI RIBASSO FINO ALLA QUOTA IDONEA PER LA REALIZZAZIONE DELLA TRAVE AD ANELLO IN C.A. N°4
- PROSECUZIONE SCAVO CON LE MODALITA' DI CUI SOPRA FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL PIANO DI SCAVO FINALE.

FASE 5 :
- REALIZZAZIONE DEL MAGRONE DI PULIZIA
- POSA DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE
- REALIZZAZIONE SOLETTONE DI FONDO IN C.A.

FASE 6 :
- ARMATURA, CASSERATURA E GETTO DELLA DIMA IN C.A. LATO MILANO
- ARMATURA, CASSERATURA E GETTO DELLA DIMA IN C.A. LATO GENOVA
- ARMATURA, CASSERATURA E GETTO DELLE CONTROPARETI FINO ALL'INTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO

FASE 7 :
- DEMOLIZIONE DELLE TRAVI SOTTO LA DIMA INTERFERENTI CON IL FRONTE DI SCAVO LATO MILANO
- ESECUZIONE INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO CONCIO D'ATTACCO LATO MILANO
- DEMOLIZIONE DELLE TRAVI SOTTO LA DIMA INTERFERENTI CON IL FRONTE DI SCAVO LATO GENOVA
- ESECUZIONE INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO CONCIO D'ATTACCO LATO GENOVA

FASE 8 :
- SCAVO A PIENA SEZIONE CONCIO D'ATTACCO (LATO GENOVA)

FASE 9 :
- GETTO DEL CONCIO D'ATTACCO (LATO GENOVA)
- SCAVO SEZIONE D'ATTACCO (LATO MILANO)

FASE 10 :
- GETTO DEL CONCIO D'ATTACCO (LATO MILANO)
- REALIZZAZIONE DEI SOLAI INTERMEDI ALLE QUOTE STABILITE

FASE 11 :
- COMPLETAMENTO DI CONTROPARETI E SOLETTE SECONDO PRESCRIZIONI DI PROGETTO

NOTA BENE

IN CASO DI ANOMALIE GEOMETRICHE NELLA COMPENETRAZIONE DEI DIAFRAMMI A CAUSA DI ERRORI DI VERTICALITA', POTRANNO ESSERE ANTICIPATI I GETTI DELLE CONTROPARETI IN FASE DI SCAVO

LEGENDA

P.F. = PIANO DEL FERRO LINEA A.V./A.C.
P.F.I. = PIANO DEL FERRO INTERCONNESSIONE
P.S. = PIANO DI SCAVO

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ALTA SORVEGLIANZA:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

GENERAL CONTRACTOR:

Consorzio Cociv, Collegamenti Integrati Veloci

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01

TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
PROGETTO DEFINITIVO

INTERCONNESSIONE DI NOVI LIGURE ALTERNATIVA ALLO SHUNT
Camerone e Pozzi di accesso Binario Pari
Pozzo di accesso
Fasi esecutive

GENERAL CONTRACTOR	DIRETTORE LAVORI	SCALA:
Consorzio **Cociv** Ing. E. Pagani		1:200

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
A301	0X	D	CV	B9	GN1BBX	006	C

PROGETTAZIONE

Rev.	Descrizione emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista Integratore	Data	IL PROGETTISTA
A00	Prima emissione	RICCARDI	25/08/2014	ROCKSOIL	27/08/2014	A. Palombo	25/08/2014	Consorzio Cociv Collegamenti Integrati Veloci Ing. E. Pagani Ordine Ingegneri Prov. TO n. 9073 R
B01	Revisione generale	RICCARDI	20/04/2015	ROCKSOIL	22/04/2015	A.Palombo	24/04/2015	
C00	Revisione per istruttoria	RICCARDI	28/07/2015	ROCKSOIL	28/07/2015	A. Mastrapita	28/07/2015	

Vi. Elab.

Nome File: I4383B9 K01-04-D-CV-B9-GN18-B4-B0-00

CUP: F81H92000000008

Scala di plot: 1:1

NOME FILE: I4383B9 K01-04-D-CV-B9-GN18-B4-B0-00 REV. MIE
PLOT: 1:1
PART.
DATA: 22.07.15
