ID	Nome attività
1	**Realizzazione dell'impianto idroelettrico di Budriesse**
2	**Fase 1**
3	Scoticamento dell'area di cantiere
4	Preparazione del cantiere e delle strade di accesso
5	Realizzazione del campo prove per il jet-grouting
6	**Fase 2**
7	Scavo di sbancamento a quota 32,50 m s.l.m.
8	Scavo della rigola per lo scolo delle acque superficiali
9	Realizzazione delle ture a protezione dell'area della centrale e della campata destra
10	Realizzazione di una tura in adiacenza alla sponda sinistra per la realizzazione della spalla definiva
11	Infissione di palancole in alveo e nel corpo delle ture di monte
12	Sistemazione di massi a protezione del piede della tura lato fiume
13	Realizzazione della spalla sinistra dello sbarramento
14	**Fase 3**
15	Realizzazione dei diaframmi nell'area della centrale
16	Realizzazione del taglione e dei pali isolati della campata destra della traversa
17	Realizzazione (con una seconda macchina) del primo tratto del taglione sotto la spalla sinistra
18	**Fase 4**
19	Realizzazione del tappo di fondo di jet-grouting nell'area utilizzando due macchine
20	Realizzazione della parte di valle della scala pesci e del canale di scarico di fondo
21	Realizzazione della fondazione della prima campata dello sbarramento
22	**Fase 5**
23	Scavo all'interno dei diaframmi fino alla quota d'imposta delle fondazioni
24	Realizzazione delle opere profonde all'interno dei diaframmi
25	Montaggio e messa in servizio della campata destra dello sbarramento mobile
26	**Fase 6**
27	Demolizione dei diaframmi a monte e valle fino alla quota di fondo dei canali
28	Rimodellazione della tura di monte con spostamento di parte delle palancole
29	Posa dei tubi e realizzazione della soprastante pista in corrispondenza della campata destra dello sbarramento
30	Spostamento della tura di valle e della rampa di accesso allo scarico della centrale
31	Avanzamento dei lavori nell'area della centrale
32	Realizzazione (parziale) dei canali di carico
33	**Fase 7**
34	Realizzazione del secondo tratto di tura in corrispondenza della campata centrale
35	Infissione di palancole nel corpo e all'estremità della tura in alveo
36	Spostamento dei massi di protezione dalla prima alla seconda campata della tura
37	Realizzazione del secondo tratto del taglione
38	Realizzazione della fondazione della campata centrale dello sbarramento
39	Avanzamento dei lavori nell'area della centrale
40	Completamento del canale di scarico con la formazione delle scogliere
41	**Fase 8**
42	Montaggio e messa in servizio della campata centrale dello sbarramento mobile
43	Completamento dei lavori nell'area della centrale e rinterro della stessa
44	Realizzazione cavidotto di collegamento con ENEL (parte esterna al cantiere)
45	**Fase 9**
46	Asportazione del secondo tratto di tura (e rimozione delle palancole)
47	Posa dei tubi e realizzazione della soprastante pista in corrispondenza della campata centrale dello sbarramento
48	Realizzazione del terzo tratto di tura, a monte della campata sinistra
49	Infissione di palancole nel corpo della tura
50	Inizio montaggi delle apparecchiature elettromeccaniche in centrale
51	**Fase 10**
52	Completamento del taglione in sponda sinistra
53	Realizzazione della fondazione della campata sinistra dello sbarramento
54	Montaggio e messa in servizio della campata sinistra dello sbarramento mobile
55	**Fase 11**
56	Asportazione del terzo tratto di tura (e rimozione delle palancole)
57	Realizzazione della tura a monte del canale di carico
58	**Fase 12**
59	Rimozione delle ture in alveo
60	Recupero dei tubi e posa di parte degli stessi sul tratto terminale del Chiavicone
61	Rimozione della tura di valle
62	**Fase 13**
63	Completamento dei canali di carico
64	Inizio montaggi organi idraulici, paratoie, griglie e sgrigliatore
65	Completamento del cavidotto ENEL
66	**Fase 14**
67	Rimozione della tura di monte
68	Parziale rinterro e sistemazione della sponda destra del Chiavicone
69	Prove e messa in servizio provvisoria dell'impianto
70	**Fase 15**
71	Completamento del rinterro della centrale
72	Rimozione del cantiere
73	Ripristino dello scotico
74	Sistemazioni definitive dell'area di cantiere

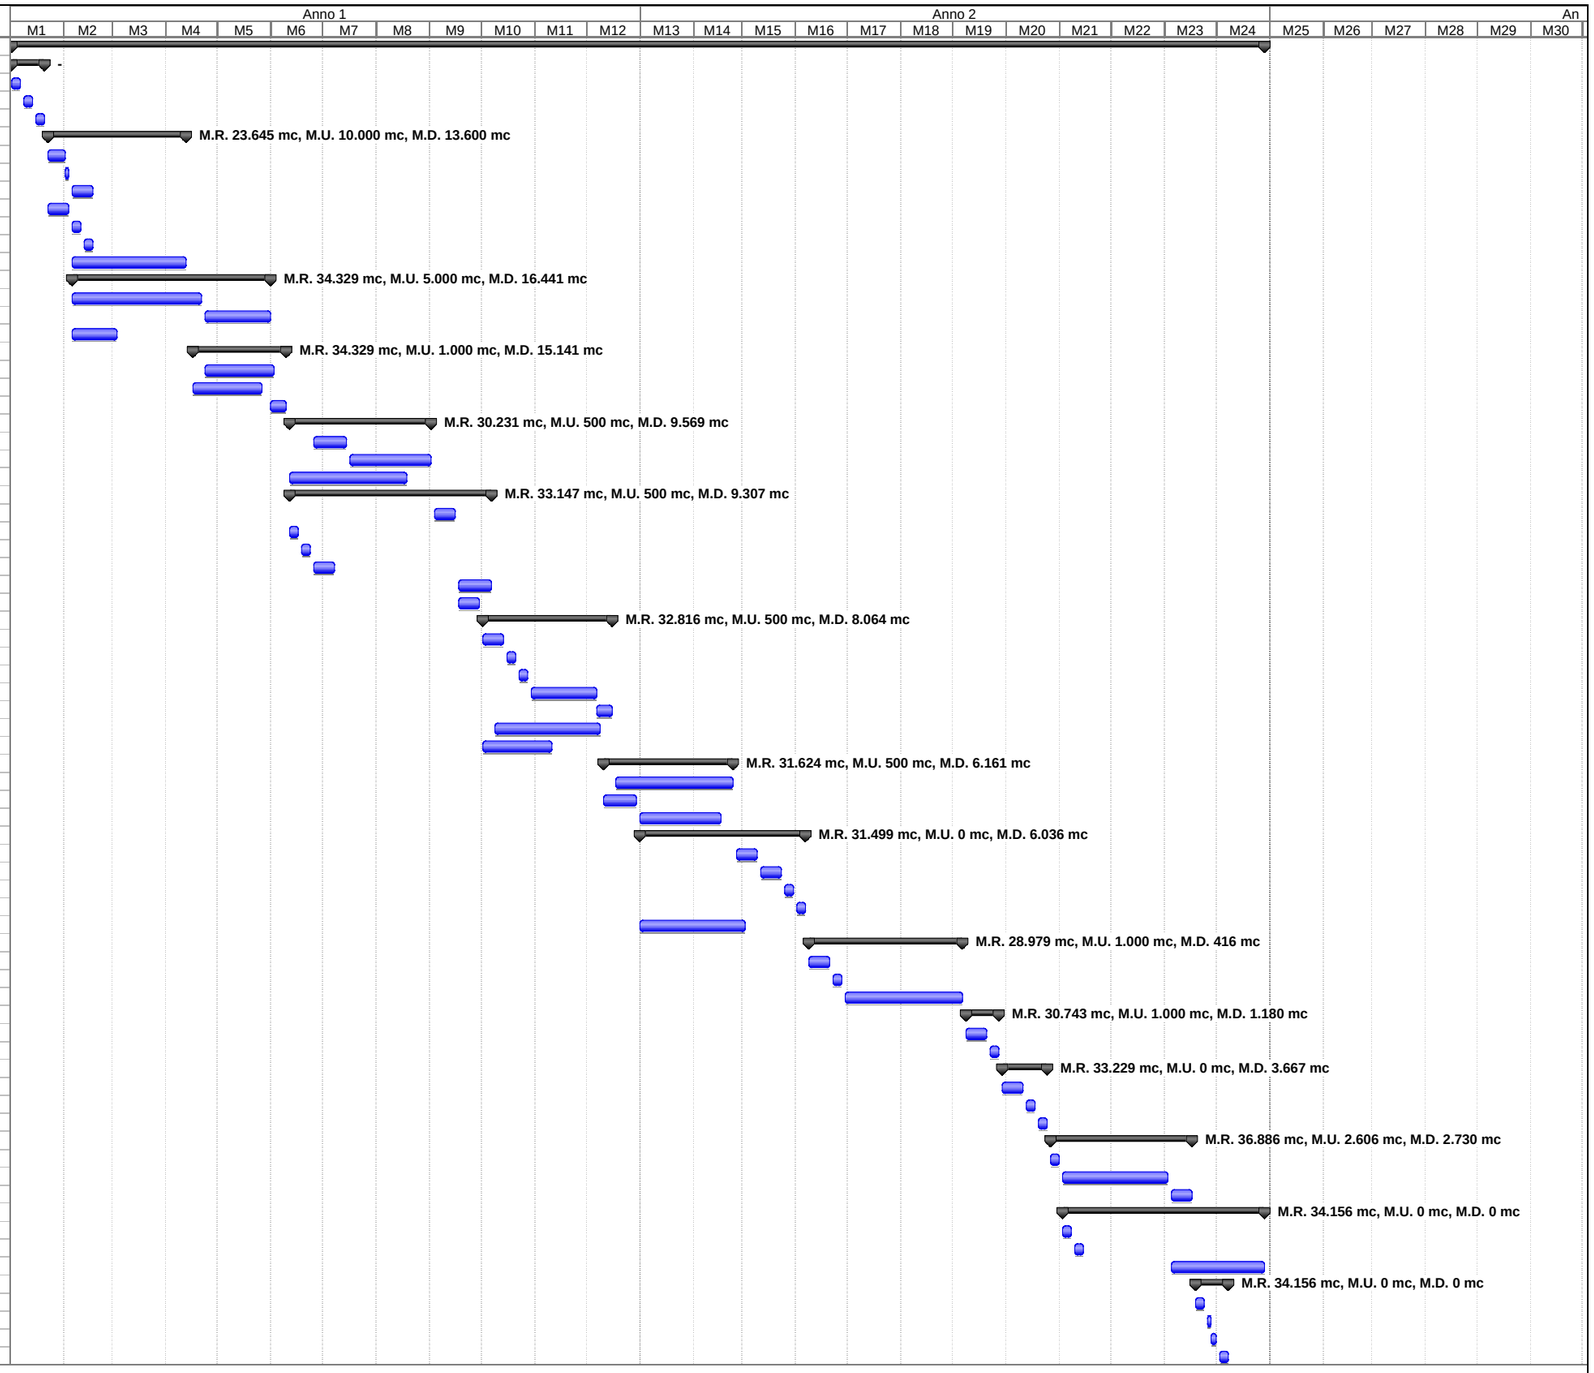

M.R. = materiale di risulta
M.U. = materiale in uscita
M.D. = materiale depositato

Progetto: Fasi di lavoro PdU
Data: ven 25/03/16

Attività · Avanzamento · Riepilogo · Attività esterne · Scadenza
Divisione · Cardine · Riepilogo progetto · Cardine esterno
