Cantiere "Imbocco Ovest Tunnel di Interconnessione"

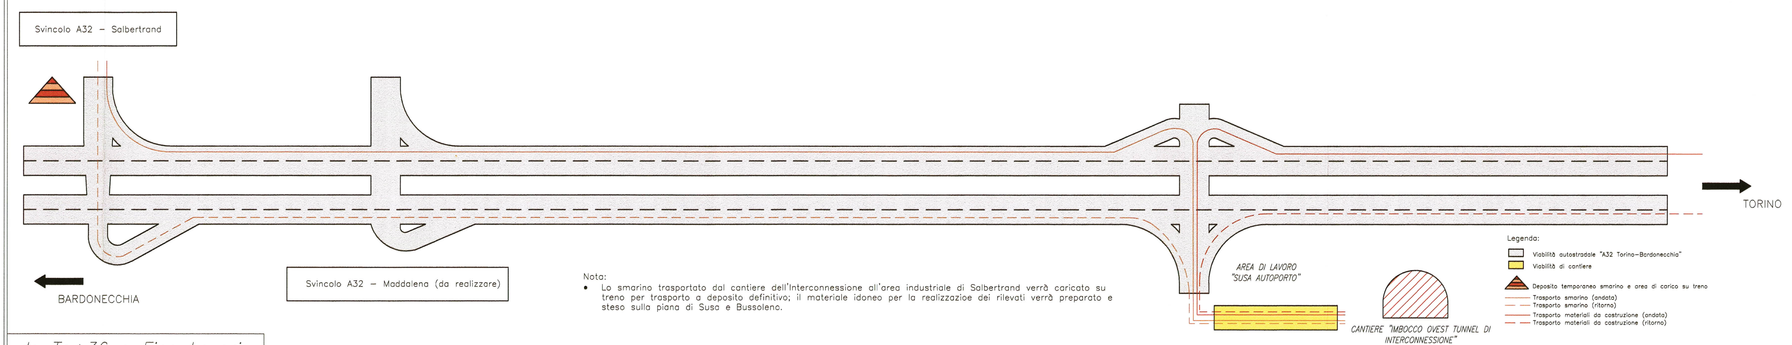

Nota:
- Lo smarino trasportato dal cantiere dell'Interconnessione all'area industriale di Salbertrand verrà caricato su treno per trasporto a deposito definitivo; il materiale idoneo per la realizzazioe dei rilevati verrà preparato e steso sulla piana di Susa e Bussoleno.

da To+36 a Fine Lavori

Tipologia trasporto	C. Tdl OVEST – distanze [km] (riferite all'A.I. di Salbertrand)							
	Andata				Ritorno			
	Autostrada	Ordinaria		Complessivi	Autostrada	Ordinaria		Complessivi
		SS 24	Locale			SS 24	Locale	
Smarino	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0
Materiale vario (cemento, etc.)	*	0.0	0.0	0.0	*	0.0	0.0	0.0

Nota:
- (*) Il chilometraggio lungo la viabilità autostradale per l'approvvigionamento del materiale vario (cemento, etc) è in funzione della posizione del fornitore.

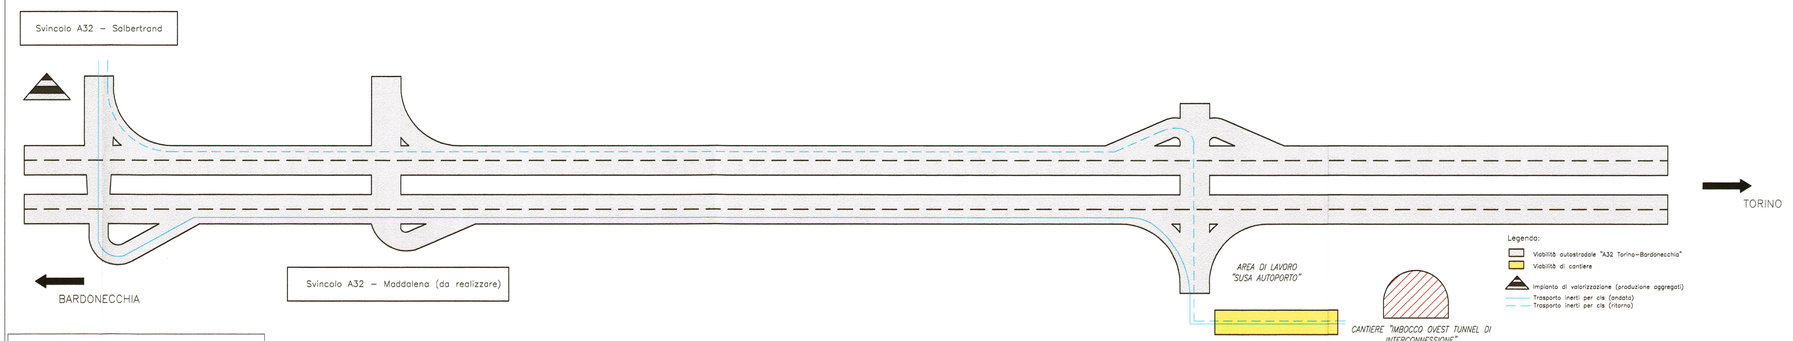

da To+36 a Fine Lavori

Tipologia trasporto	C. Tdl OVEST – distanze [km] (riferite all'A.I. di Salbertrand)							
	Andata				Ritorno			
	Autostrada	Ordinaria		Complessivi	Autostrada	Ordinaria		Complessivi
		SS 24	Locale			SS 24	Locale	
Inerti per cls	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0

Cantiere "Imbocco Est Tunnel di Interconnessione"

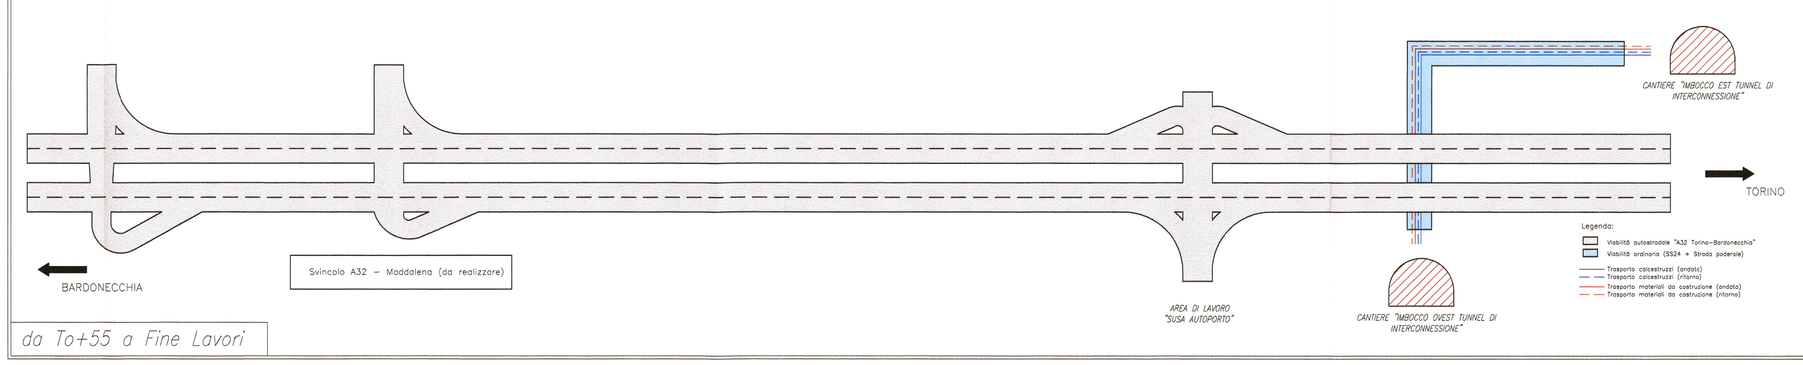

da To+55 a Fine Lavori

Tipologia trasporto	C. Tdl EST – distanze [km] (riferite al C. Tdl OVEST)							
	Andata				Ritorno			
	Autostrada	Ordinaria		Complessivi	Autostrada	Ordinaria		Complessivi
		SS 24	Locale			SS 24	Locale	
Materiale vario (cemento, etc.)	0.0	2.6	0.5	3.1	0.0	2.6	0.5	3.1
Calcestruzzi	0.0	2.6	0.5	3.1	0.0	2.6	0.5	3.1

Cantiere "INNESTO BUSSOLENO"

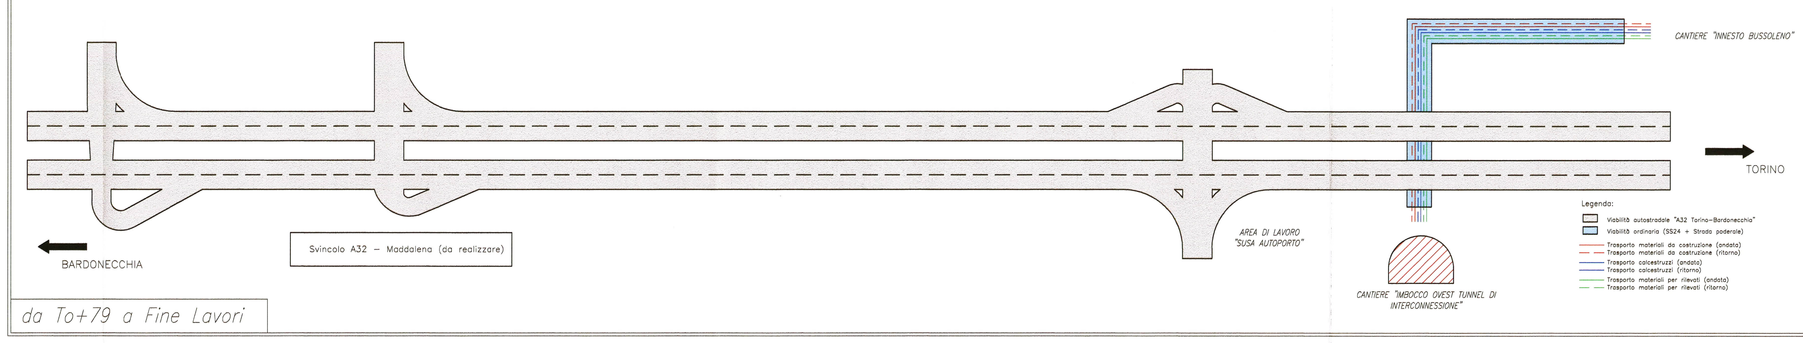

da To+79 a Fine Lavori

Tipologia trasporto	C. INN. BUSSOLENO – distanze [km] (riferite al C. Tdl OVEST)							
	Andata				Ritorno			
	Autostrada	Ordinaria		Complessivi	Autostrada	Ordinaria		Complessivi
		SS 24	Locale			SS 24	Locale	
Materiale vario (cemento, etc.)	0.0	3.7	1.0	4.7	0.0	3.7	1.0	4.7
Calcestruzzi	0.0	3.7	1.0	4.7	0.0	3.7	1.0	4.7
Materiali per rilevati	0.0	3.7	1.0	4.7	0.0	3.7	1.0	4.7

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO / DOCUMENTS DE REFERENCE

- PRV_C3A_TS3_6010_CANTIERIZZAZIONE - RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA LATO ITALIA
- PRV_C3A_TS3_6431_CANTIERE "MADDALENA"
- PRV_C3A_TS3_da 7638 a 7640_CANTIERI "AREA SUSA" E "IMBOCCO OVEST Tdl"
- PRV_C3A_TS3_7833e7834_CANTIERE "IMBOCCO EST TUNNEL DI BASE"
- PRV_C3A_TS3_7870e7871_CANTIERE "IMBOCCO EST Tdl" e "INNESTO BUSSOLENO"
- PRV_C3A_TS3_6485_DOSSIER FASI REALIZZATIVE
- PRV_C3A_TS3_7861_CANTIERE "SALBERTRAND"
- PRV_C3A_TS3_6020_PLANIMETRIA GENERALE FASI DI OCCUPAZIONE DELLE AREE DI CANTIERE
- PRV_C3A_TS3_6034e6035_VIABILITA' DI ACCESSO AI CANTIERI
- PRV_C3A_TS3_7754_PLANIMETRIA FLUSSI MATERIALI

TUNNEL EURALPIN LYON TURIN

LIAISON LYON - TURIN / COLLEGAMENTO TORINO - LIONE

Partie commune franco-italienne
Section transfrontalière

Parte comune italo-francese
Sezione transfrontaliera

NOUVELLE LIGNE LYON TURIN - NUOVA LINEA TORINO LIONE
PARTIE COMMUNE FRANCO-ITALIENNE - PARTE COMUNE ITALO-FRANCESE

PARTE IN TERRITORIO ITALIANO - PROGETTO IN VARIANTE
(OTTEMPERANZA ALLA PRESCRIZIONE N. 235 DELLA DELIBERA CIPE 19/2015)

CUP C11J05000030001 - PROGETTO DEFINITIVO

GENIE CIVIL - OPERE CIVILI
CONSTRUCTION - COSTRUZIONE
GENERALITES - ELABORATI GENERALI
COTE ITALIE - LATO ITALIA
SCHEMAS D'ACCES ET CIRCULATION
SCHEMI DI ACCESSO E CIRCOLAZIONE
Plan 2/2 - Tavola 2/2

Indice	Date / Data	Modifications / Modifiche	Etabli par / Concepito da	Vérifié par / Controllato da	Autorisé par / Autorizzato da
0	23/11/2012	Première diffusion Prima diffusione	D. GALLINA (LOM)	M. RUSSO C. OGNIBENE	L. CHANTRON M. PANTALEO
A	31/01/2013	Révision suite aux commentaires LTF Revisione a seguito commenti LTF	D. GALLINA (LOM)	M. RUSSO C. OGNIBENE	L. CHANTRON M. PANTALEO
B	13/01/2017	Première diffusion phase PRF-PRV / Prima emissione fase PRF-PRV	C. RINALDI (LOM) R. SALSA (LOM)	F. MAGNORFI C. OGNIBENE	L. CHANTRON A. MORDASINI
C	22/03/2017	Révision suite aux commentaires TELT Revisione a seguito commenti TELT	C. RINALDI (LOM) R. SALSA (LOM)	F. MAGNORFI C. OGNIBENE	L. CHANTRON A. MORDASINI

Code Doc	P	R	V	C	3	A	T	S	3	6	0	3	2	C	A	P	P	L	A
	Phase / Fase			Sigle étude / Sigla			Emetteur / Emittente			Numéro				Indice	Statut / Stato			Type / Tipo	

ADRESSE GED / INDIRIZZO GED	C3A	//	//	33	01	02	20	02

ÉCHELLE / SCALA: -

TELT sas - Savoie Technolac - Bâtiment "Homère" -
13 allée du Lac de Constance - 73370 LE BOURGET DU LAC (France)
Tél.: +33 (0) 4.79.68.56.50 - Fax: +33 (0) 4.79.68.56.75
RCS Chambéry 439 556 952 - TVA FR 03439556952

Propriété TELT Tous droits réservés - Proprietà TELT Tutti i diritti riservati

Ce projet bénéficie d'une aide financière européenne (SG-TREN)

Questo progetto beneficia di un aiuto finanziario europeo (SG-TEN)
