NOTE

FASE 1.1.2 - Sublotto 1 (AR_FASE02)

Interventi:

- Frasso Telesino, allacciamenti nuovo binario su sede del pari di progetto
- Telese, allacciamento deviazione provvisoria su 3°-4° binario di stazione e allacciamento di questi lato Benevento.
- Telese:
- demolizioni primo e secondo binario, realizzazione nuovi binari di progetto ed attrezzaggio nuova linea con accesso di cantiere dalla stazione di Telese e attraversamento torrente Portella su nuovo ponte ferroviario.
- Completamento primo e secondo marciapiede
- lato Benevento, realizzazione sede binario dispari, in affiancamento binario in esercizio.

Esercizio:

- Esercizio a semplice binario tra Frasso Telesino e Vitulano alla velocità di tracciato attuale di 125 - 100 km/h; servizio viaggiatori ad Amorosi attuale ed a Telese sul terzo e quarto binario, abilitata a solo posto d'incrocio e servizio viaggiatori effettuato su nuovo terzo marciapiede servito da sottopassaggio.

Legenda progetto

Binario esistente	
Binario di progetto realizzato in fase corrente	
Binario di progetto realizzato in fasi precedenti	
Binario in demolizione	
Binario provvisorio realizzato in fase corrente	
Binario provvisorio realizzato in fase precedente	
Opere esistenti	
Opere civili di progetto realizzate in fase corrente	
Opere civili di progetto realizzate in fasi precedenti	

QUADRO D'UNIONE

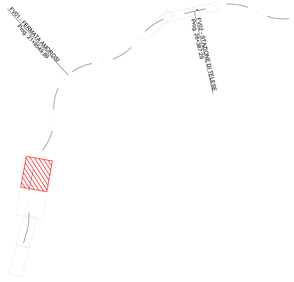

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE:

PIZZAROTTI FONDATA NEL 1910 · Ghella · ITINERA · SALCEF CONSTRUCTION · JEdS INFRASTRUTTURE

PROGETTAZIONE:	PROGETTISTA:	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE:
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI GEODATA ENGINEERING · INTEGRA · RINA	Ing. Natale Lanza	Ing. PIERGIORGIO GRASSO Responsabile integrazione fra le varie discipline specialistiche Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli n. 9729

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI-BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO – BENEVENTO
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO
1° LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – TELESE

ARMAMENTO
Fasi
Elaborati tracciato Sublotto 01 -Planimetria Fase 1.1.2 TAV 3/4

APPALTATORE
RTI **ENGINEERING ITALIANA S.r.l.**
IL DIRETTORE TECNICO
Ing. S. Del Balzo
23/06/2020

SCALA: 1:1000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IF26	12	E	ZZ	P7	SF0100	007	C

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMISSIONE	Marco Venturini	21/11/2019	Alessandra Parisi	21/11/2019	Piergiorgio Grasso	21/11/2019	Ing. Natale Lanza
B	AGGIORNAMENTO RILIEVI	Marco Venturini	24/02/2020	Ginevra Rossetti	24/02/2020	Piergiorgio Grasso	24/02/2020	
C	Revisione a seguito di istruttoria ITF	Marco Venturini	23/06/2020	Ginevra Rossetti	23/06/2020	Piergiorgio Grasso	23/06/2020	23/06/2020

File: IF26.1.2.E.ZZ.P7.SF.01.0.0.007.C.dwg

n. Elab.: -
