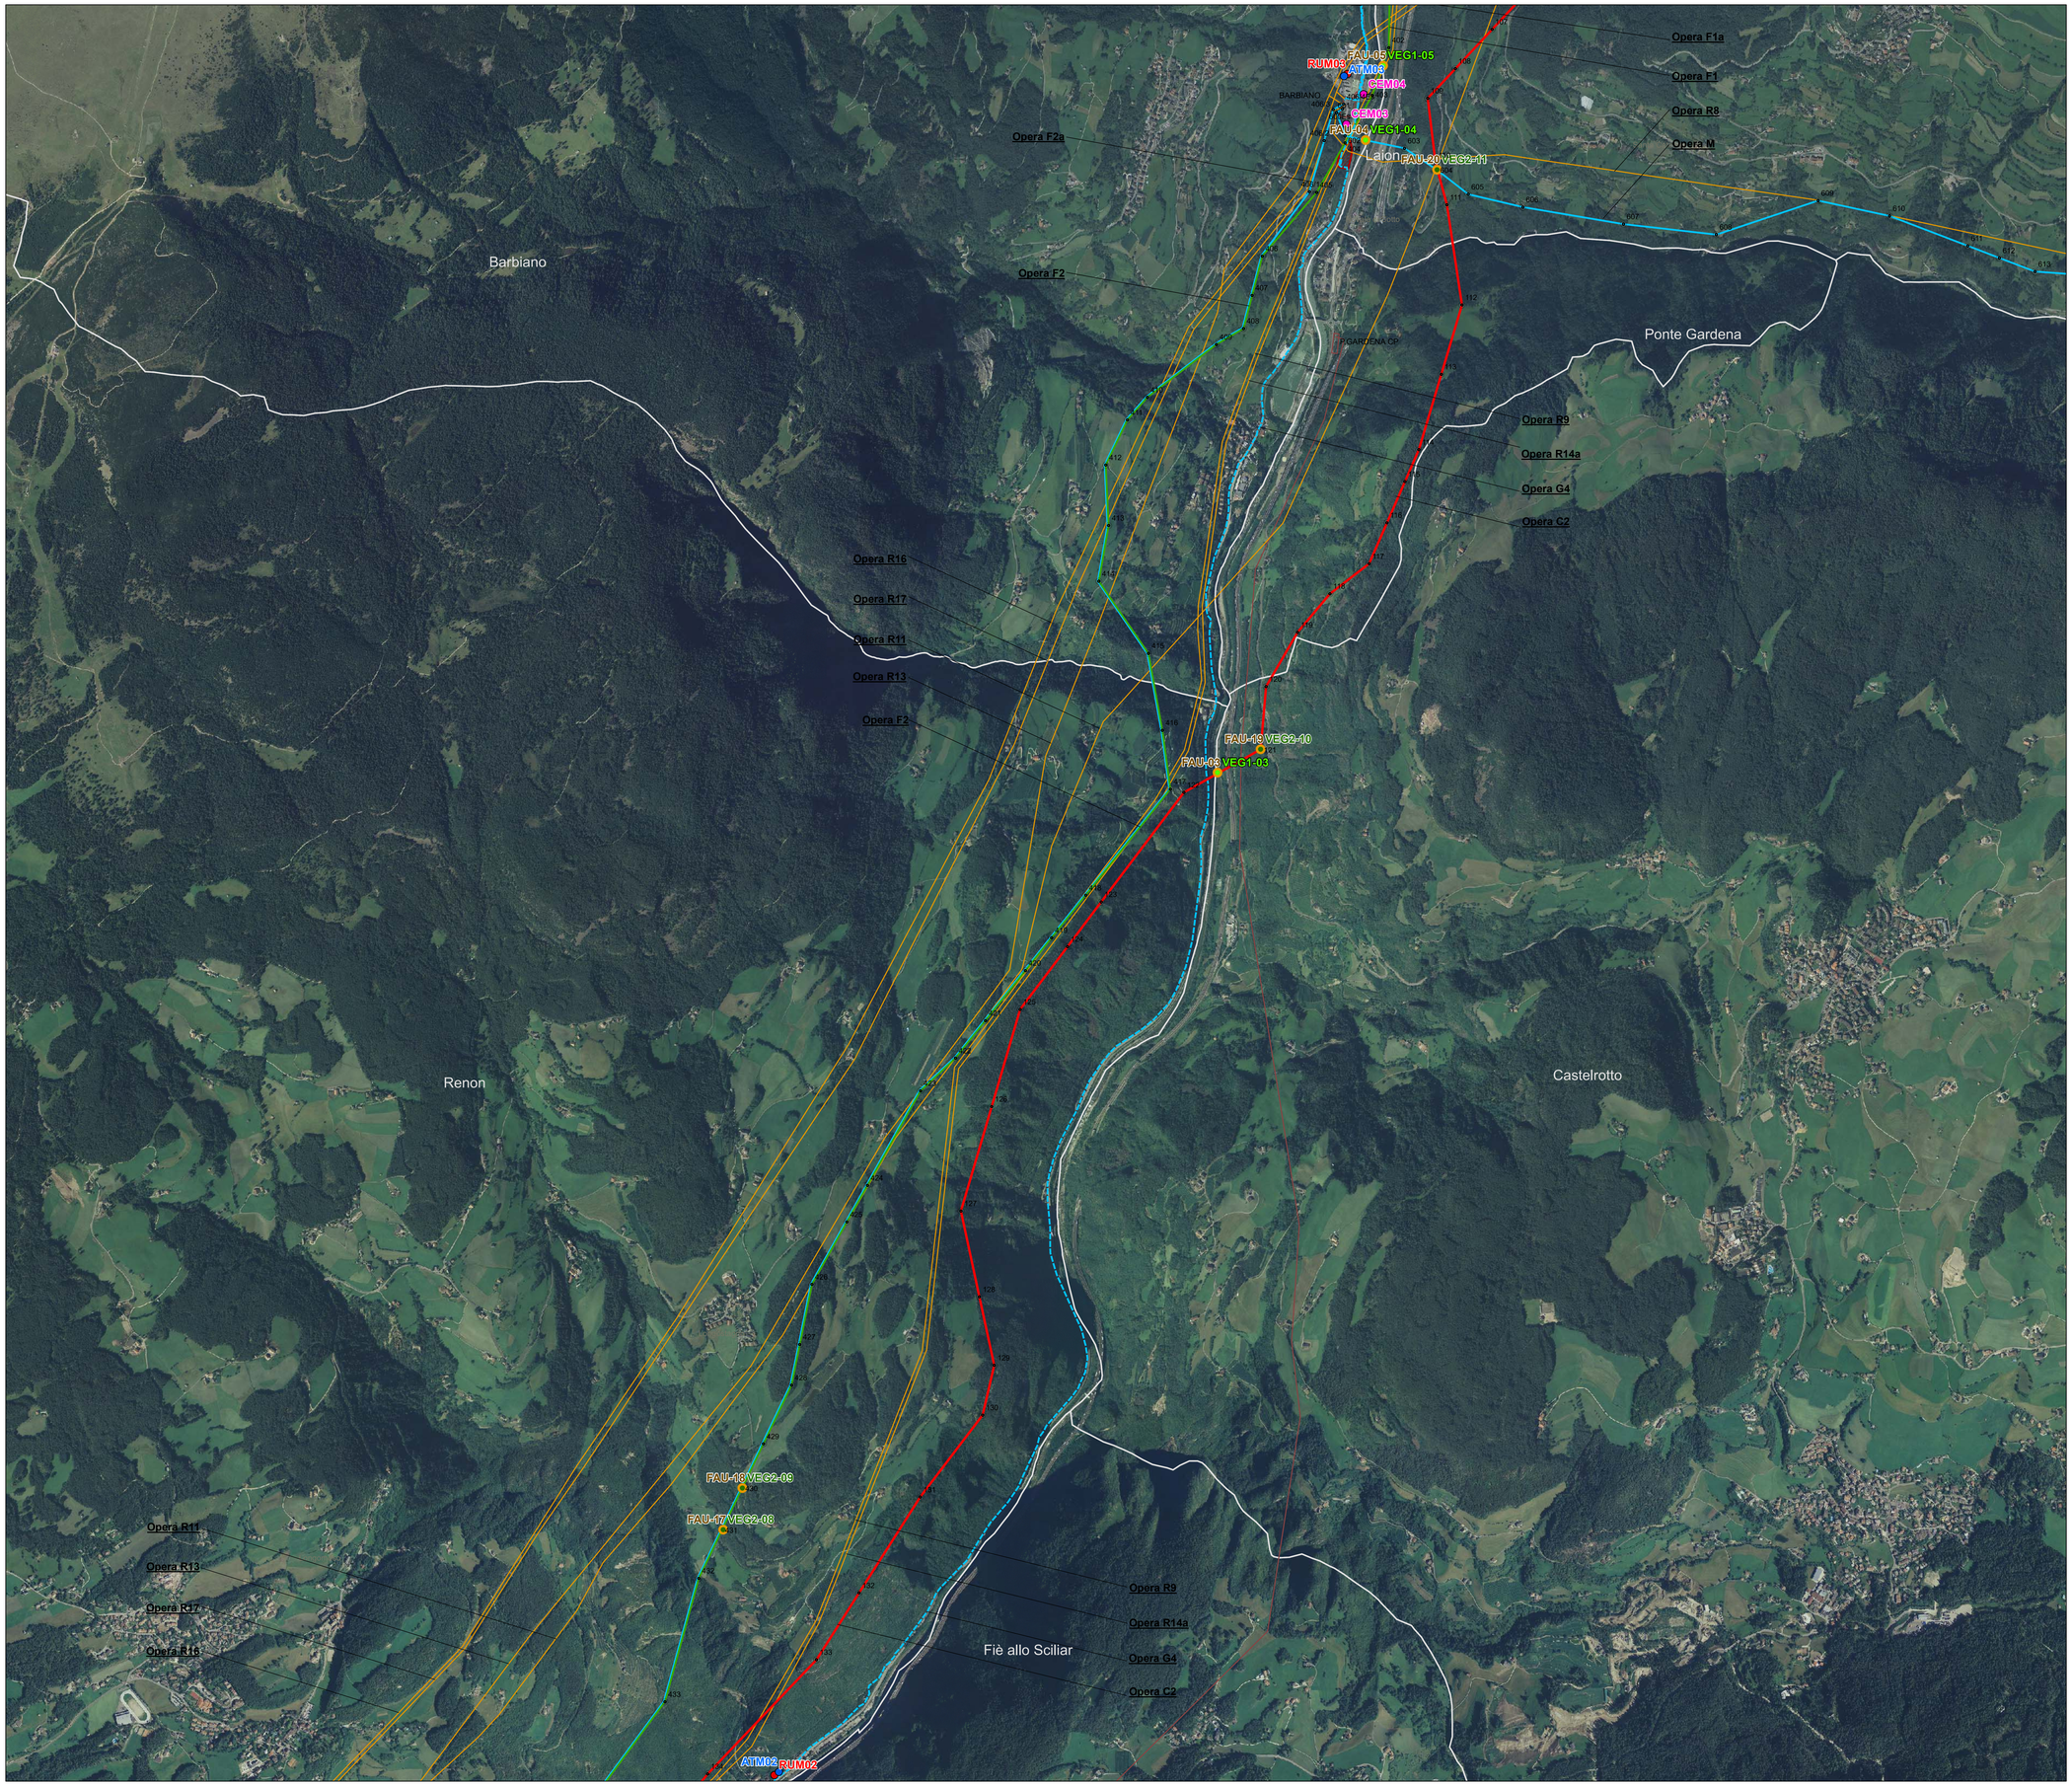

Legenda

Opere in progetto

- Elettrodotto aereo 220/132 kV DT
- Elettrodotto aereo 220 kV ST resiliente
- Elettrodotto aereo 220 kV ST
- Elettrodotto 220 kV resiliente in cavo interrato
- Elettrodotto 220 kV in cavo interrato
- Elettrodotto aereo 132 kV ST
- Elettrodotto 132 kV in cavo interrato
- Elettrodotto aereo 132 kV in demolizione
- Elettrodotto in cavo interrato 132 kV in demolizione
- Nuova Stazione Elettrica
- Modifica a Stazione Elettrica esistente

Opere in progetto oggetto di altro iter autorizzativo

Stazione Elettrica 132 kV di Albes e raccordi

- Nuova Stazione Elettrica di Albes
- Elettrodotto 132 kV in cavo interrato
- Elettrodotto aereo 132 kV in demolizione

Stazione Elettrica RFI

- Nuova Stazione Elettrica RFI

Cabina Primaria Edyna

- Nuova Cabina Primaria Edyna

Opere esistenti

- Elettrodotto esistente
- Stazione Elettrica esistente

Altra simbologia

- Confini comunali

Piano di Monitoraggio Ambientale

Punti di monitoraggio

- ATM-n Atmosfera
- CEM-n Campi elettromagnetici
- RUM-n Rumore
- FAU-n Fauna
- VEG1-n Vegetazione
- VEG2-n Vegetazione

Programma delle attività della componente ATM

Postazione	Comune	Fase	Durata	Frequenza
ATM01	Bolzano	Ante-operam	14 giorn	Una tantum
		Corso d'Opera	14 giorn	Una tantum (durante il periodo di massimo impatto)
ATM02	Renon	Ante-operam	14 giorn	Una tantum
		Corso d'Opera	14 giorn	Una tantum (durante il periodo di massimo impatto)
ATM03	Barbiano	Ante-operam	14 giorn	Una tantum
		Corso d'Opera	14 giorn	Una tantum (durante il periodo di massimo impatto)
ATM04	Chiusa	Ante-operam	14 giorn	Una tantum
		Corso d'Opera	14 giorn	Una tantum (durante il periodo di massimo impatto)
ATM05	Bressanone	Ante-operam	14 giorn	Una tantum
		Corso d'Opera	14 giorn	Una tantum (durante il periodo di massimo impatto)
ATM06	Forlezza	Ante-operam	14 giorn	Una tantum
		Corso d'Opera	14 giorn	Una tantum (durante il periodo di massimo impatto)
ATM07	Forlezza	Ante-operam	14 giorn	Una tantum
		Corso d'Opera	14 giorn	Una tantum (durante il periodo di massimo impatto)

Programma delle attività della componente RUM

Postazione	Comune	Fase	Durata	Frequenza
RUM01	Bolzano	Ante-operam	24 ore	Una tantum
RUM02	Renon		24 ore	Una tantum
RUM03	Barbiano		24 ore	Una tantum
RUM04	Chiusa		24 ore	Una tantum
RUM05	Bressanone		24 ore	Una tantum
RUM06	Bressanone		24 ore	Una tantum
RUM07	Rio di Pusteria		24 ore	Una tantum
RUM08	Forlezza		24 ore	Una tantum
RUM09	Forlezza		24 ore	Una tantum
RUM01	Bolzano	Corso d'Opera	24 ore	Una tantum
RUM02	Renon		24 ore	Una tantum
RUM03	Barbiano		24 ore	Una tantum
RUM04	Chiusa		24 ore	Una tantum
RUM05	Bressanone		24 ore	Una tantum
RUM06	Bressanone		24 ore	Una tantum
RUM07	Rio di Pusteria		24 ore	Una tantum
RUM08	Forlezza		24 ore	Una tantum
RUM09	Forlezza		24 ore	Una tantum

Programma delle attività della componente CEM

Postazione	Comune	Fase	Durata	Frequenza
CEM01	Bolzano	AO	SPOT	Una tantum
		PO	24h	Una tantum
CEM02	Bolzano	AO	SPOT	Una tantum
		PO	24h	Una tantum
CEM03	Barbiano	AO	SPOT	Una tantum
		PO	24h	Una tantum
CEM04	Barbiano	AO	SPOT	Una tantum
		PO	24h	Una tantum
CEM05	Chiusa	AO	SPOT	Una tantum
		PO	24h	Una tantum
CEM06	Bressanone	AO	SPOT	Una tantum
		PO	24h	Una tantum
CEM07	Forlezza	AO	SPOT	Una tantum
		PO	24h	Una tantum
CEM08	Forlezza	AO	SPOT	Una tantum
		PO	24h	Una tantum
CEM09	Forlezza	AO	SPOT	Una tantum
		PO	24h	Una tantum
CEM10	Forlezza	AO	SPOT	Una tantum
		PO	24h	Una tantum

Programma delle attività della componente FAU

Indagini	FASI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Indagine avifaunistica (punti di ascolto)	AO PO				X	X	X	X		X	X		
Rilevamenti mortalità uccelli	PO				X	X				X	X		

Programma delle attività della componente VEG

Indagini	FASI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
VEG1 Boschi ripariali	AO PO						X	X	X				
VEG2 Specie vegetali protette e invasive	AO CO PO					X		X					
VEG3 Impianti arboreo-arbustivi	PO									X	X		
VEG4 Rinverdimenti	PO									X	X		

QUADRO DI UNIONE



N

Sistema di riferimento
WGS 1984 UTM Zone 32N

0 100 200 400 600 800 1.000 Meters

	N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO
ESTERNO	00	15/10/2021	Prima emissione	F. Ventura

	N.	DATA	DESCRIZIONE	ESAMINATO	ACCETTATO
REVISIONE	00	15/10/2021	Prima emissione	L. Fasciani GPI-DVP-ATS	N. Rinaldo GPI-DVP-ATS

NUMERO E DATA ORDINE: 3000069066 / 15.04.2019

MOTIVO DELL'INVIO: [X] PER ACCETTAZIONE [ ] PER INFORMAZIONE

CODIFICA ELABORATO: **DGCR19001B2316001**

Terna Rete Italia — TERNA GROUP

TITOLO ELABORATO

Riassetto della RTN in Val di Isarco per connessione BBT

Piano di Monitoraggio Ambientale

Planimetria dei punti di monitoraggio - 7 di 9

TIPOLOGIA ELABORATO: Disegno

PROGETTO: TE-CR-19-001

NOME DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO
DGCR19001B2316001_7DI9	1 unità = 10 metri	A0	1:10.000	7/9

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna SpA e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna SpA.

This document contains information proprietary to TERNA S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of TERNA S.p.A. is prohibit.
