LAYOUT DI CANTIERE IN STRADA PROVINCIALE

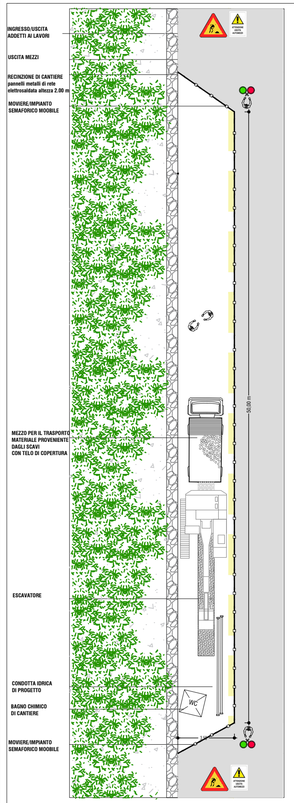

LAYOUT DI CANTIERE IN STRADA COMUNALE

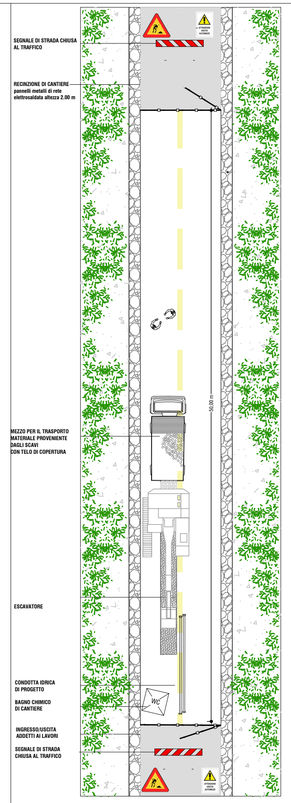

LAYOUT DI CANTIERE IN SEDE PRORPIA

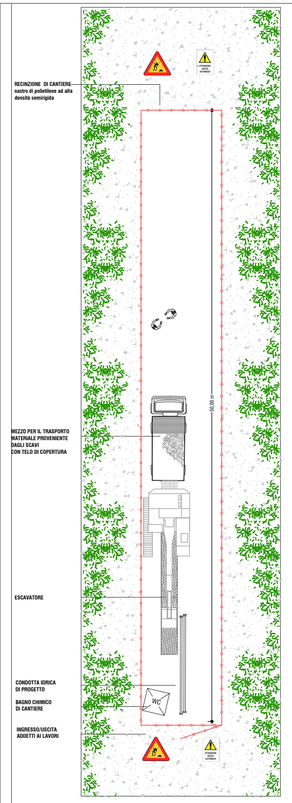

STRADE CON LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA OLTRE I 5.5m

- Si prevede di occupare la sede stradale per una larghezza massima di 3,5 m e di lasciare al transito dei mezzi una larghezza massima di 2.
- Installazione del senso unico alternato gestito dall'impianto semaforico mobile e/o movieri.
- Per l'esecuzione degli attraversamenti stradali si prevede di operare prima occupando una corsia di marcia. A tubazione posata e scavo richiuso si porranno in opera pedane di scavalco carrabili per evitare l'interruzione del traffico durante l'esecuzione dello scavo nell'altra corsia di marcia.

STRADE CON LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA MAGGIORE DI 3 m E INFERIORE A 5.5 m

- Si prevede di occupare la sede stradale per una larghezza massima di 2,4 m e di lasciare al transito dei mezzi una larghezza massima di 2
- Installazione del senso unico alternato gestito dall'impianto semaforico mobile e/o movieri.

STRADE CON LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA MAGGIORE DI 3 m E INFERIORE A 4.5 m

- Si prevede di occupare la tutta le sede stradale chiudendo la medesima al traffico.

* L'apposizione della segnaletica di cantiere lungo le strade oggetto di intervento dovrà seguire il DM 22.01.2019 ed i relativi allegati con particolare riferimento alle procedure di apposizione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che saranno svolte in presenza di traffico veicolare.

PLANIMETRIA SU BASE AEROFOTOGRAMMETRICA
scala 1:5.000

LAYOUT DI CANTIERE BASE

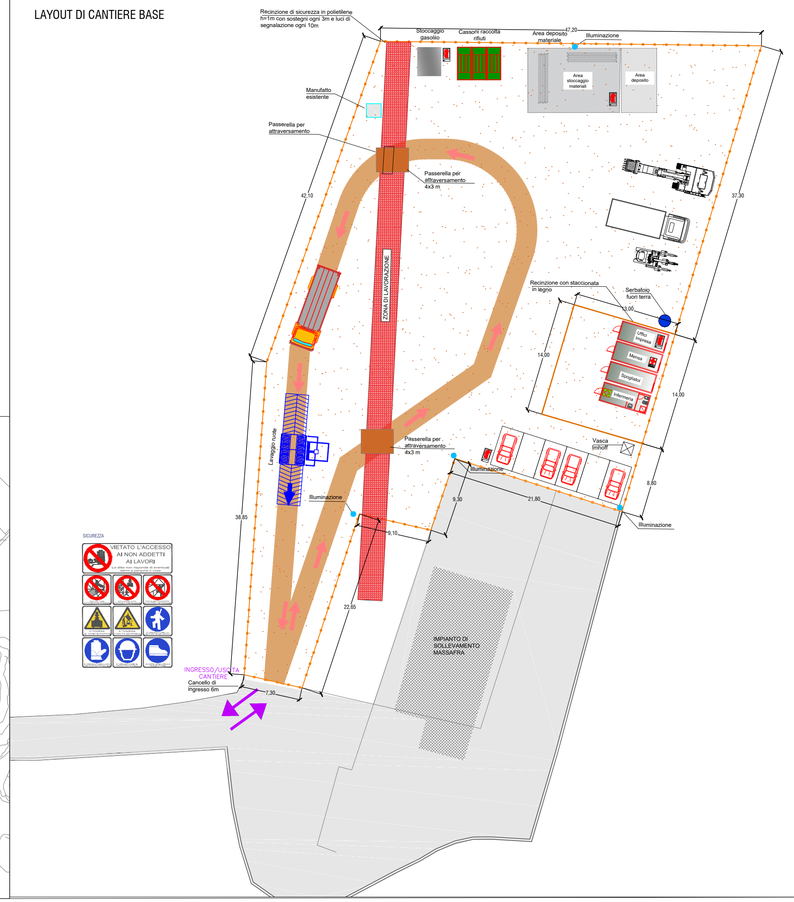

CONSORZIO DI BONIFICA
TERRE D'APULIA

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'ACQUEDOTTO RURALE DELLA MURGIA - SCHEMA SUD -

PROGETTO ESECUTIVO

Progettista:

ARKE' Ingegneria s.r.l.
Via Imperatore Traiano n.4 - 70124 Bari

Prof. Ing. Alberto Ferruccio PICCININI
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n.7288

Dott. Ing. Giovanni VITONE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n.3313

Dott. Ing. Gioacchino ANGARANO
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n.5970

Dott. Ing. Luigi FANELLI
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n.7428

Dott. Ing. Stefano FRANCAVILLA
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n.4927

Responsabile del Procedimento:

Dott. Ing. Marta BARILE

Codice: C08.5

Elaborato: PSC - Planimetria organizzazione cantiere

REV	DATA	NOTE	SCALA	
4	GIUGNO - 2022	Emesso per Riscontro Verifica		
3	GENNAIO - 2022	Emesso per PUA		
0	MAGGIO - 2019	Emesso per Progetto Esecutivo	020 - ARM - PSCP	Dwg
			COD.ELABORATO	
