FASE 0

FASE 1

FASE 2

FASE 3

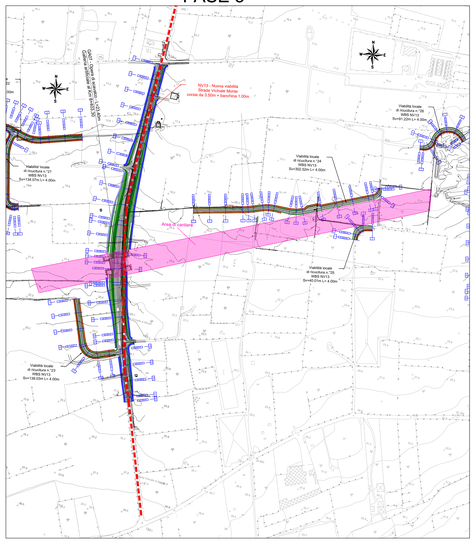

FASE 0 (stato dei luoghi):
- Strada Vicinale Monte è aperta.
- La nuova viabilità NV12 e le relative viabilità di ricucitura, sono state già realizzate.

FASE 1:
- Strada Vicinale Monte è aperta.
- Realizzazione delle viabilità di ricucitura n°21, n°22, n°23, n°24, n°25 e n°26.

FASE 2:
- Strada Vicinale Monte è interrotta.
- Traffico stradale deviato sulle viabilità esistenti, sulle viabilità di ricucitura realizzate e sulla Nuova Viabilità NV12 precedentemente realizzata;
- Realizzazione della Nuova Viabilità NV13 e della relativa opera di attraversamento della linea ferroviaria di progetto.

FASE 3:
- Strada Vicinale Monte è aperta.
- Realizzazione della nuova linea ferroviaria.

Legenda

- Circolazione durante i lavori
- Assi viabilità di ricucitura
- Viabilità esistente
- Area di cantiere

SEGNALETICA TEMPORANEA.
Preliminarmente all'attivazione delle deviazioni provvisorie sarà cura e onere dell'appaltatore, prevedere l'installazione della segnaletica stradale temporanea orizzontale e verticale, in linea con quanto previsto nel D.Lgs n.285 del 92 e s.m. (art. 21), nel relativo Regolamento di Attuazione D.P.R.16/12/1992 n. 495 (art. 30), nel D.M. del 10/07/2002 Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento stradale temporaneo e secondo le indicazioni impartite dall'ufficio tecnico competente dell'ente gestore dell'infrastruttura.

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
DIREZIONE INVESTIMENTI
UNITÀ TECNICA INVESTIMENTI
DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE:

DI AGOSTINO COSTRUZIONI GENERAL

PROGETTAZIONE:

MANDATARIA ipa MANDANTE TECHNITAL HUB

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA BARI-LECCE - RIASSETTO NODO DI BARI

TRATTA A SUD DI BARI

VARIANTE DI TRACCIATO TRA BARI C.LE E BARI TORRE A MARE

ELABORATI VIABILITA'

NV13 - Nuova viabilità Strada Vicinale Monte km 8+403,30

Planimetria fasi con individuazione della viabilità alternativa

APPALTATORE	PROGETTAZIONE		SCALA:
DIRETTORE TECNICO Ing. Antonio Di Agostino Ordine Ingegneri Provincia di Bari n. 4344	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Ing. MARCO RASIMELLI		1:2.000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IA3S	01	E	ZZ	P6	NV13 0 0	0 0 1	E

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione	G. Di Stefano	Mag. 2021	G. Di Stefano	Mag. 2021	M. Rasimelli	Mag. 2021	M. Rasimelli Mag. 2021
B	Revisione a seguito CdS	G. Di Stefano	Ott. 2021	G. Di Stefano	Ott. 2021	M. Rasimelli	Ott. 2021	
C	Revisione a seguito CdS	G. Di Stefano	Feb. 2022	G. Di Stefano	Feb. 2022	M. Rasimelli	Feb. 2022	
D	Revisione a seguito CdS	G. Di Stefano	Giugno 2022	G. Di Stefano	Giugno 2022	M. Rasimelli	Giu. 2022	
E	Revisione a seguito CdS	G. Di Stefano	Ottobre 2022	G. Di Stefano	Ottobre 2022	M. Rasimelli	Ottobre 2022	

File: IA3S01EZZP6NV1300001E

Firmato digitalmente da
Marco Rasimelli
O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia
C = IT
