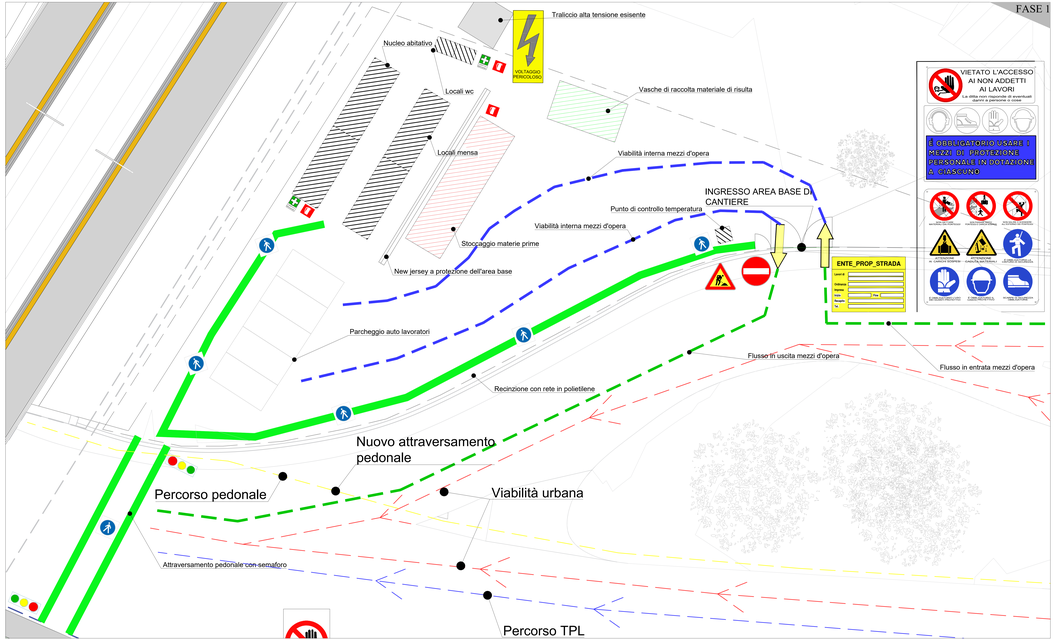

■ ACCANTIERAMENTO 1:100

1. Installazione recinzioni /delimitazioni di cantiere, segregazione aree di lavoro
2. Realizzazione accessi sile aree di cantiere
3. Posa in opera cartellonistica generale di sicurezza e infografica COVID - 19
4. Apposizione cartellonistica di sicurezza, su viabilità aperta al transito
5. Approvvigionamento e installazione prefabbricati uso ufficio, spogliatoio, deposito
6. Approvvigionamento e installazione WC chimici
7. Predisposizione aree di stoccaggio materiale e ricovero mezzi

■ INTERVENTI SU AREE ESTERNE (Area Sud-Est) 1:200

FASE 1 Individuazione percorsi (pedonali-carrabili, realizzazione opere impiantistiche e sistemazione superficiale.
FASE 2 Realizzazione pavimentazioni ed installazione elementi di arredo urbano.
FASE 3 Messa a dimora sistemature verde urbano

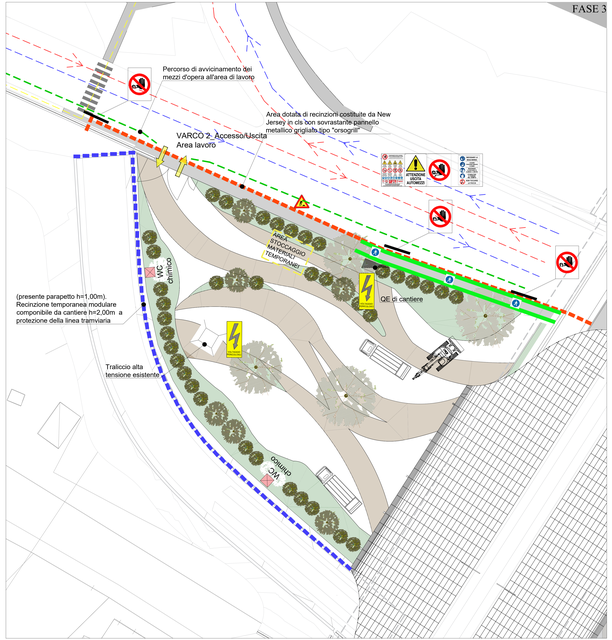

■ INTERVENTI SU AREE ESTERNE (Area Ovest Ferrovia) 1:200

FASE 1 Individuazione percorsi (pedonali-carrabili, realizzazione opere impiantistiche e sistemazione superficiale.
FASE 2 Realizzazione pavimentazioni ed installazione elementi di arredo urbano.
FASE 3 Messa a dimora sistemature verde urbano

LEGENDA:

- Cassetta di primo soccorso e estintori
- Cartellonistica ed infografica sicurezza di cantiere
- Ingressi e varchi di accesso alle aree di intervento e sottocantieri operativi
- Delimitazioni area di intervento
- Delimitazioni area di intervento con sistemi modulari h=2,00m
- Delimitazioni con recinzione in polietilene h=1,50m
- Installazione WC chimici
- Cisterna d'acqua
- Limiti di velocità interni all'area di cantiere e percorsi carrabile (5 Km/h)
- Area da destinare a sistema lavanuvole e mezzi prima della nemmissione nella viabilità ordinaria
- Quadro elettrico principale
- Percorsi pedonale

■ KEYPLAN
Individuazione area base

COMMITTENTE
RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
DIREZIONE STAZIONI - INGEGNERIA E INVESTIMENTI STATIONS

PROGETTAZIONE
ORGANIZZAZIONE
MANDATARIA
NET ENGINEERING S.P.A.

MANDANTE (per gli progettisti)
ALPINA S.P.A. — CORIP S.R.L. — PROGIN S.P.A.

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

INVESTIMENTI STAZIONI AREA CENTRO-NORD

PROGETTO DEFINITIVO

NUOVA FERMATA DI FIRENZE GUIDONI

Progettazione Definitiva della nuova fermata di Firenze Guidoni

CANTIERIZZAZIONE E SICUREZZA

Planimetria fasi di cantiere

SCALA: Varie

COMMESSA	LOTTO	CODICE	DOCUMENTO	REVISIONE
3480 23	S10	PD	00 S1	PL 00 0002 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Verificato	Data	Validato	Data
A	Emissione	E. Bacciari	04/04/22	L. Fantoni	04/04/22	M. Lucarelli	04/04/22	A. Gagliardi	04/04/22

POSIZIONE ARCHIVIO: LI490 — SPE TECNICA: - - - - - - — NOME FILE: — SUPERVISORE:
