
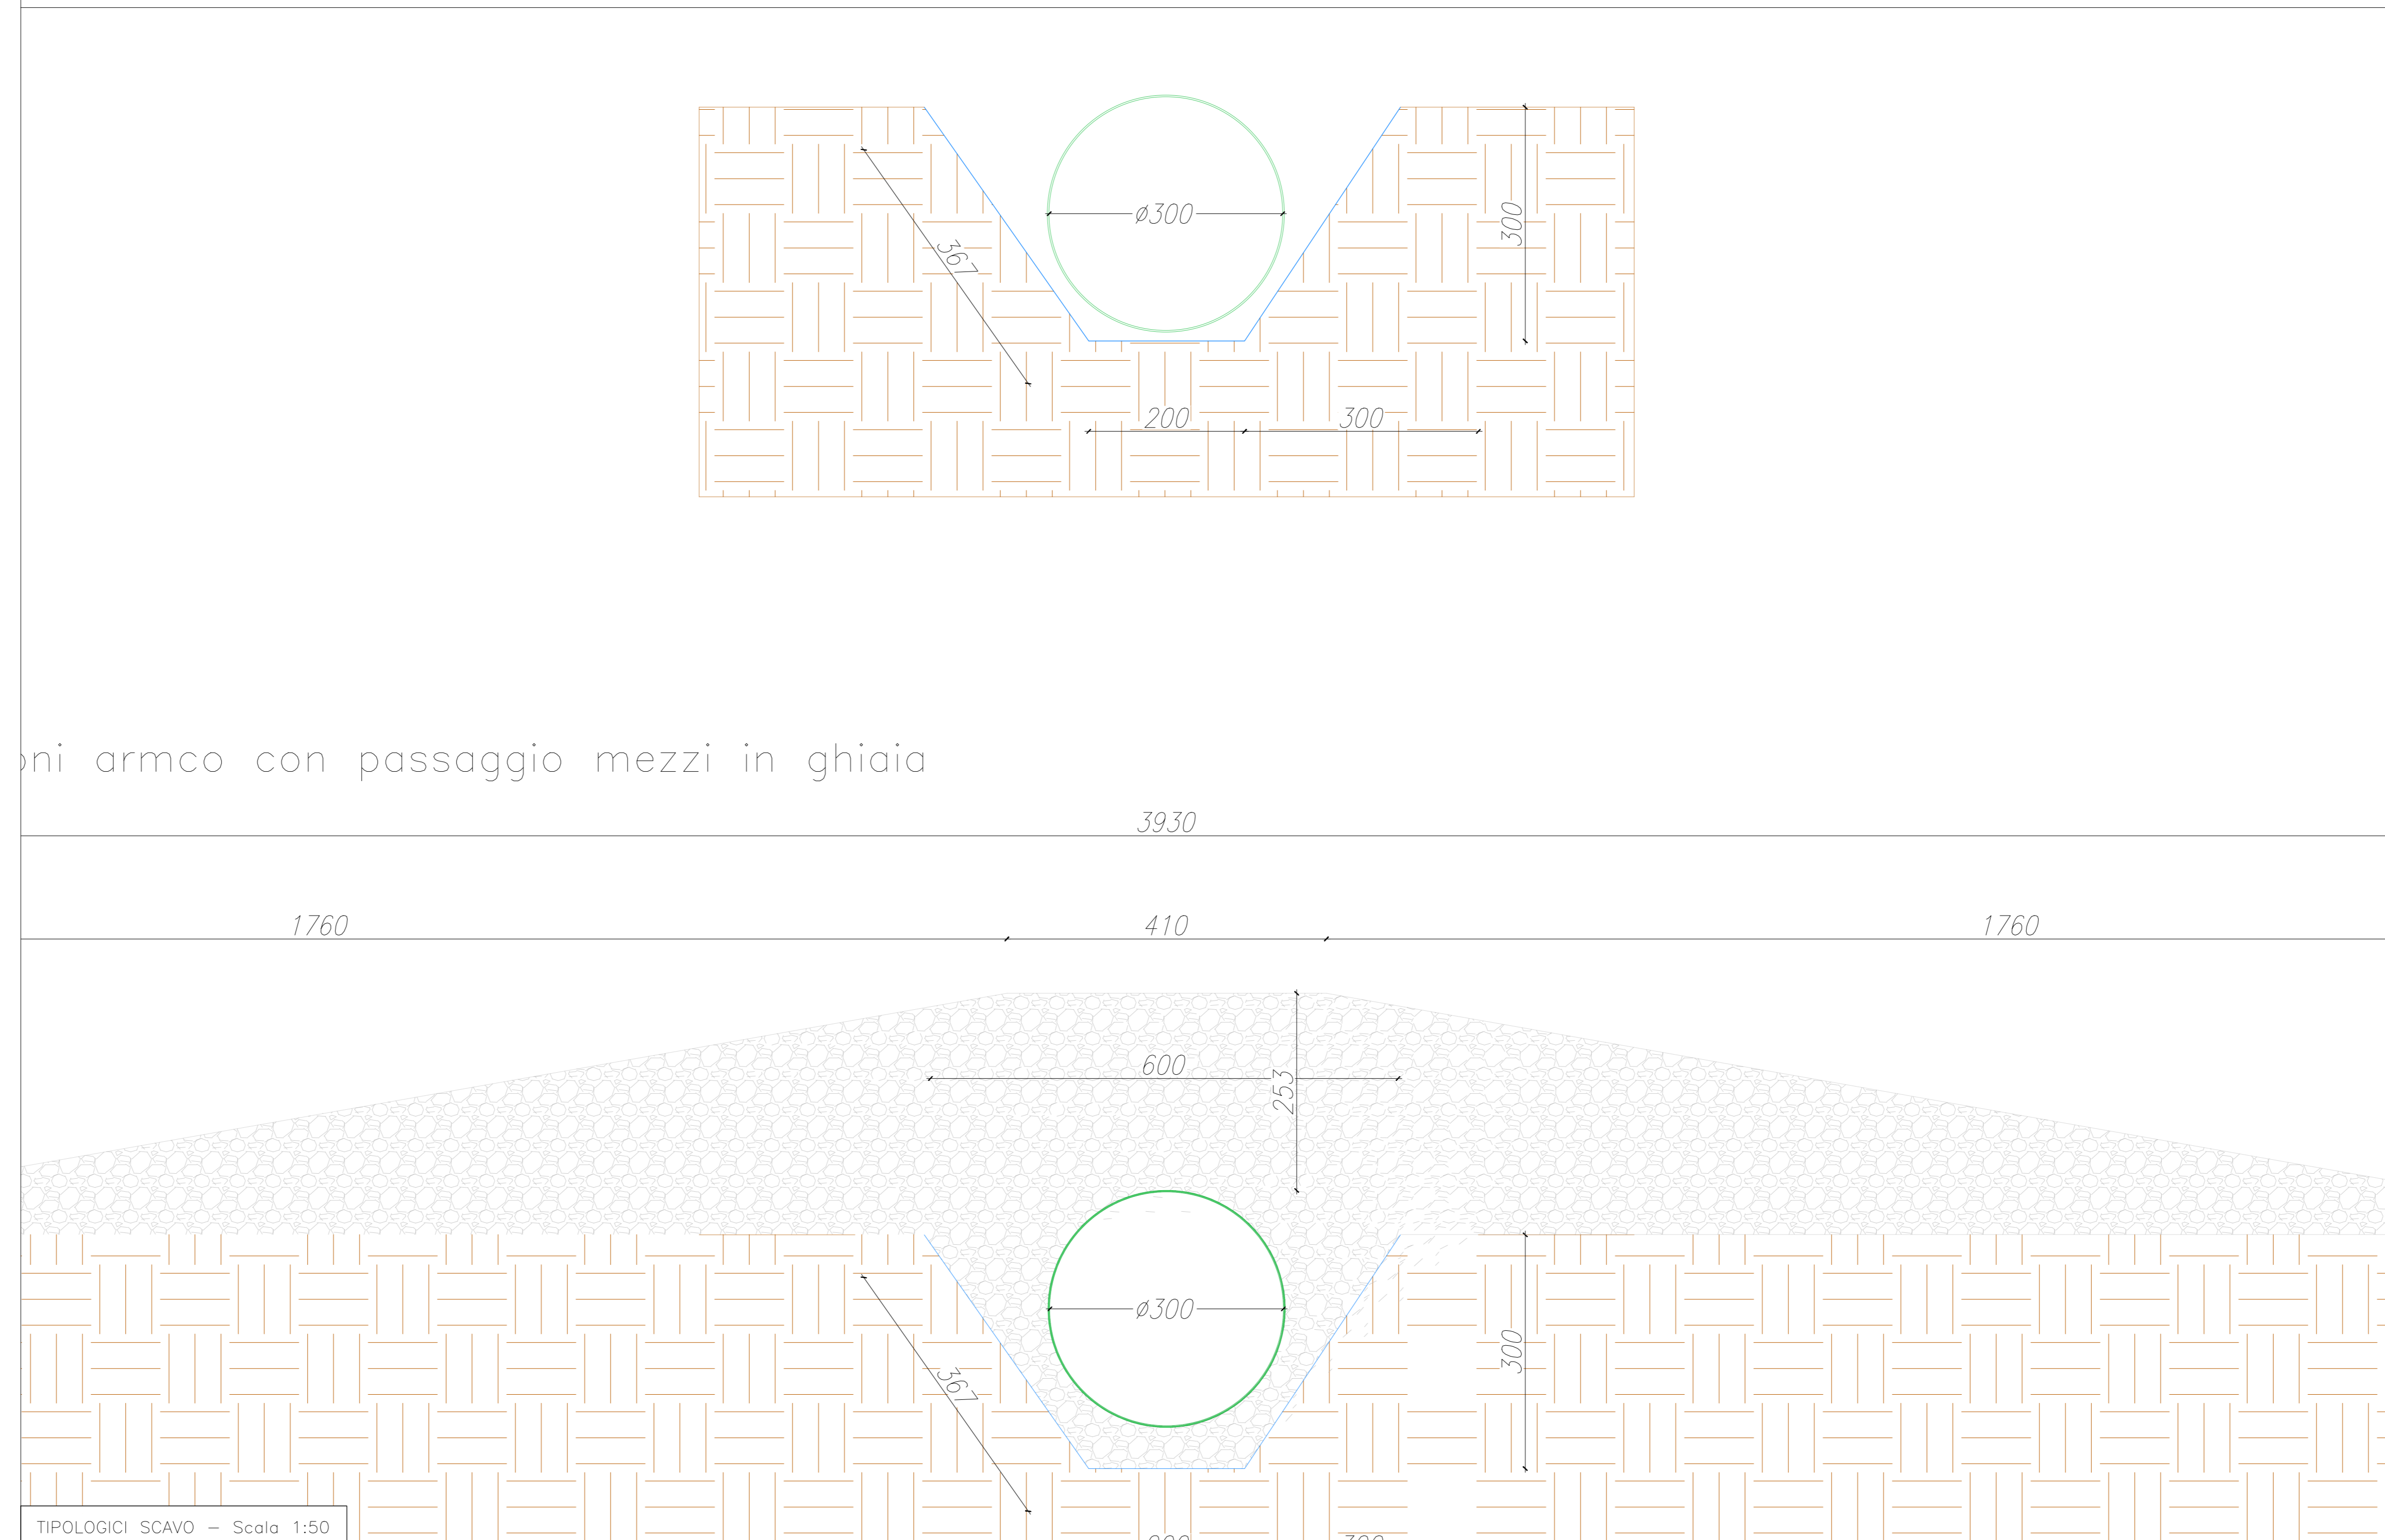


- LEGENDA DELLA FASI
- Corso d'acqua
  - Asse canale provvisorio
  - Asse canale definitivo
  - Tubazione interrata provvisoria armco
  - Ingombro canale provvisorio
  - Reinterri
  - Argine provvisorio in sacchi di sabbia
  - Rivestimento alveo in massi intasati

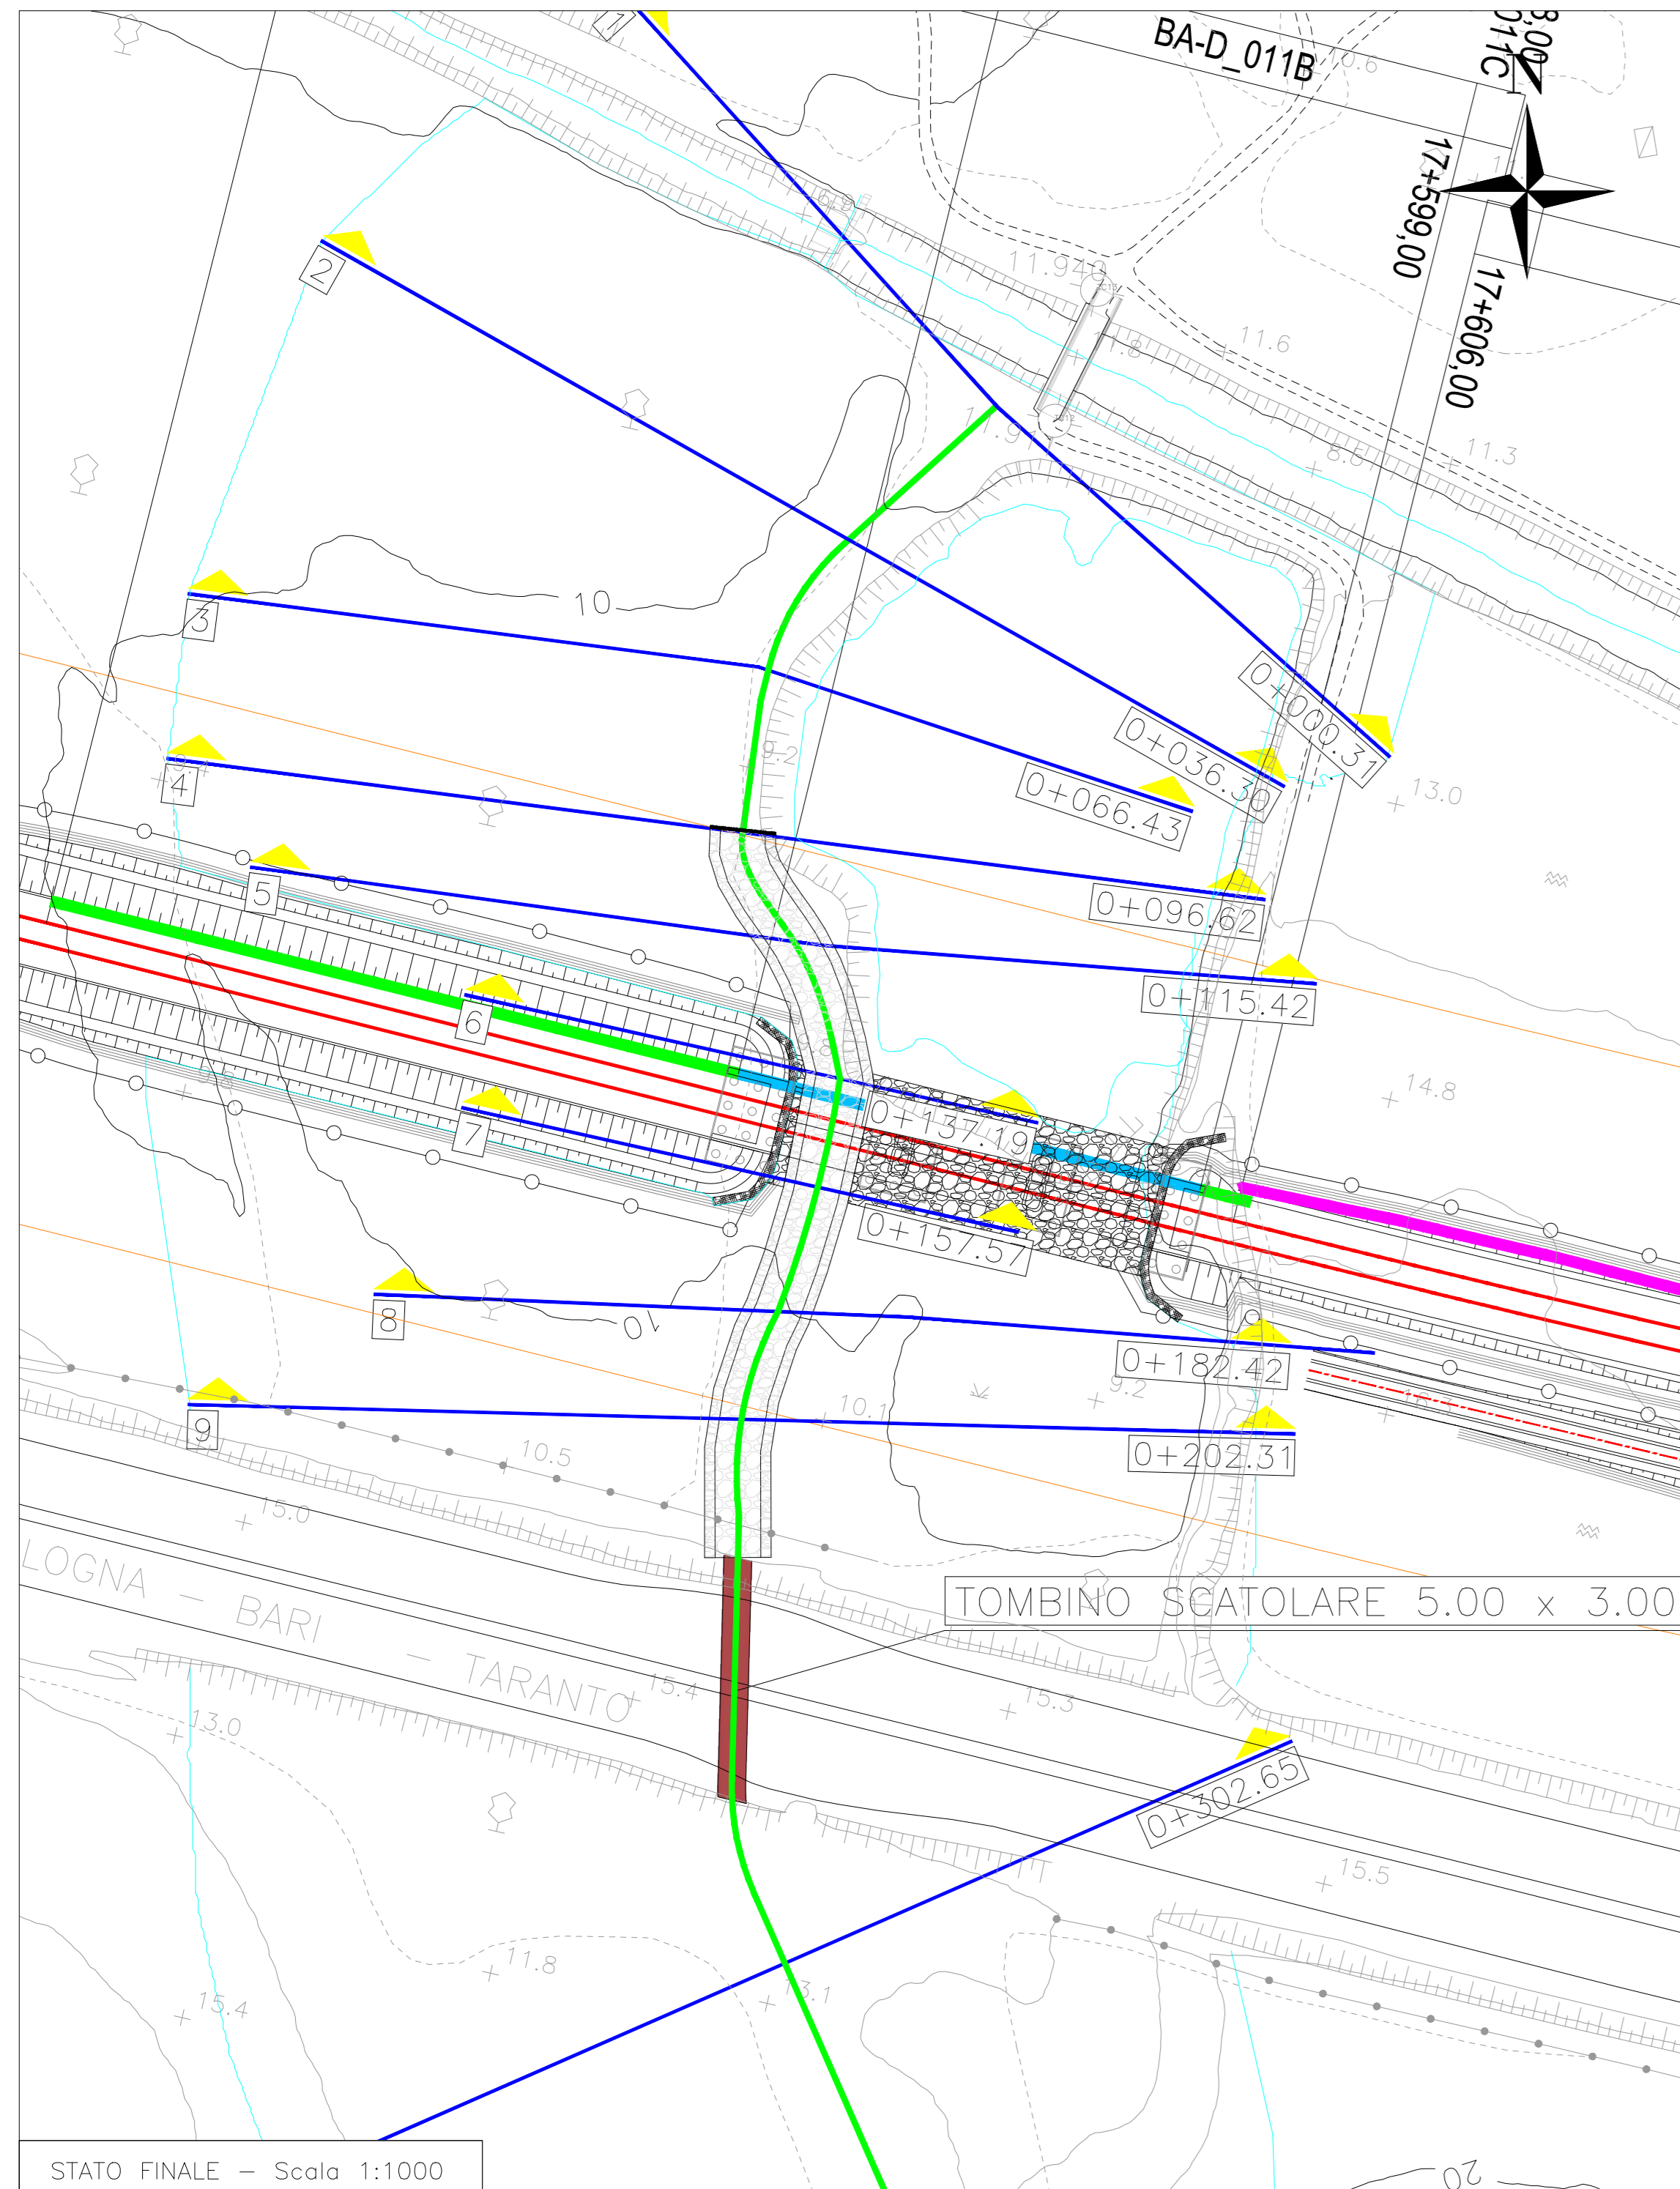

1. STATO DI FATTO
  2. FASE 1
    - 2.1. Scavo dei due canali provvisori a partire da valle verso monte e posa della tubazione armco per l'attraversamento
    - 2.2. Posa degli argini in sacchi di sabbia a protezione del cantiere
    - 2.3. Avvio delle lavorazioni delle fondazioni e delle pile del viadotto VI07
  3. FASE 2
    - 3.1. Scavo e posa in opera del canale definitivo IN28 e del pietrame fondo alveo
    - 3.2. Rimozione degli argini in sabbia e rimozione dei tubi provvisori armco e rinterro del canale provvisorio
    - 3.3. Posa del pietrame sul rinterro del canale provvisorio e al di sotto del viadotto
    - 3.4. Varo delle travi di impalcato del viadotto VI07 (se in interferenza con gli scavi dei canali definitivo)
  4. STATO FINALE
- NOTA: l'interferenza fra la posa del canale definitivo e il canale provvisorio 3, in prossimità del tombino stradale, non si considera sussistente poiché la lavorazione di stesura del manto in pietrame in quel brevissimo tratto è assai celere e non dovrebbe provocare difficoltà di sorta.

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO  
DIREZIONE INVESTIMENTI  
DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI  
DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

APPALTATORE: **AGOSTINO COSTANTINI** / **ATLANTE**

PROGETTAZIONE: MANDATARIA **HUB** / MANDATARI **EMpro**

**PROGETTO ESECUTIVO**  
LINEA PESCARA - BARI  
RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA  
LOTTO 2 e 3: RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN - Fasizzazione IN28 Stralcio planimetrico, pianta e sezioni tipologiche

APPALTATORE	PROGETTAZIONE	SCALA:
DIRETTORE TECNICO Ing. G. BIANCHI	DIREZIONE DELLA PROGETTAZIONE Ing. M. FERRARI	VARIE

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERAZIONE	PROG.	REV.
LI0B	02	E	PZ	IN2800	001	B	

Rev.	Descrizione	Autore	Data	Verificato	Data	Approvato	Data
A	Emissione definitiva	D. Costantini	Maggio 2023	G. Bianchi	Maggio 2023	V. Sacchi	Maggio 2023
B	Revisione a regola d'arte	D. Costantini	Ottobre 2023	G. Bianchi	Ottobre 2023	V. Sacchi	Ottobre 2023

File: UN80EZZPZIN280001B.DWG | n. Elab.:
