




Legenda fasi

- Esistente
- Configurazione finale
- Realizzazioni nella fase corrente
- Realizzazioni nelle fasi precedenti
- Demolizioni nella fase corrente
- Realizzazione provvisoria

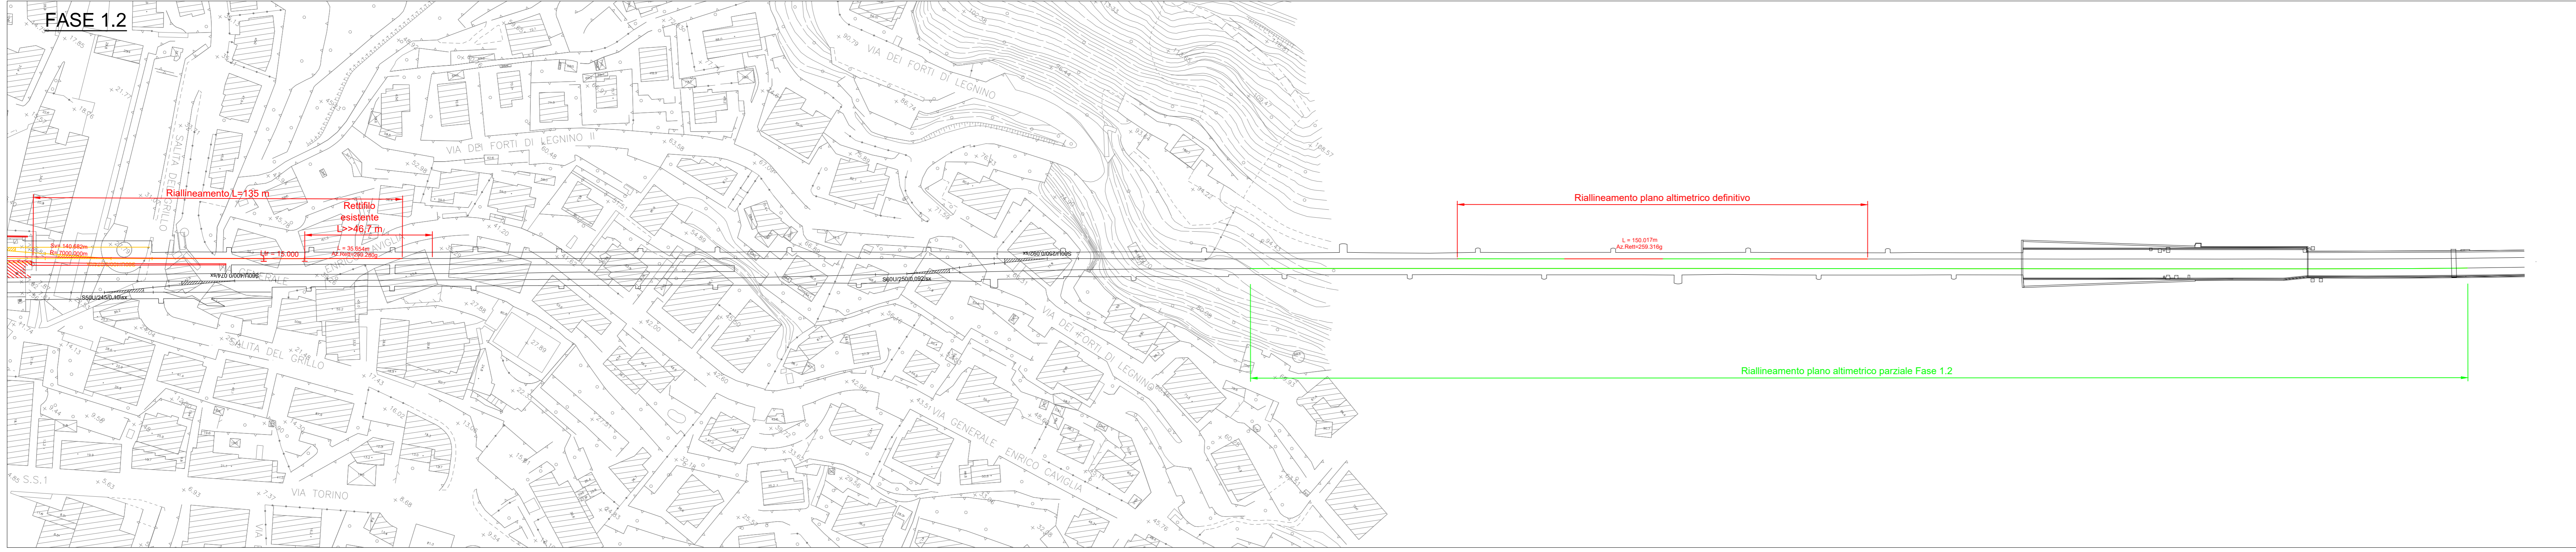

FASE 1.2



1. Demolizione binario IV e radice binario III;
 2. Realizzazione nuovo binario III, con inserimento parte della futura comunicazione provvisoria lato ponente;
 3. Completamento il marciapiede lato levante, con h=55 cm dal p.f.;
 4. Riallineamento tratti binari dispari e pari lato levante.
- Fuori servizio binario IV.

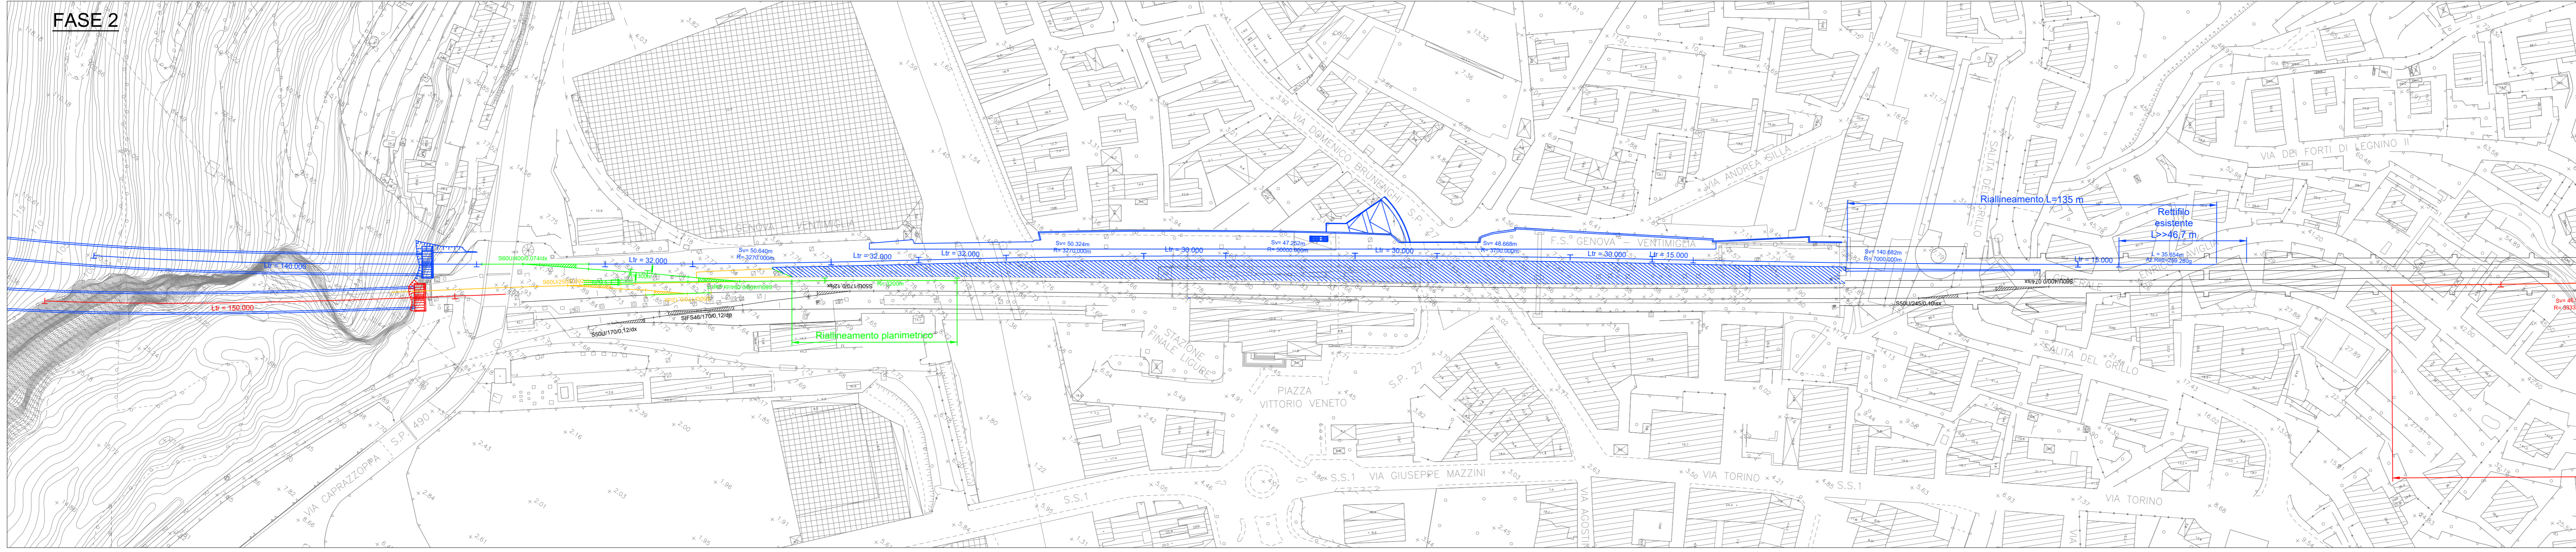

FASE 2

1. Demolizione radice lato ponente e realizzazione parte nuovo binario pari di raddoppio;
2. Completamento comunicazione provvisoria tra binario II e binario III e inserimento flesso e parafuochi provvisorio in ambito binario II;
3. Posa nuove comunicazioni in ambito radice lato levante, con riallineamento parte binario II, con demolizione comunicazione esistente P/D;
4. Attivazione nuovo binario dispari.

Esercizio gestito su binari I, II e III.
Binario I disponibile solo per movimenti di ribattuta con accesso da radice lato levante, e per accesso a binari di manutenzione.

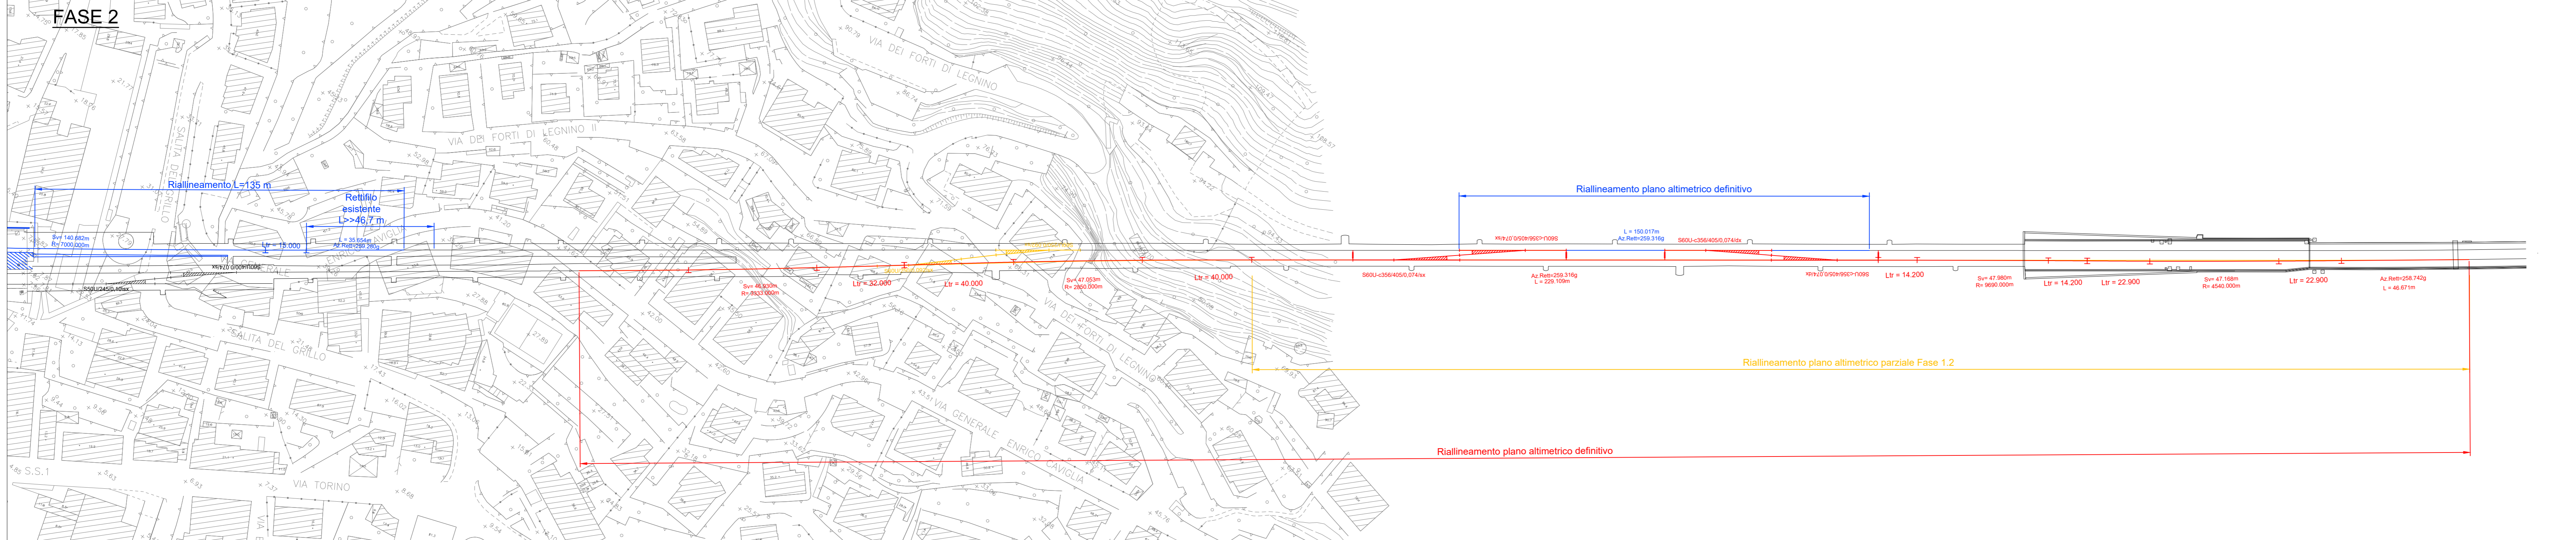

U.O. PROGETTAZIONE INTEGRATA NORD
PROGETTO DEFINITIVO
RADDOPPIO DELLA LINEA GENOVA - VENTIMIGLIA
TRATTA FINALE LIGURE - ANDORA

ELABORATI GENERALI
TRACCIATO FERROVIARIO
Planimetria delle fasi realizzative - Finale Ligure - 2/4

SCALA: 1:1000

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	F. Eusepi	Feb. 2022	[Signature]	Feb. 2022	[Signature]	Feb. 2022	Feb. 2022

File: IV0100D28P7IF000005A.DWG n. Etab.: _____
