



PLANIMETRIA FASE 1  
1:1000

TOVO SAN GIACOMO

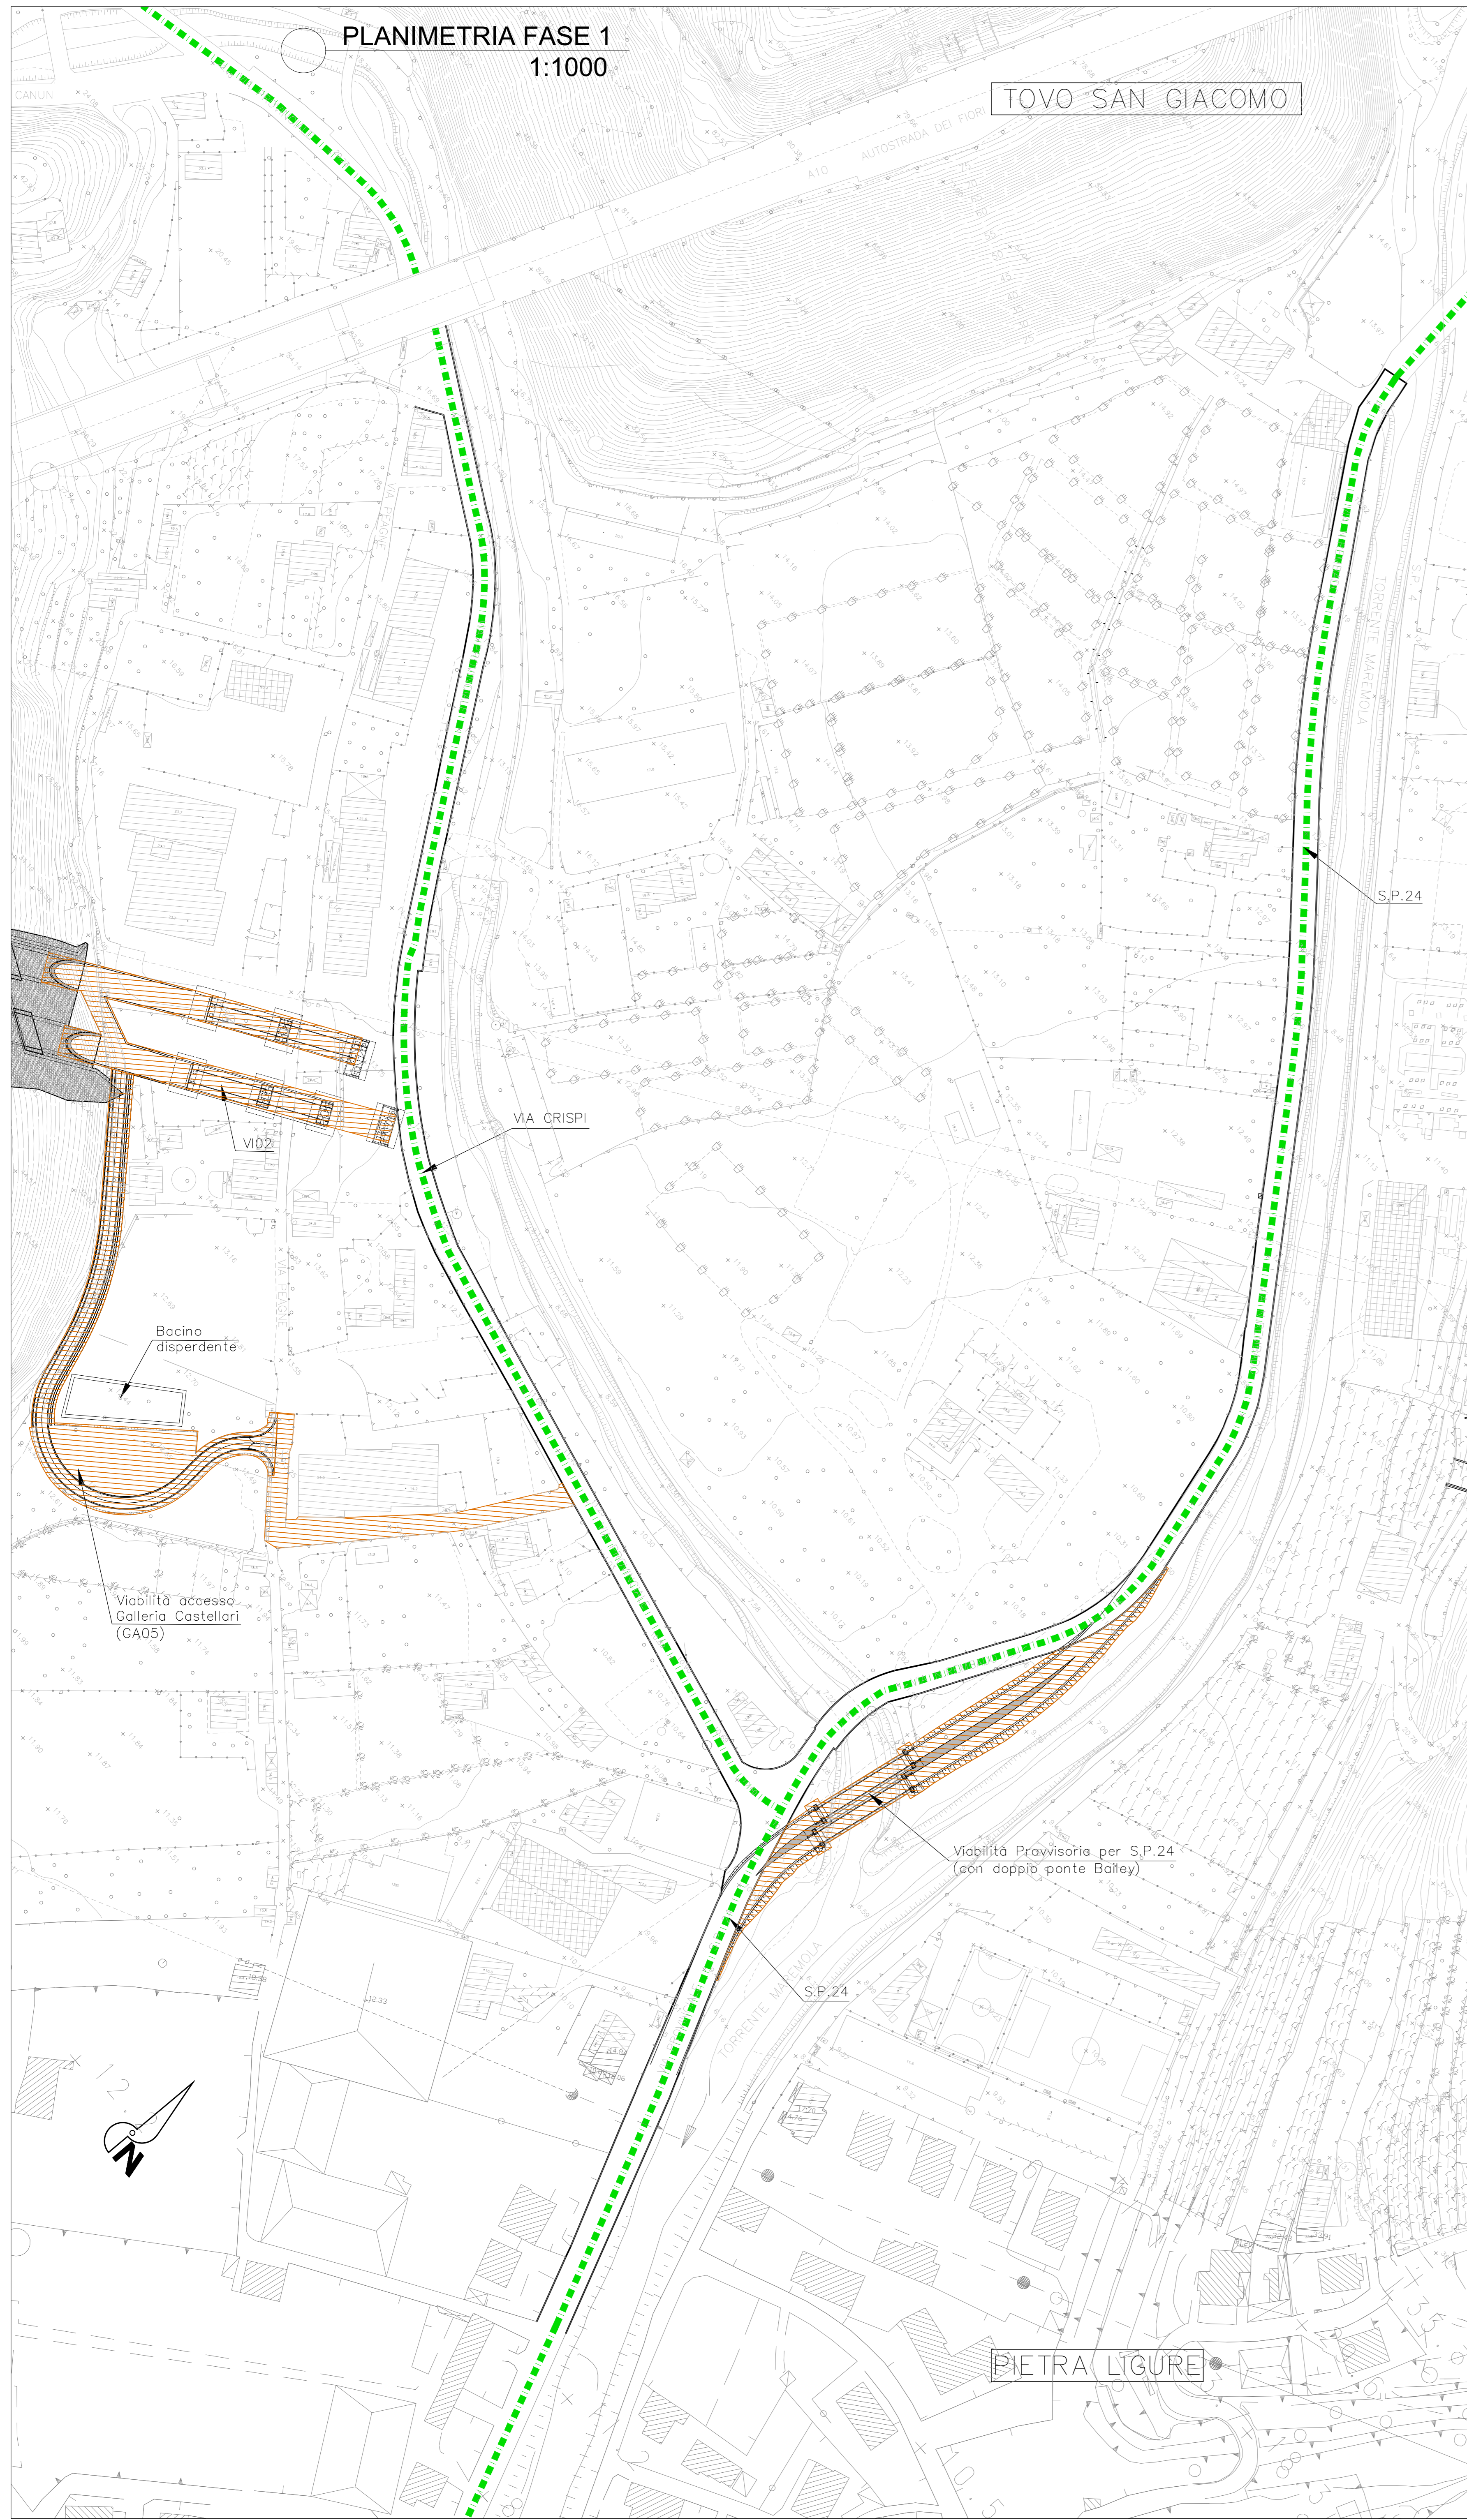

PLANIMETRIA FASE 2  
1:1000

TOVO SAN GIACOMO

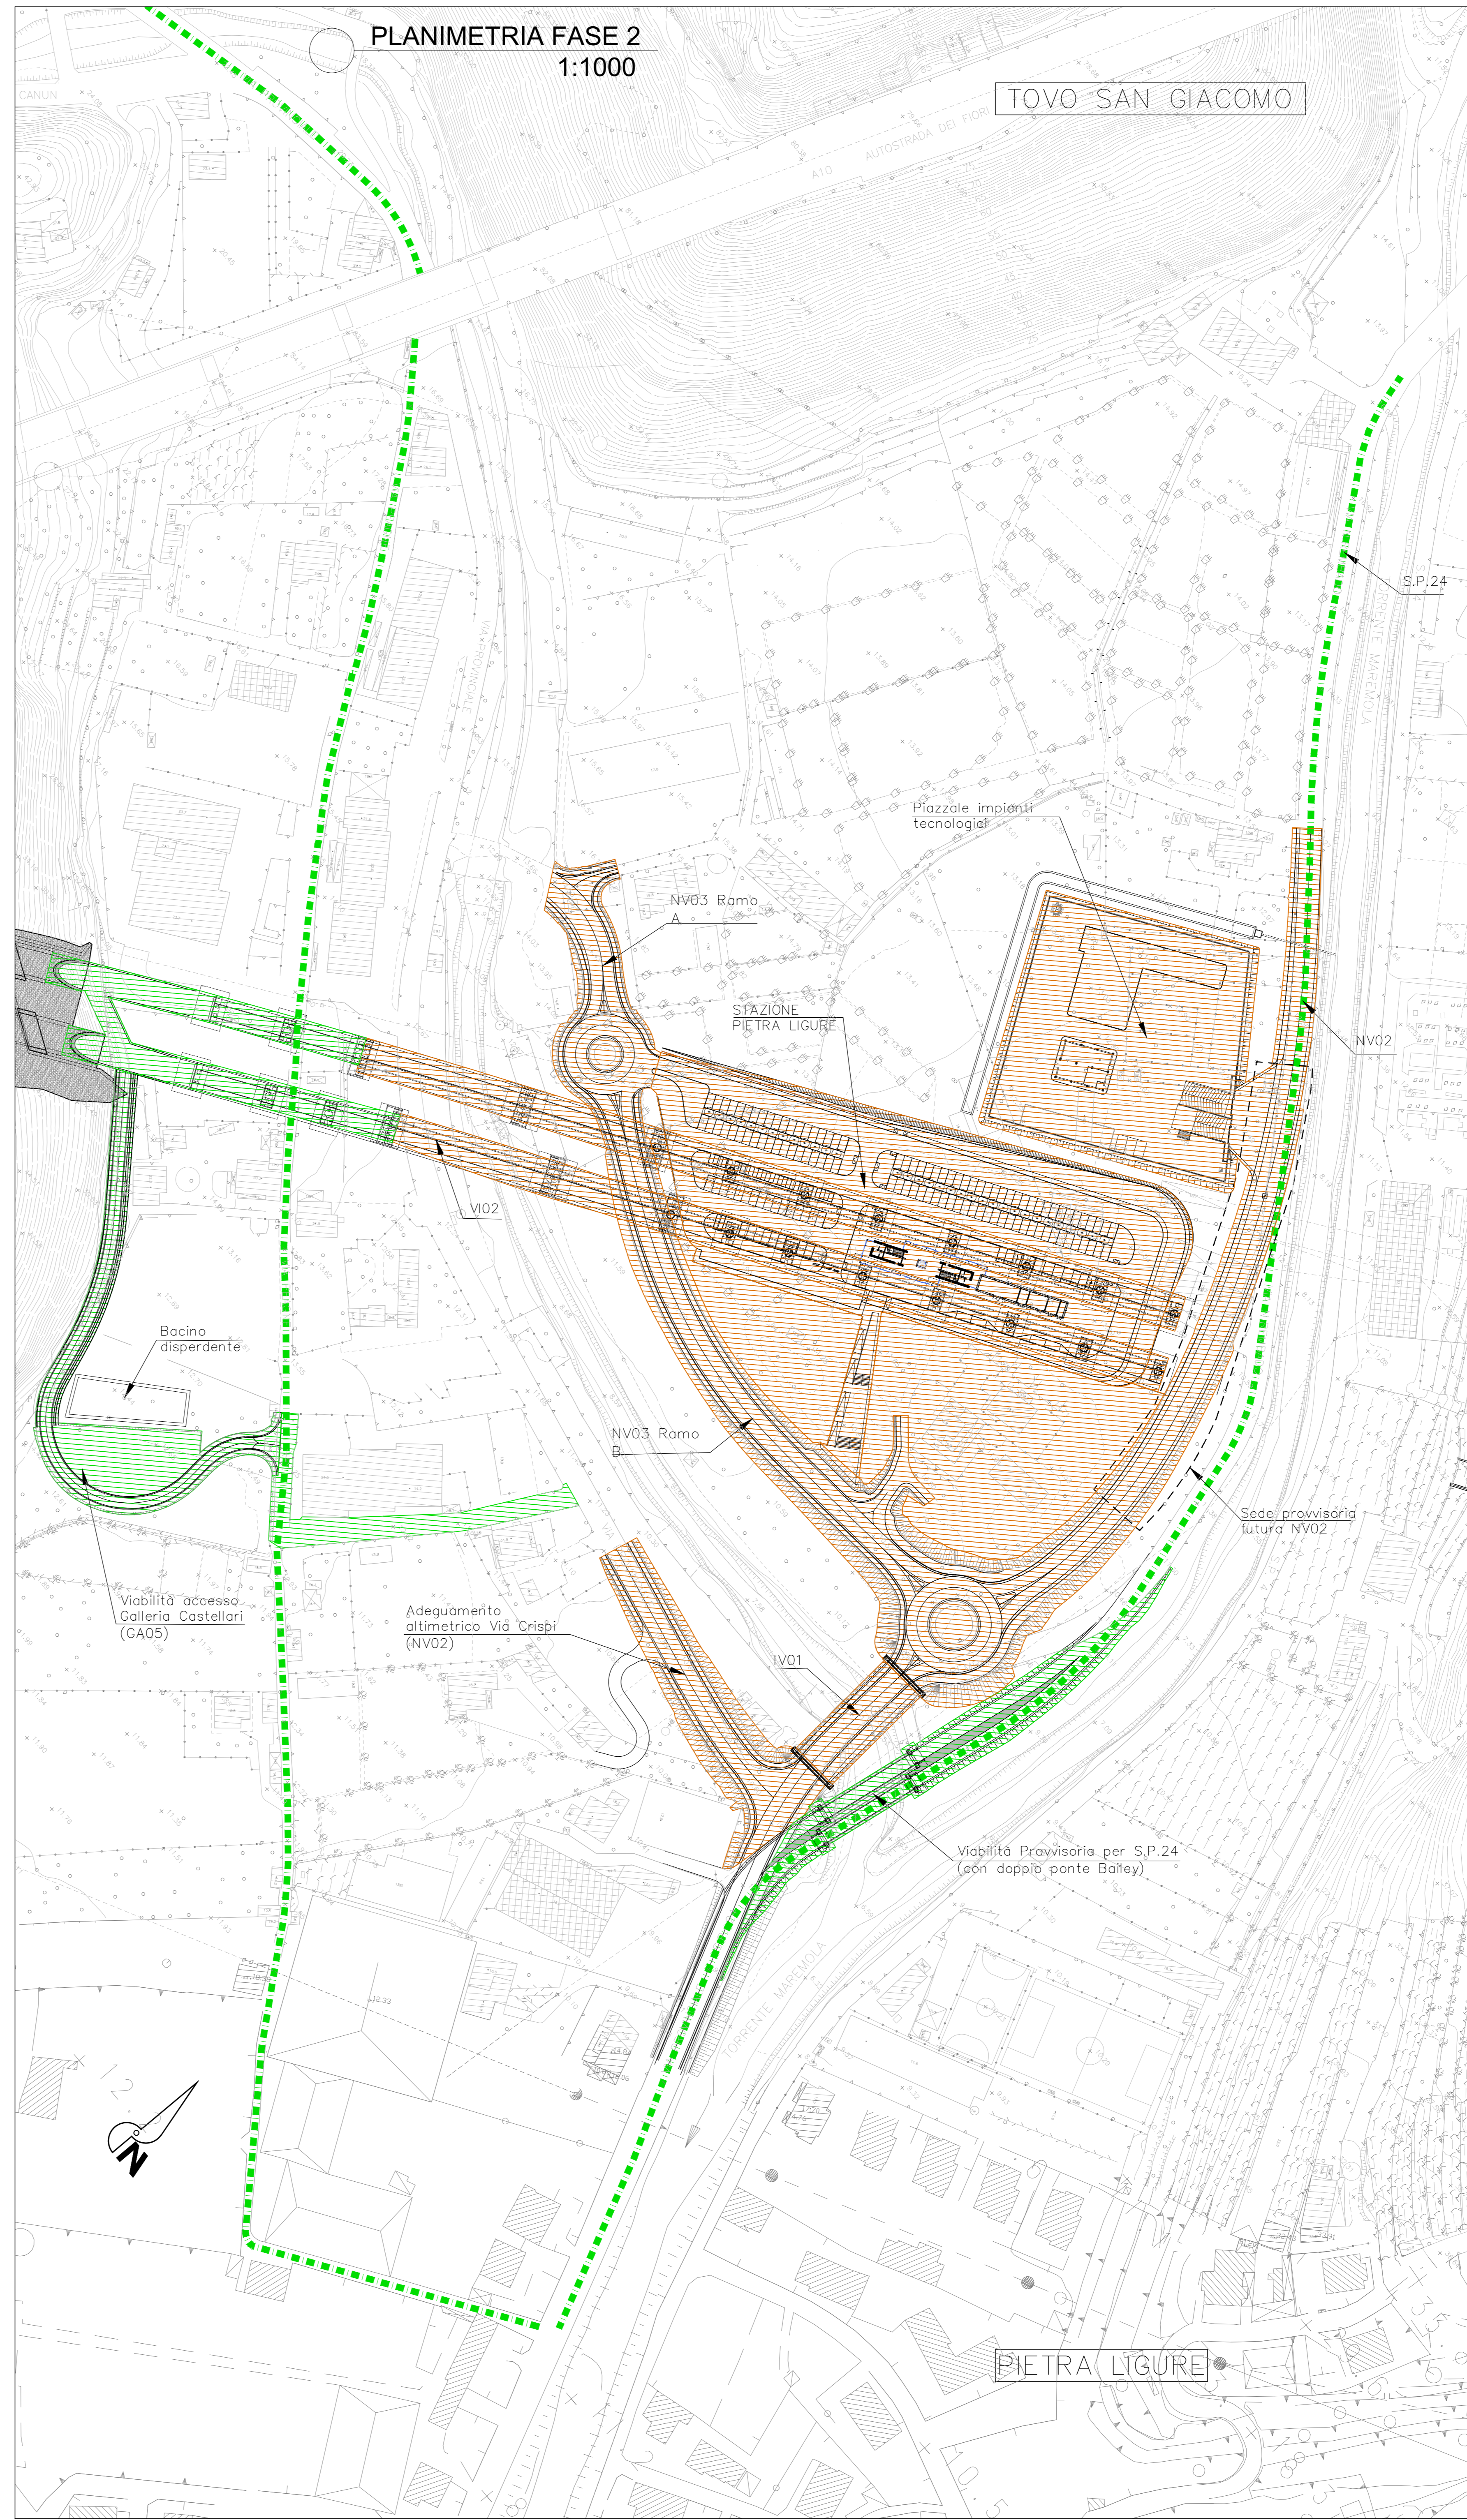

- LEGENDA**
-  OPERE REALIZZATE NELLA FASE CORRENTE
  -  OPERE REALIZZATE NELLE FASI PRECEDENTI
  -  DISMISSIONE OPERE PROVVISORIE
  -  VIABILITA'
  -  BINARI DI PROGETTO

- FASE 1**
1. REALIZZAZIONE VIABILITA' PROVVISORIA PER S.P.24 CON DOPPIO PONTE BAILEY
  2. REALIZZAZIONE VIABILITA' DI ACCESSO GALLERIA CASTELLARI
  3. REALIZZAZIONE VIADOTTO V102 :  
Pila 13 BP, Pila 14 BP, Spalla B BP  
Pila 12 BD, Pila 13 BD, Spalla B BD

- FASE 2**
1. DEVIAZIONE DEL TRAFFICO SULLA VIABILITA' PROVVISORIA PER S.P.24
  2. PARZIALE CHIUSURA AL TRAFFICO (LATO SUD) DI VIA CRISPI
  3. REALIZZAZIONE NV02 CON TRATTO DI PARZIALE SEDE PROVVISORIA
  4. REALIZZAZIONE ADEGUAMENTO ALTIMETRICO VIA CRISPI ( LATO NV02)
  5. REALIZZAZIONE PRIMO TRATTO NV03 RAMO A
  6. REALIZZAZIONE NV03 RAMO B
  7. REALIZZAZIONE STAZIONE PIETRA LIGURE
  8. REALIZZAZIONE PIAZZALE PER IMPIANTI TECNOLOGICI
  9. VIADOTTO V102:  
da PILA 3 BP a Pila 12 BP,  
da PILA 3 BD a Pila 11 BD

COMMITTENTE:   
 PROGETTAZIONE: 

**U.O. OPERE CIVILI**  
**PROGETTO DEFINITIVO**  
**RADDOPPIO DELLA LINEA GENOVA - VENTIMIGLIA**  
**TRATTA FINALE LIGURE - ANDORA**  
 OPERE PRINCIPALI - VIADOTTI E CAVALCAVIA  
 V102-Viadotto su Torrente Maremola/Giustenice da km 71+020 a km 71+044  
 Fasi realizzative - tav. 1/2

SCALA: 1:1000

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I|V|0|1 0|0 0|09 B|Z V|1|0|2|A|0 0|0|1 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione planimetria	[Signature]	09/2021	[Signature]	09/2021	[Signature]	09/2021	09/2021

File: I:\01000\09BZ\102A0001A.DWG n. Etab.:
