


**Fase 9**

- a. Realizzazione del sottopasso e del muro (lato destro) propedeutici alla realizzazione della rampa autostradale in entrata.
- b. Dismissione del tratto provvisorio della SP582. La parte restante servirà i fabbricati adiacenti.

Legenda fasi	
Esistente	—
Configurazione finale	—
Realizzazioni nella fase corrente	—
Realizzazioni nelle fasi precedenti	—
Demolizioni nella fase corrente	—
Realizzazione provvisoria	—
Viabilità fase in corso	→
Viabilità definitiva	⇒

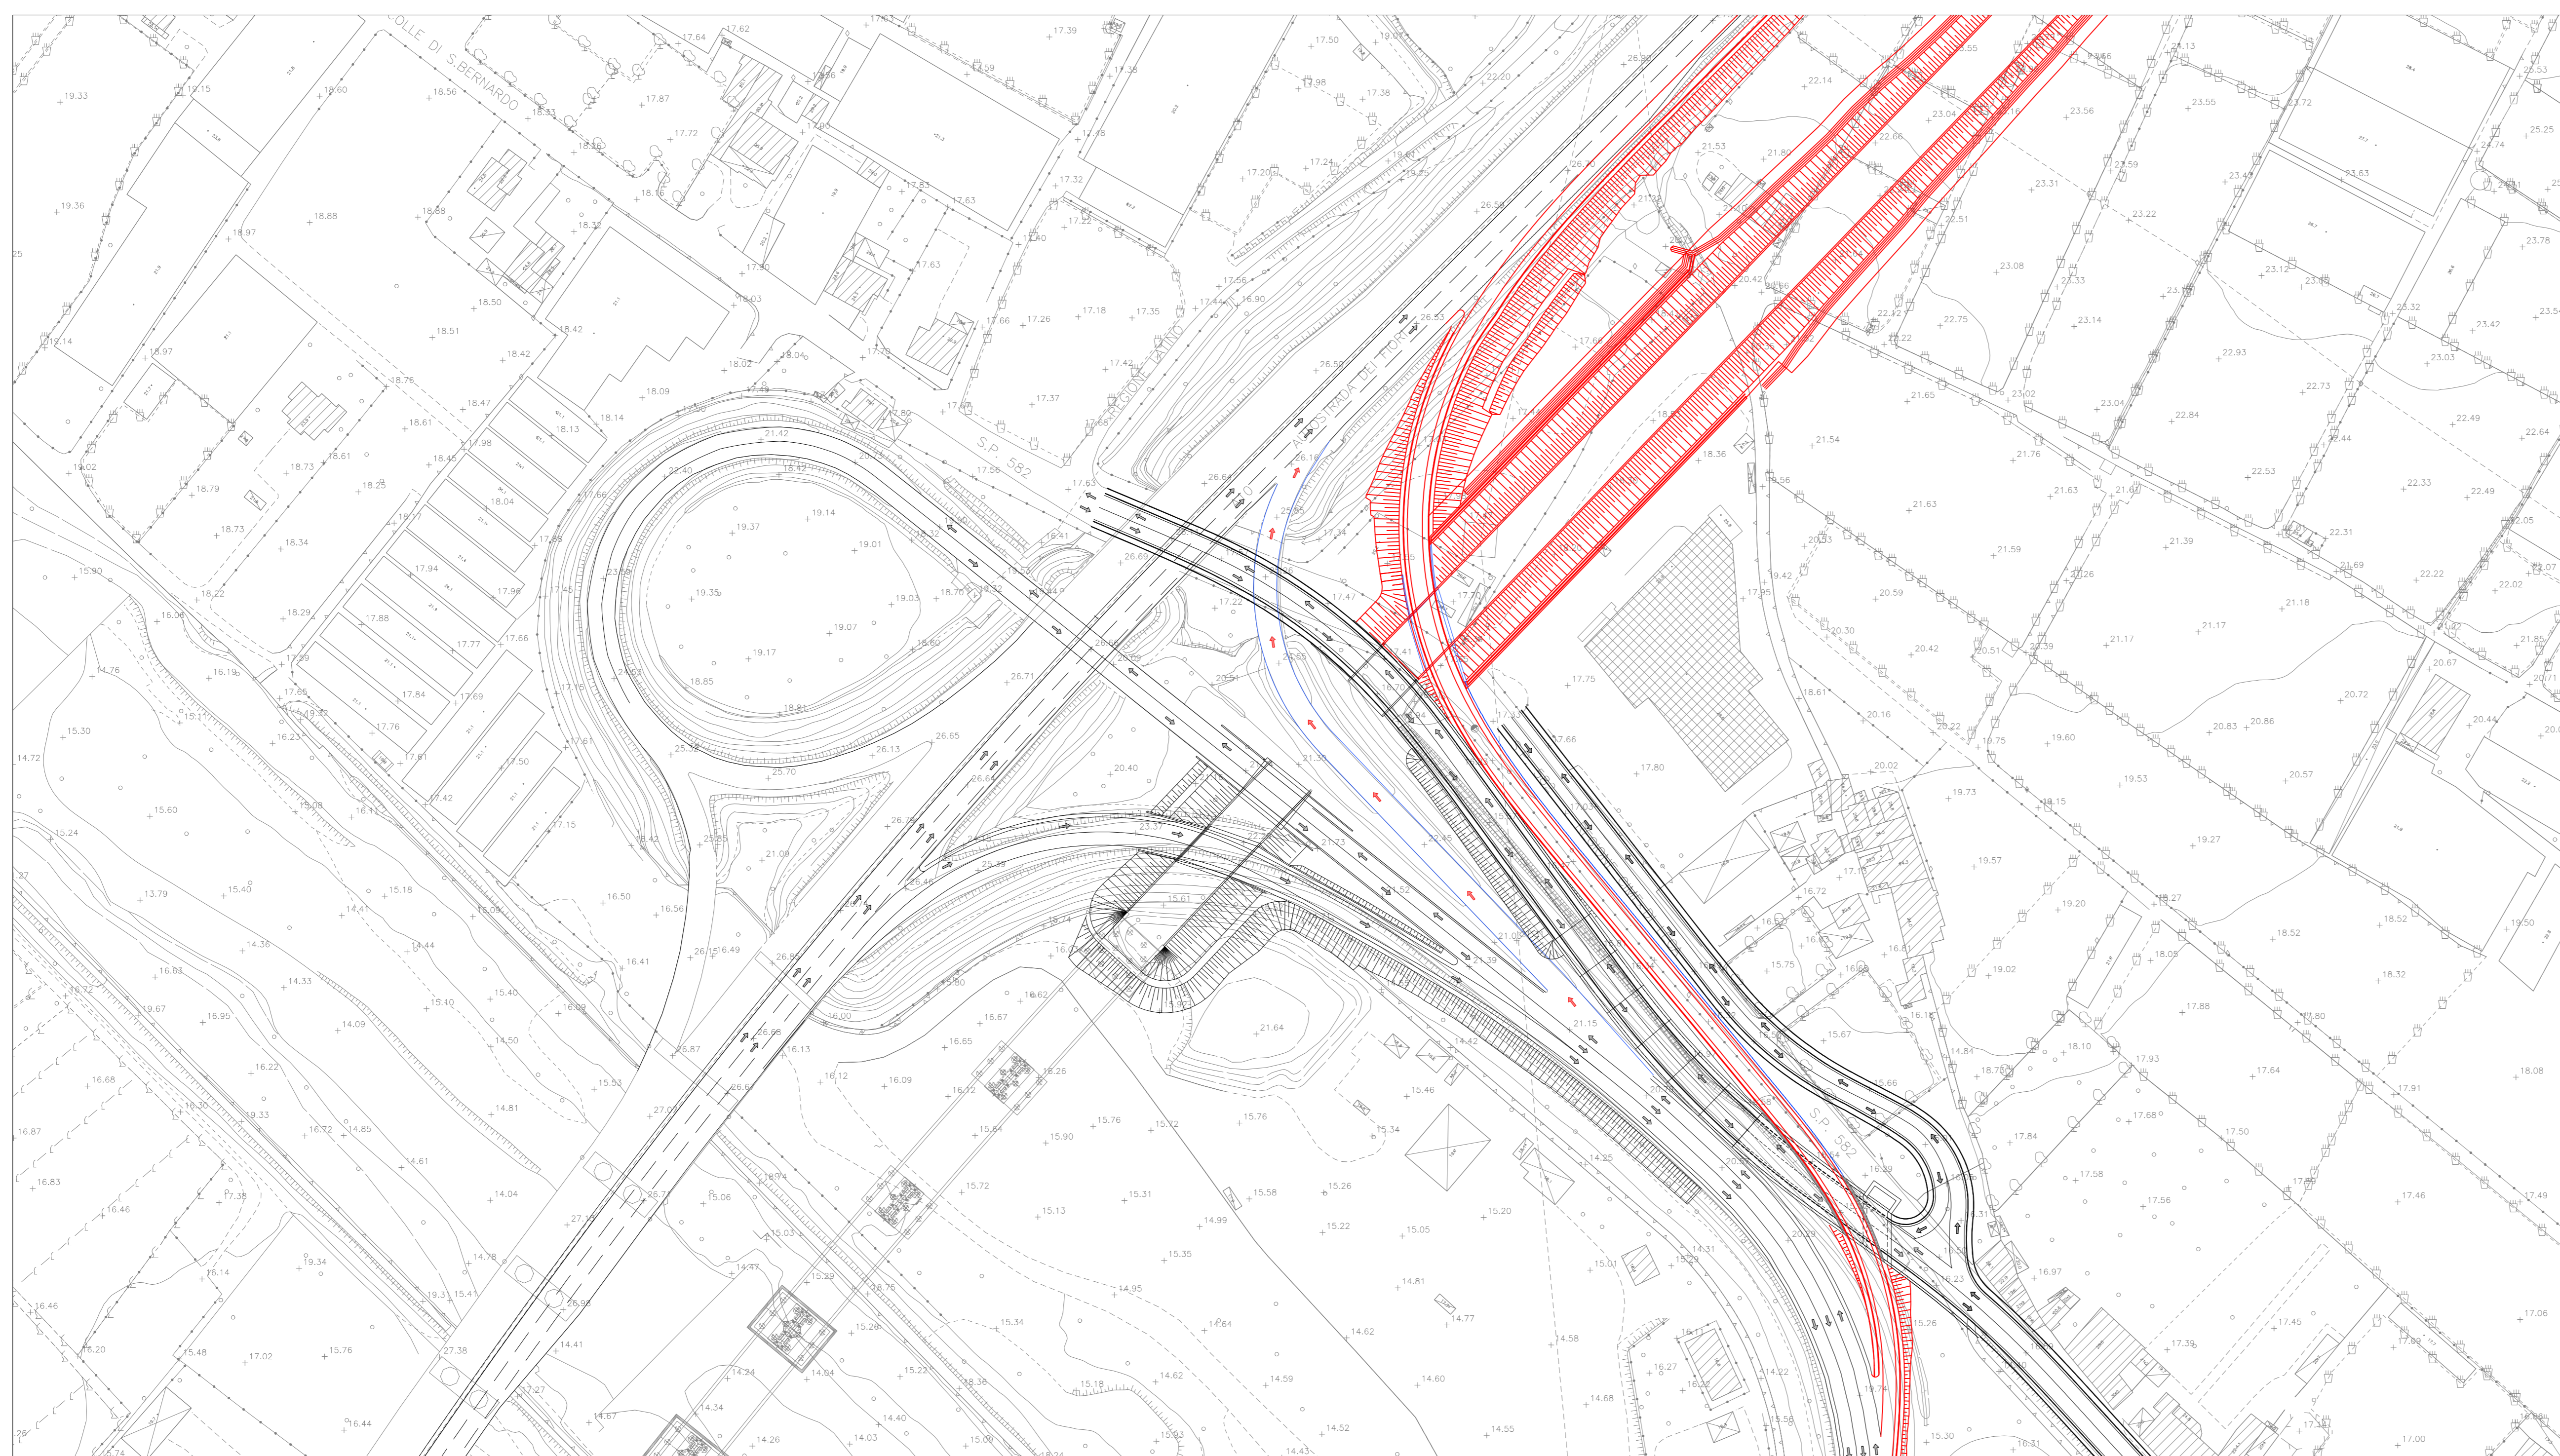

**Fase 10**

- a. Realizzazione del manufatto ferroviario in rievato.
- b. Realizzazione della rampa monodirezionale definitiva in entrata. La viabilità di tale rampa permane su quella esistente.

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



U.O. PROGETTAZIONE INTEGRATA NORD

PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO DELLA LINEA GENOVA - VENTIMIGLIA

TRATTA FINALE LIGURE - ANDORA

SISTEMAZIONI VIABILITA'

Adegamento viabilità - Rampe di collegamento Autostrada Genova - Savona - Ventimiglia  
Fasi realizzate - tav 5/6

SCALA:

1:1000

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

IV01 00 D 26 P7 NV0800 009 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	F. Enesi	Gen 2022	M. Spini	Gen 2022	[Signature]	Gen 2022	[Signature]

File: IV0100D26P7NV080009A.DWG

n. Etab.:
