



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PROVINCIA DI SASSARI
Comuni di:



Buddusò



Pattada

REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEI COMUNI DI
BUDDUSÒ E PATTADA COSTITUITO DA 12 AEROGENERATORI DI
6,6 MW CIASCUNO E POTENZA COMPLESSIVA PARI A 79,2 MW

VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

TITOLO:

CRONOPROGRAMMA – OPERE DI DISMISSIONE IMPIANTO

COMMITENTE:

AME ENERGY S.r.l.

Via Pietro Cossa, 5
29122 Milano (MI)

PROGETTISTI:

Studio di Ingegneria – Progettazione e coordinamento
Dott. Ing. Sandro Balloi
Via Monsignor Virgilio, 39
08040 Arzana (OG)

Prof. Geol. Alfonso Russi
Via Friuli, 5
06034 Foligno (PG)

PROFESSIONISTI:

Dott. Ing. Mauro Medici
Via Papa Sisto V n. 14
09134 Cagliari (CA)

| Rev. | n. Documento | Fg/Fgg | Scala | Redatto | Verificato | Approvato | Data |
|------|--------------|--------|-------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------|
| 00 | 2370B 02150 | 1/1 | NA | Dott. Ing. Mauro Medici | Prof. Geol. A. Russi | Dott. Ing. S. Balloi | Marzo 2024 |

Cronoprogramma dismissione impianto eolico

23 giu 2024

AME ENERGY S.r.l.

<http://>

Responsabile di progetto

Date di inizio e fine progetto

3 gen 2056 - 12 ago 2056

Completamento

0%

Attività

20

Risorse

0

REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEI COMUNI DI BUDDUSÒ E PATTADA COSTITUITO DA 12
AEROGENERATORI DI 6,6 MW CIASCUNO E POTENZA COMPLESSIVA PARI A 79,2 MW

Attività

2

| Nome | Data d'inizio | Data di fine | Durata |
|--|---------------|--------------|--------|
| Dismissione Impianto Eolico | 03/01/56 | 11/08/56 | 160 |
| Allestimento cantiere | 03/01/56 | 25/02/56 | 40 |
| Allestimento generale cantiere | 03/01/56 | 14/01/56 | 10 |
| Preparazione piazzole di servizio | 17/01/56 | 25/02/56 | 30 |
| Disinstallazione aerogeneratori | 28/02/56 | 28/04/56 | 45 |
| Smontaggio Rotore | 28/02/56 | 03/03/56 | 5 |
| Smontaggio navicella e componenti interne | 06/03/56 | 17/03/56 | 10 |
| Demolizione fusto | 20/03/56 | 14/04/56 | 20 |
| Demolizione fondazioni | 17/04/56 | 28/04/56 | 10 |
| Dismissione SSE Utente | 17/01/56 | 11/02/56 | 20 |
| Disconnessione impianti e rimozione apparecchiature | 17/01/56 | 21/01/56 | 5 |
| Demolizione edificio e pertinenze esterne | 24/01/56 | 11/02/56 | 15 |
| Dismissione e recupero cavidotti | 14/02/56 | 28/04/56 | 55 |
| Ripristino aree piazzole | 01/05/56 | 02/06/56 | 25 |
| Ripristino profilo terreno / riporti terra | 01/05/56 | 26/05/56 | 20 |
| Posa terreno vegetale seminativo | 29/05/56 | 02/06/56 | 5 |
| Dismissione viabilità | 05/06/56 | 11/08/56 | 50 |
| Rimozione progressiva rilevati e strato superficiale | 05/06/56 | 14/07/56 | 30 |
| Ripristino livello terreno | 17/07/56 | 28/07/56 | 10 |
| Posa terreno vegetale seminativo | 31/07/56 | 11/08/56 | 10 |

Diagramma di Gantt

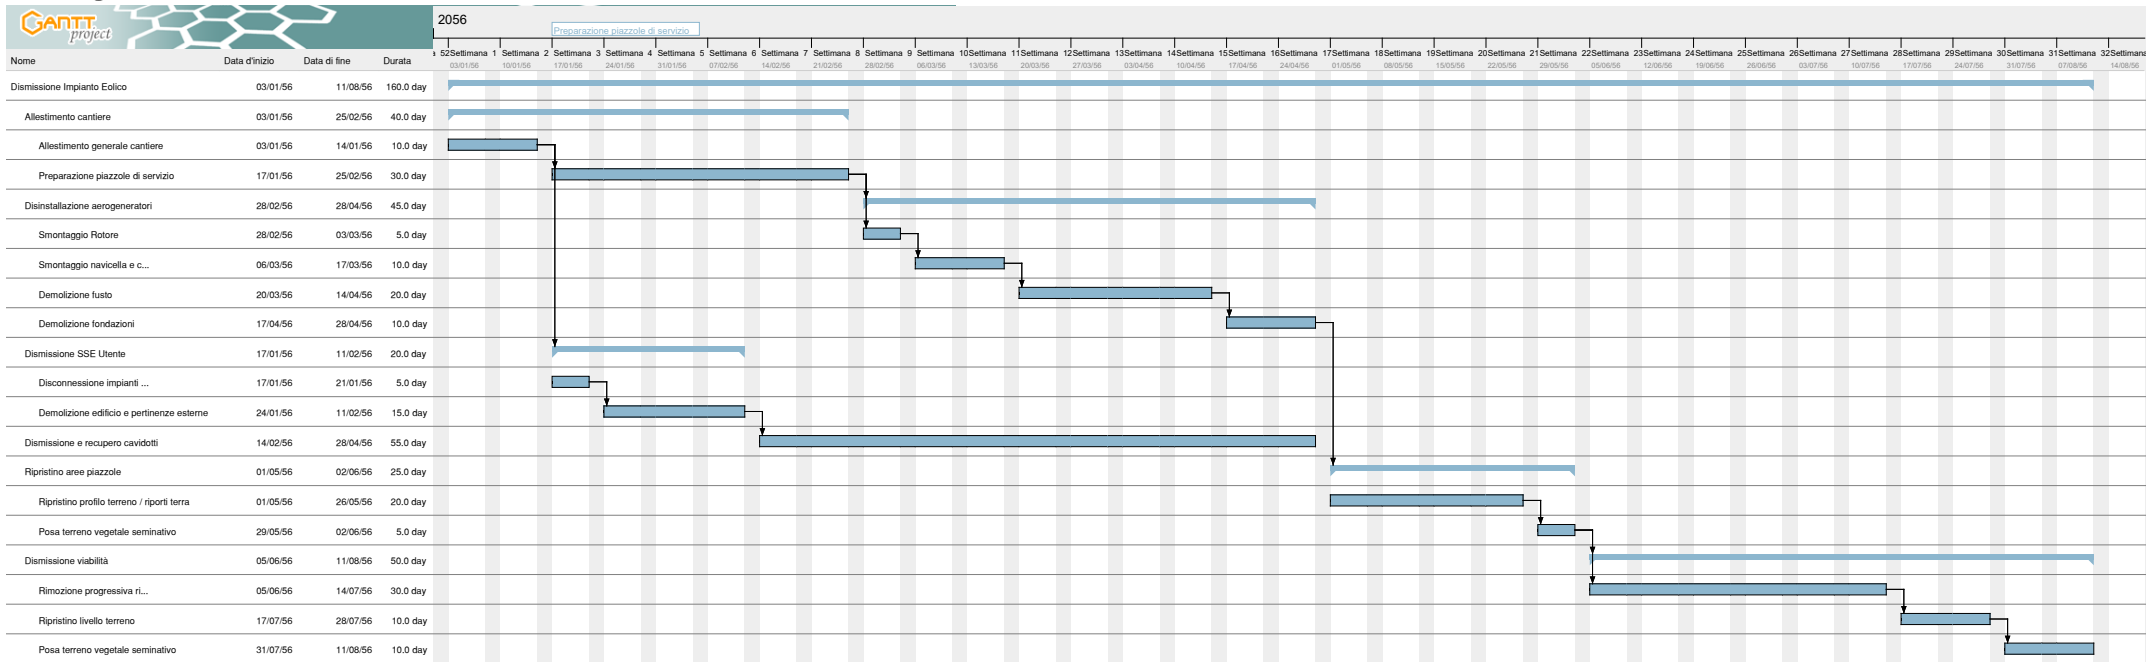


Diagramma Risorse

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
|  | | 2056 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome | Ruolo predefini | 52 | Settimana 1 | Settimana 2 | Settimana 3 | Settimana 4 | Settimana 5 | Settimana 6 | Settimana 7 | Settimana 8 | Settimana 9 | Settimana 10 | Settimana 11 | Settimana 12 | Settimana 13 | Settimana 14 | Settimana 15 | Settimana 16 | Settimana 17 | Settimana 18 | Settimana 19 | Settimana 20 | Settimana 21 | Settimana 22 | Settimana 23 | Settimana 24 | Settimana 25 | Settimana 26 | Settimana 27 | Settimana 28 | Settimana 29 | Settimana 30 | Settimana 31 | Settimana 32 | Settimana |
| | | | 03/01/56 | 10/01/56 | 17/01/56 | 24/01/56 | 31/01/56 | 07/02/56 | 14/02/56 | 21/02/56 | 28/02/56 | 06/03/56 | 13/03/56 | 20/03/56 | 27/03/56 | 03/04/56 | 10/04/56 | 17/04/56 | 24/04/56 | 01/05/56 | 08/05/56 | 15/05/56 | 22/05/56 | 29/05/56 | 05/06/56 | 12/06/56 | 19/06/56 | 26/06/56 | 03/07/56 | 10/07/56 | 17/07/56 | 24/07/56 | 31/07/56 | 07/08/56 | 14/08/56 |
