



**FASE 5**  
**Scala 1:1.000**

OPERAZIONI  
-Installazione gru in sponda sinistra;  
-Inizio getti per piumino di fondazione;

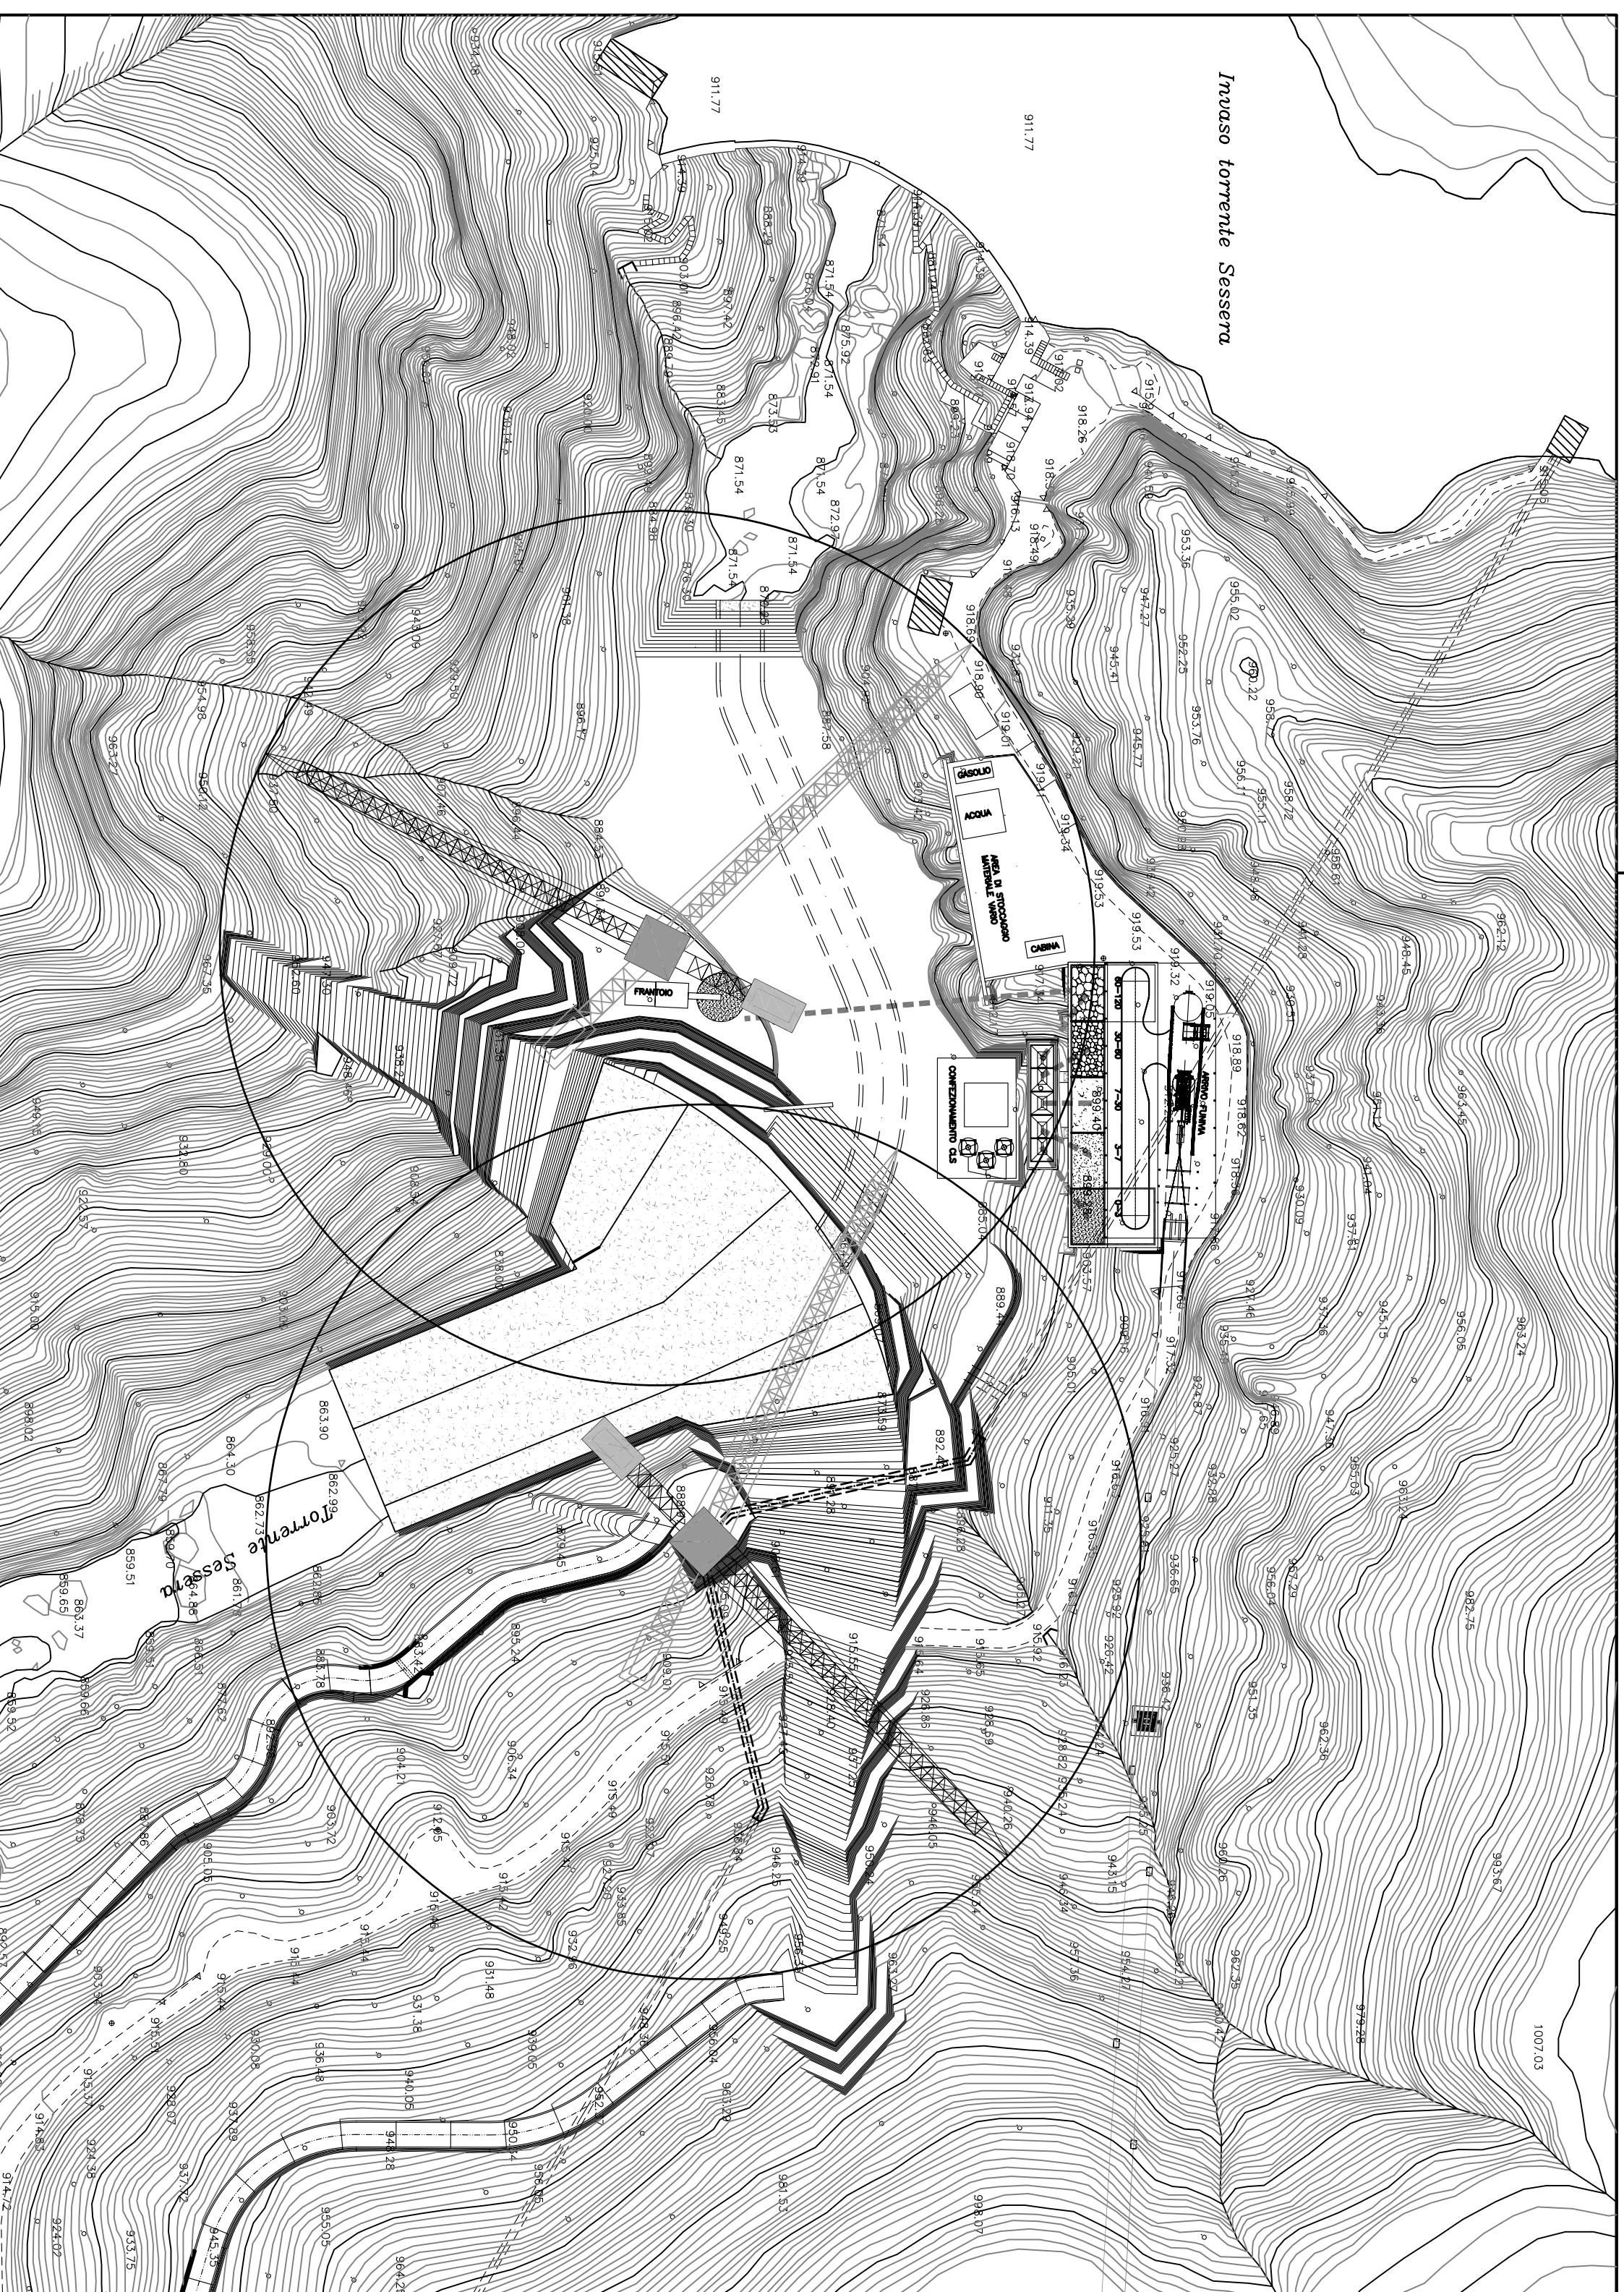


**FASE 6**  
**Scala 1:1.000**

OPERAZIONI  
-Prosecuzione getti corpo diga;  
-Esecuzione lobbazione per scarico di mezzo-fondo;  
-Rimozione di parte del materiale di tombamento di torrente;

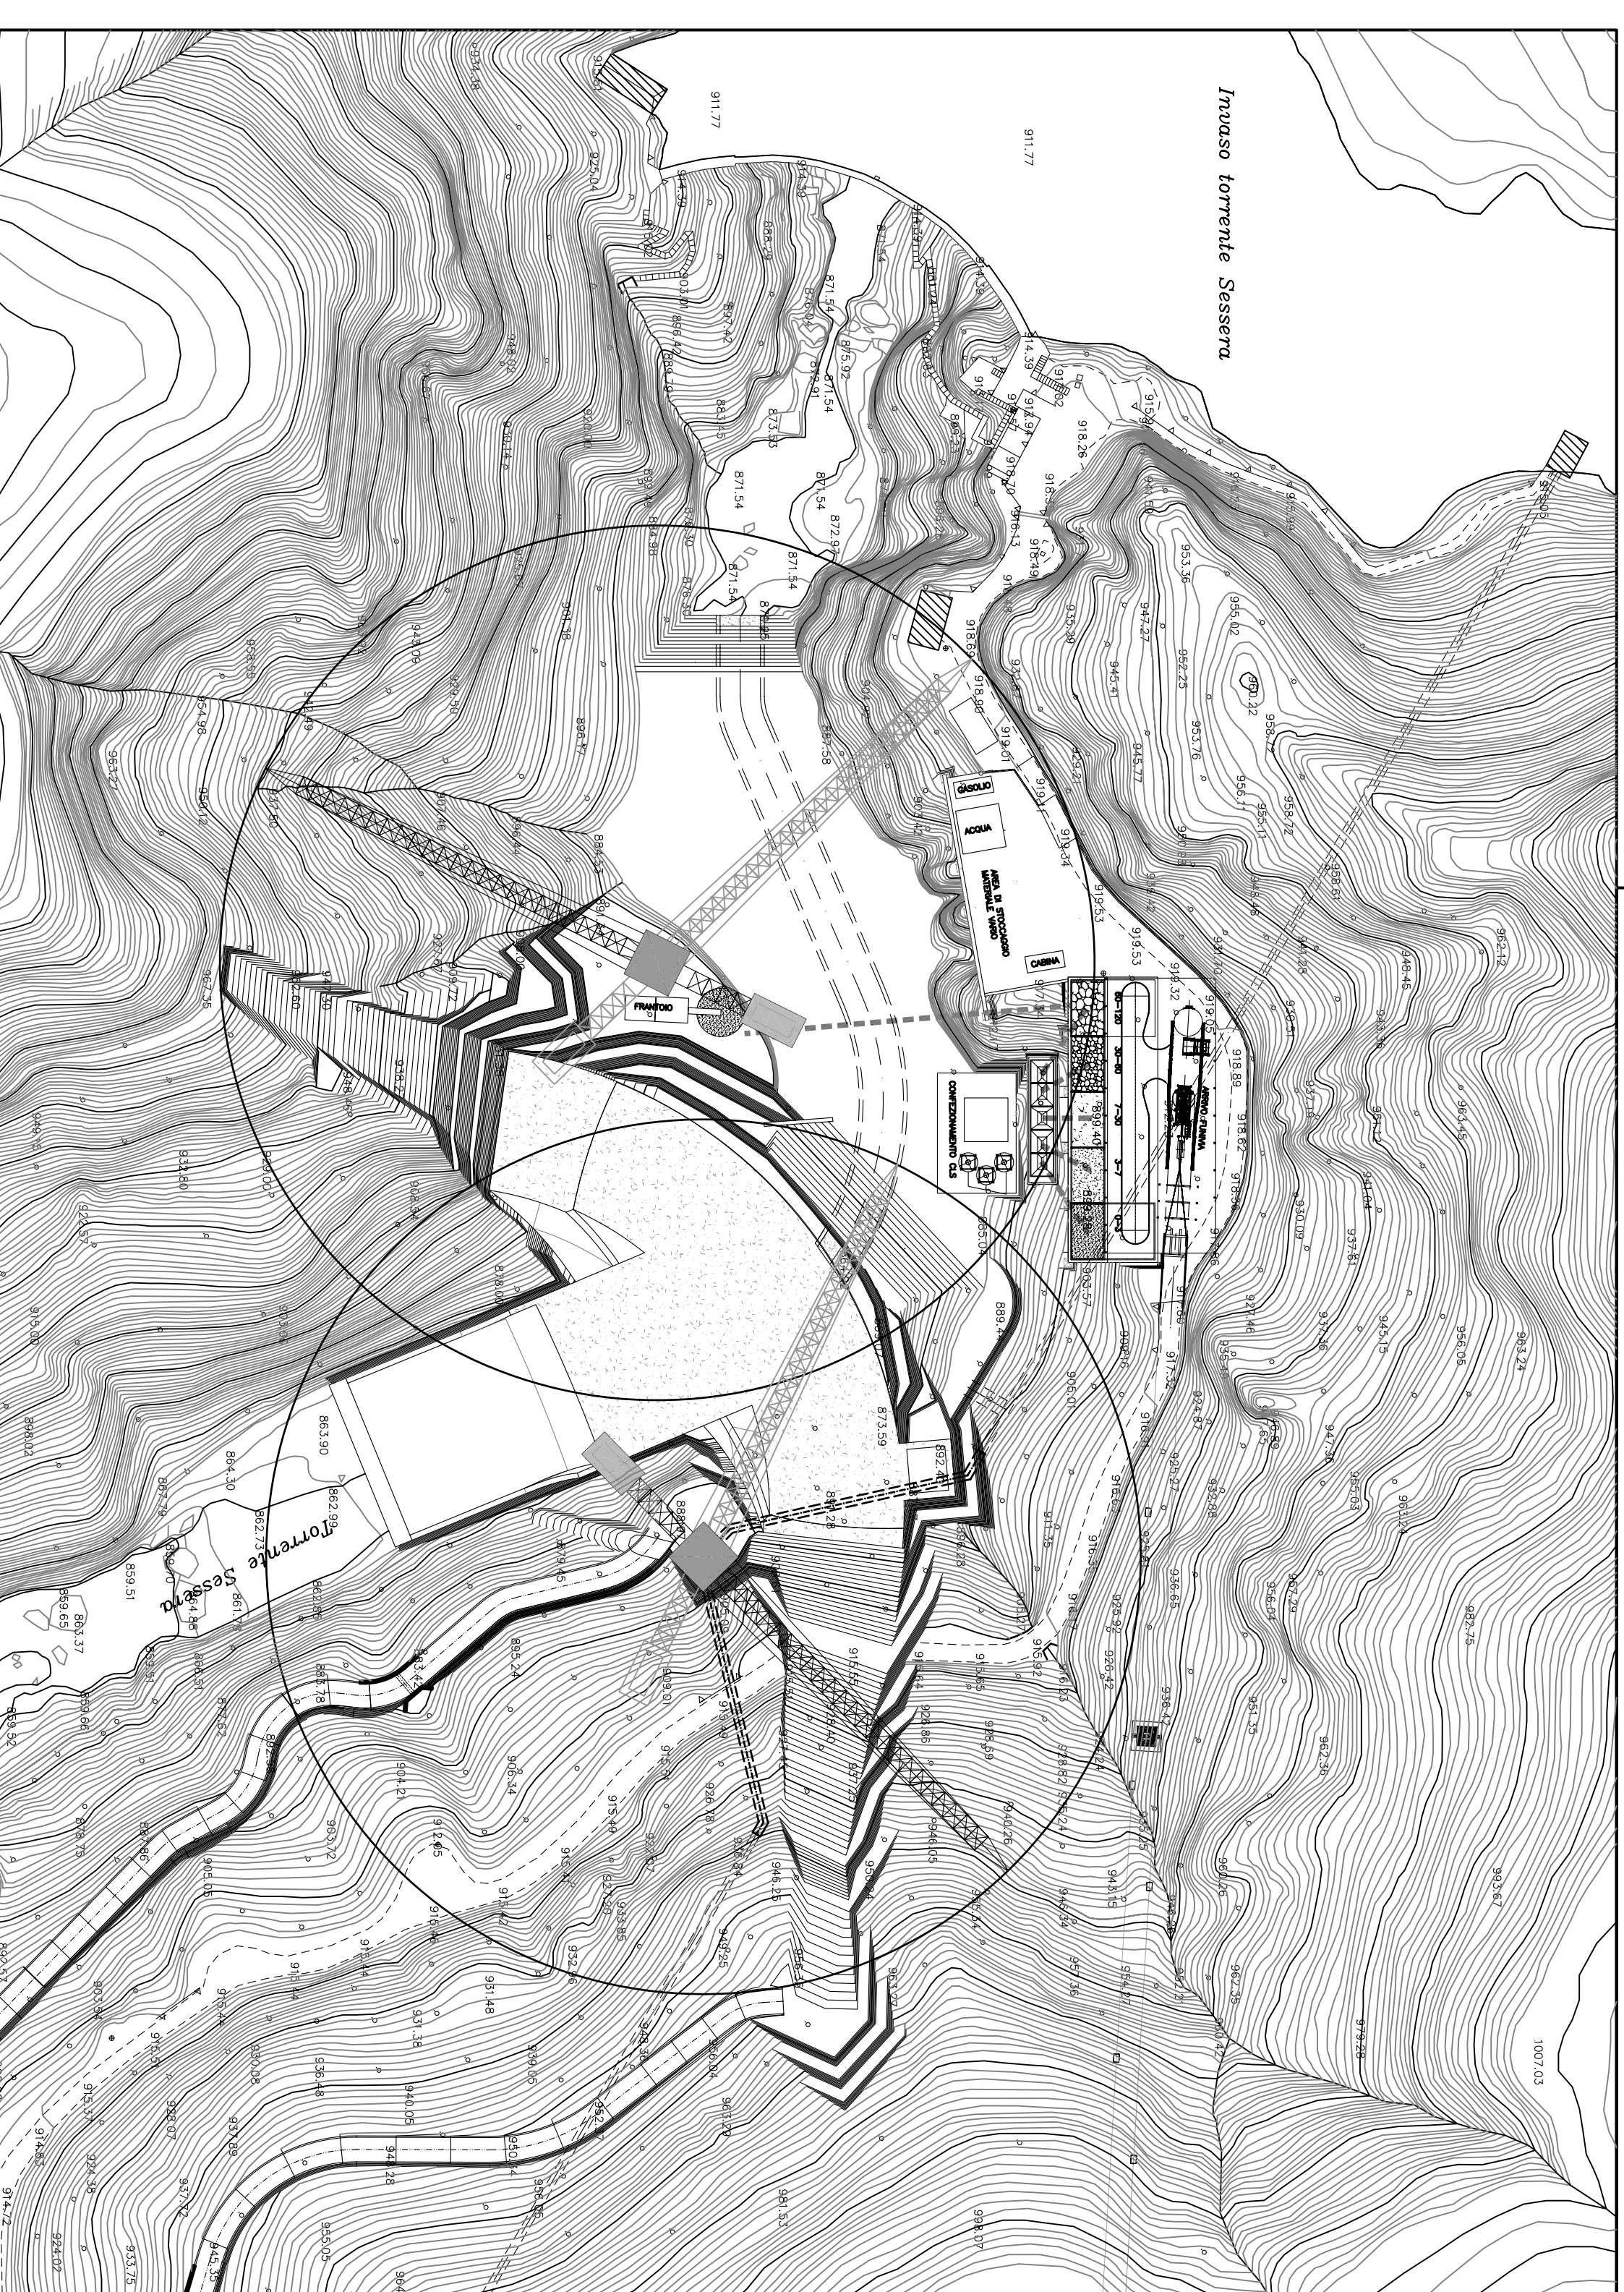

**FASE 6**  
**Scala 1:1.000**


OPERAZIONI  
-Ultimazione getti corpo diga;  
-Installazione apparecchiature elettromeccaniche, strumentazioni, linee elettriche, etc;  
-Demolizione scollatore di tombatura torrente Sessera  
-Demolizione e ricostruzione capannoni  
-Esecuzione edificio di controllo scarico di mezzo-fondo;

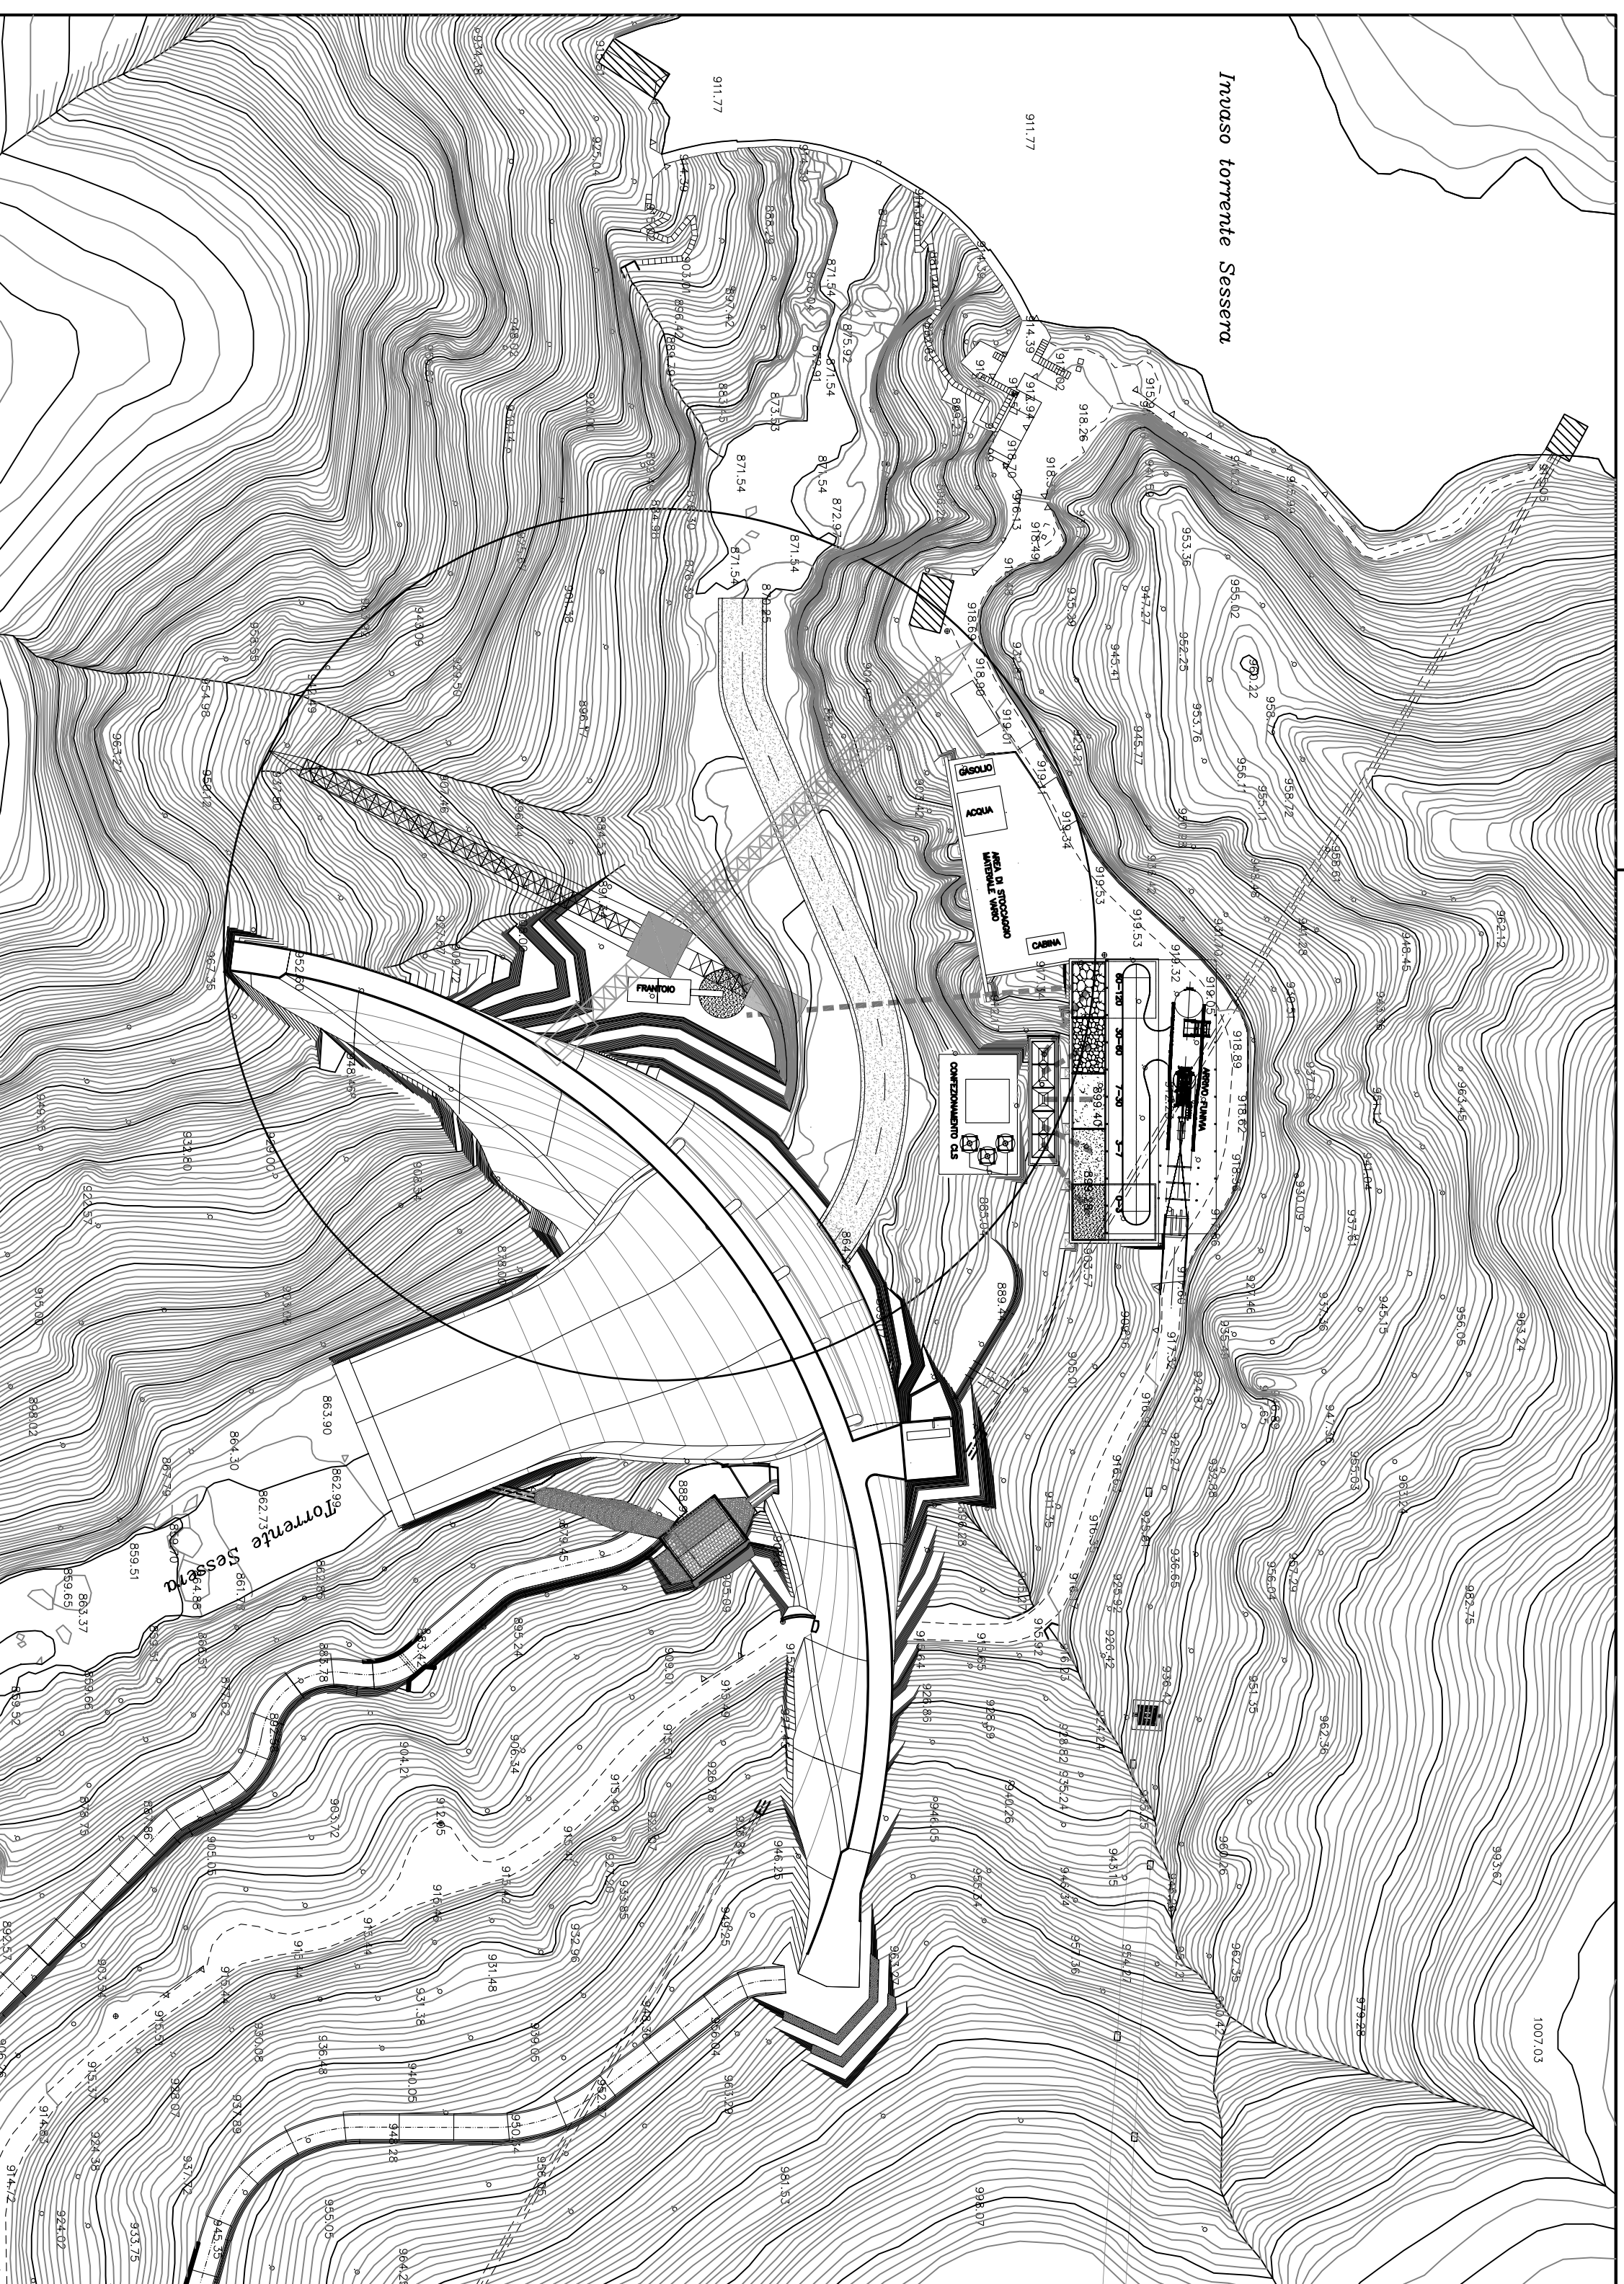

**FASE 8**  
**Scala 1:1.000**

OPERAZIONI  
-Rimozione impianto di betonaggio;  
-Ultimazione opere elettromeccaniche e elettriche;  
-Ricondizione finali strade di accesso;

N.B. Le fasi con la demolizione della diga e con gli invasi sperimentali sono riportate sulle tav. DD46

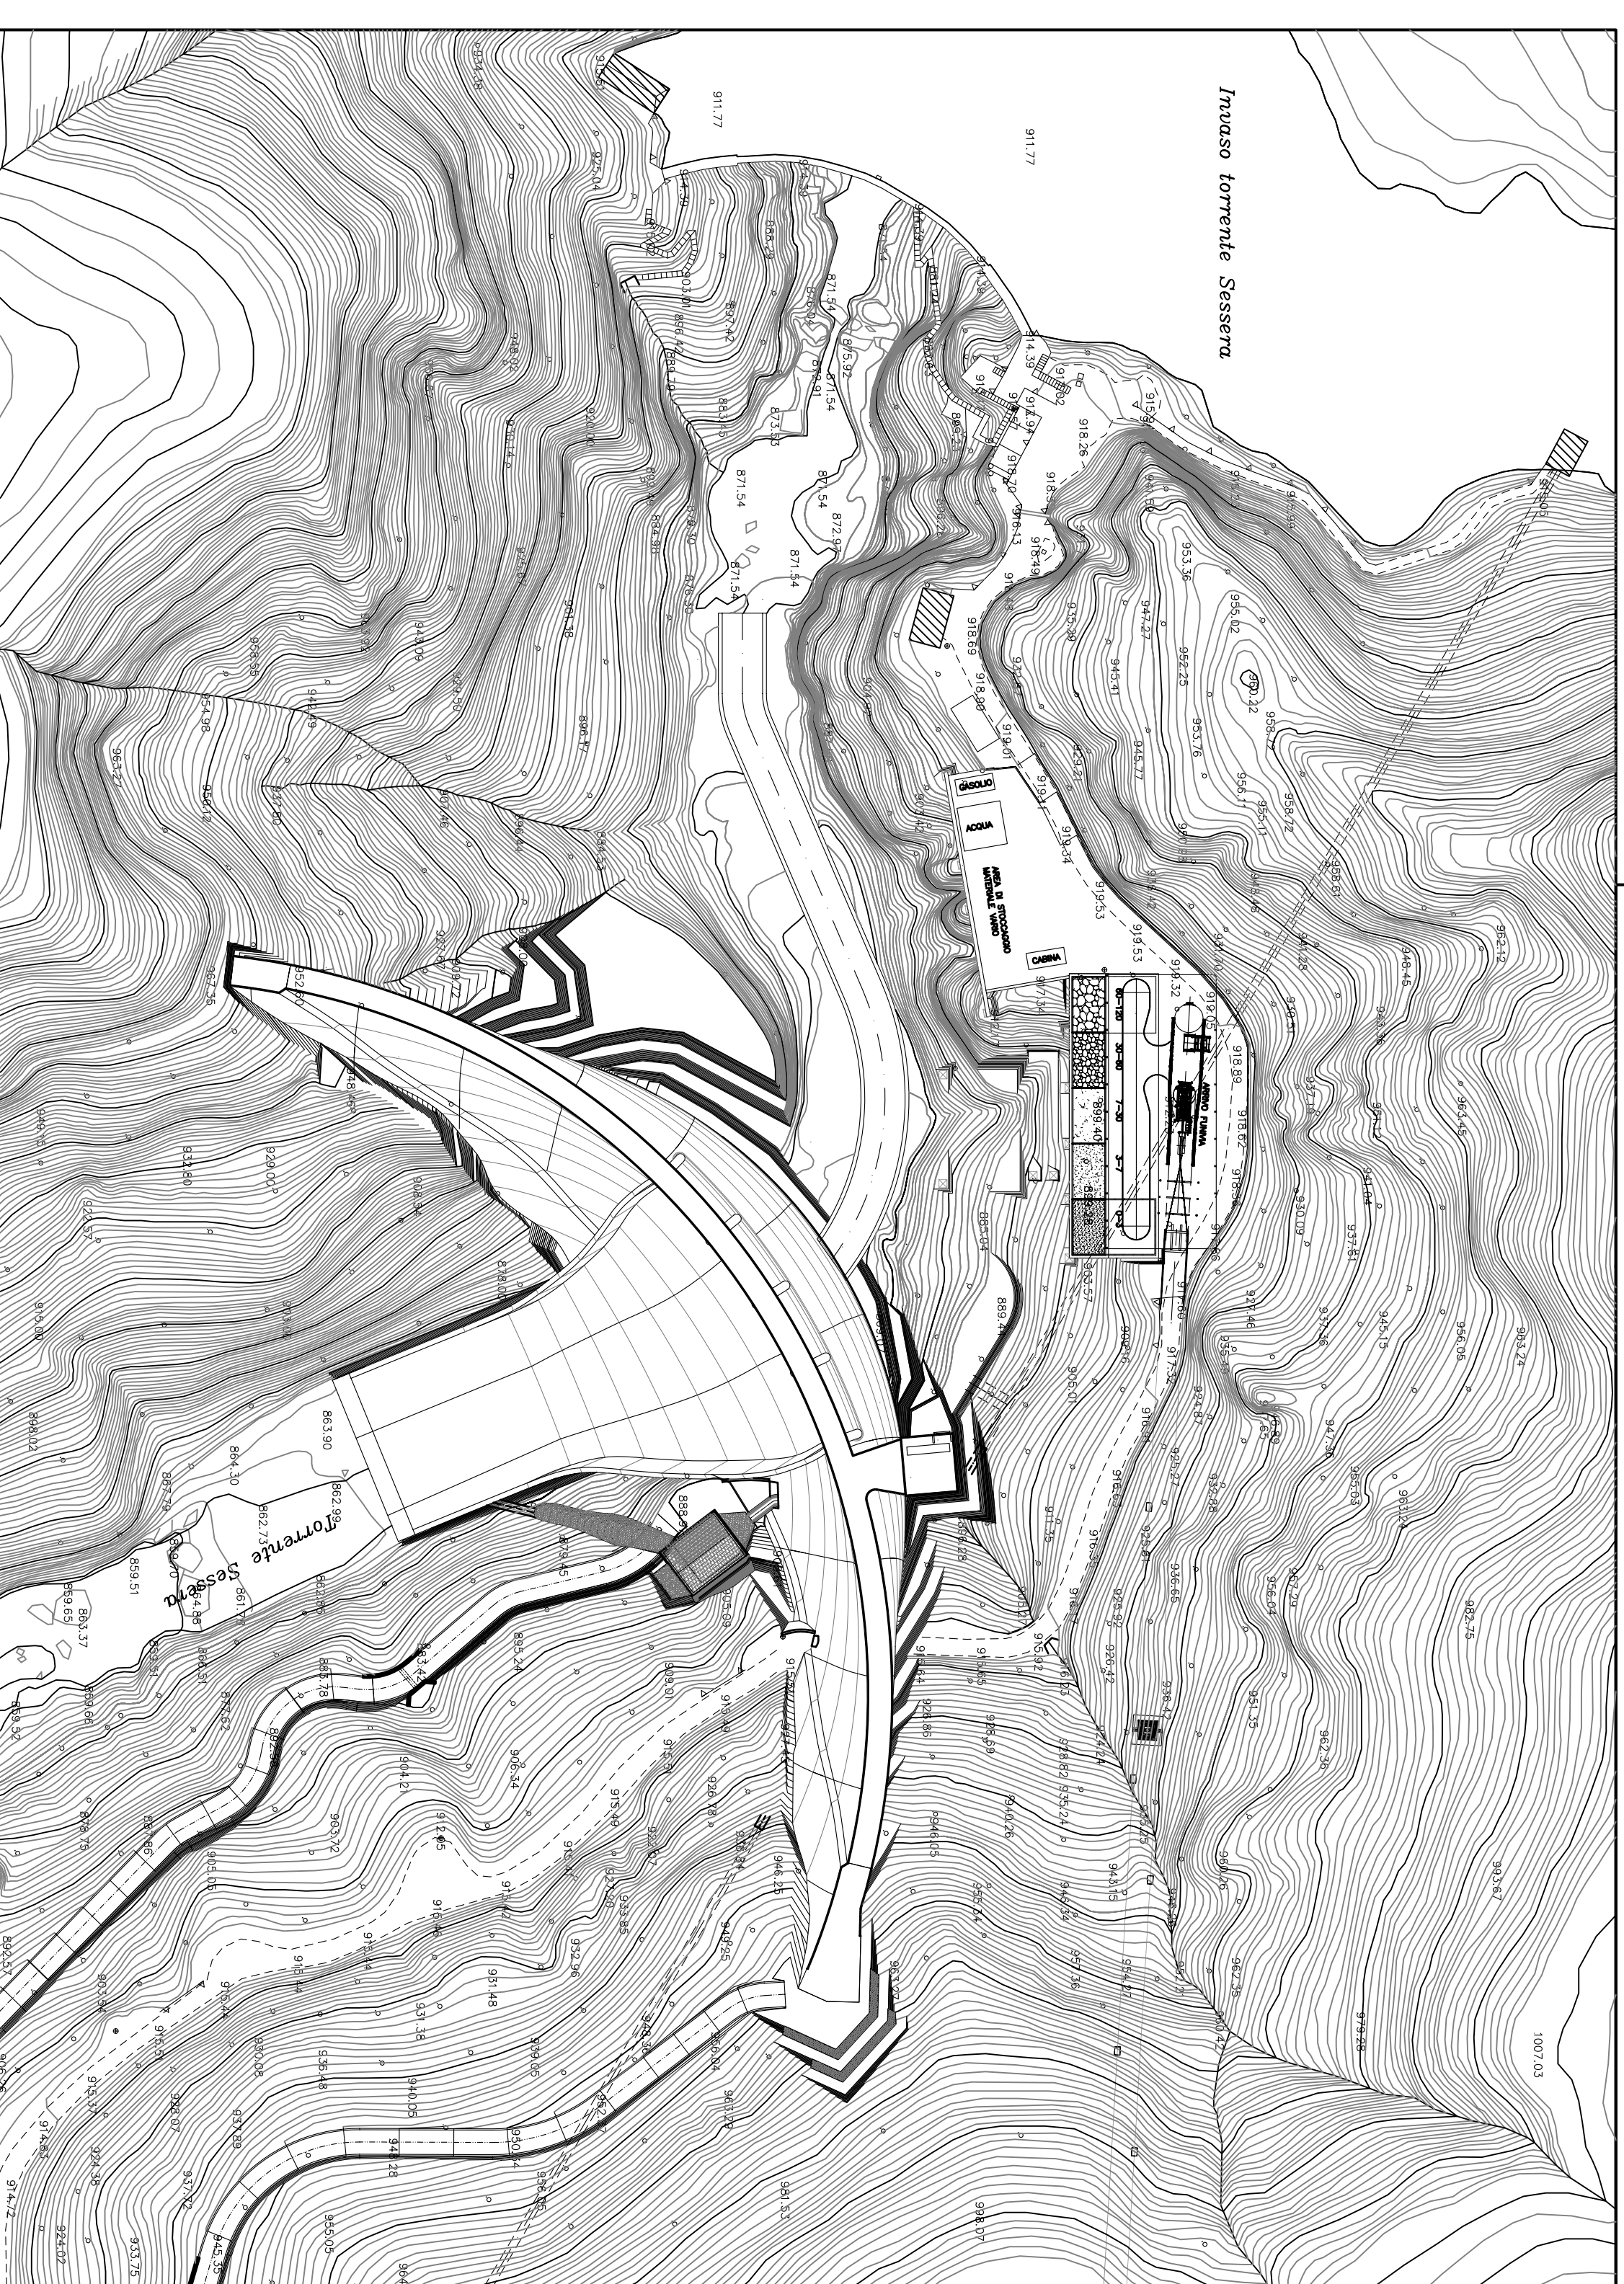

**CONSORZIO DI BONIFICA DELLA  
BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE**

RIFACIMENTO INVASO SUL TORRENTE SESSERA IN SOSTITUZIONE  
DELL'ESISTENTE PER IL SUPERAMENTO DELLE CRISI  
IDRICHE RICORRENTI, IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA IDRICA  
DEGLI INVASI ESISTENTI SU TORRENTI RAVALSANELLA ED OSTOLA,  
LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DEL COMPRESORIO

ATTIVITÀ DI PROTEZIONE	DATA INIZIO
PROGETTO E REDAZIONE	1987
ESECUZIONE E CONTROLLO	2008
APPROVAZIONE PROGETTO	1989
COLLABORAZIONE	PROGETTAZIONE EDIZIONE
CONFESSIONE <b>S. G. S. E. I. F. I.</b> S. G. S. E. I. F. I. S.p.A. Piazzale della Sessera, 16 - 13042 S. G. S. E. I. F. I. TEL. 0112/750311	TRACIA N. <b>DP10</b>
	PROGETTO <b>FA5 DI CARINER DALLA 5 ALLA 8</b>
PROGETTO DEFINITIVO	REVISIONE N. 02/02
PROGETTO DEFINITIVO	REVISIONE N. 01/01
PROGETTO DEFINITIVO	REVISIONE N. 01/01
PROGETTO DEFINITIVO	REVISIONE N. 01/01
PROGETTO DEFINITIVO	REVISIONE N. 01/01
PROGETTO DEFINITIVO	REVISIONE N. 01/01
