



**FASE 1**

– SPOSTAMENTO CAMI DALLE CANALETTE ESISTENTI NEI TUBI CORRUGATI PROMVISORI  
– DECESPUGLIAMENTO

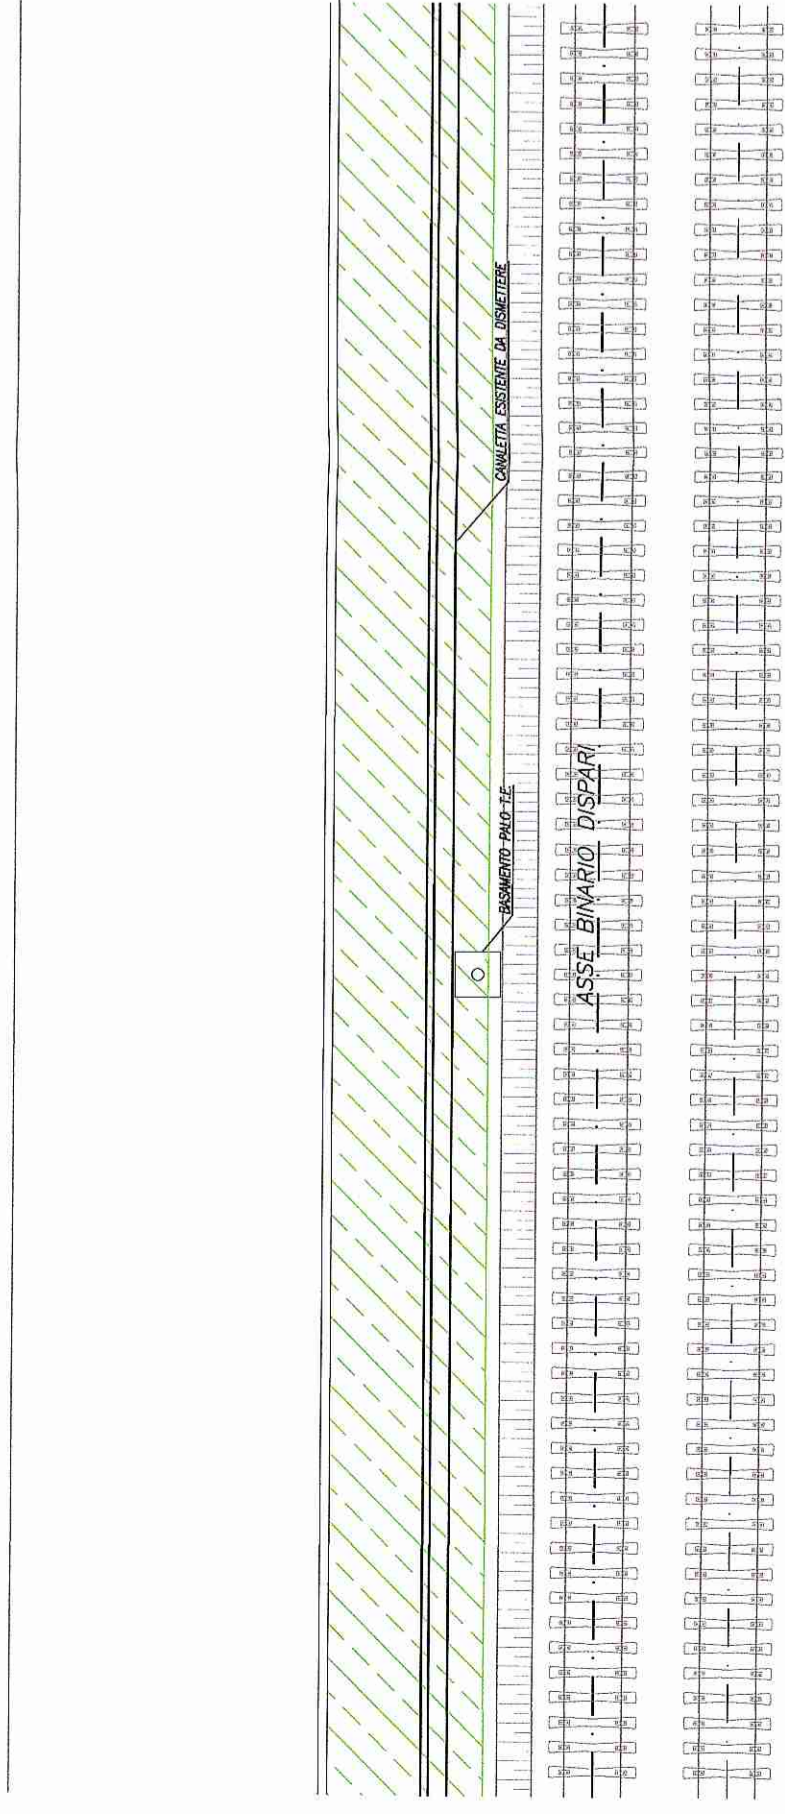


**FASE 2**

– ESECUZIONE BOB SUPERFICIALE A GARANZIA DELLE AREE DI LAVORO

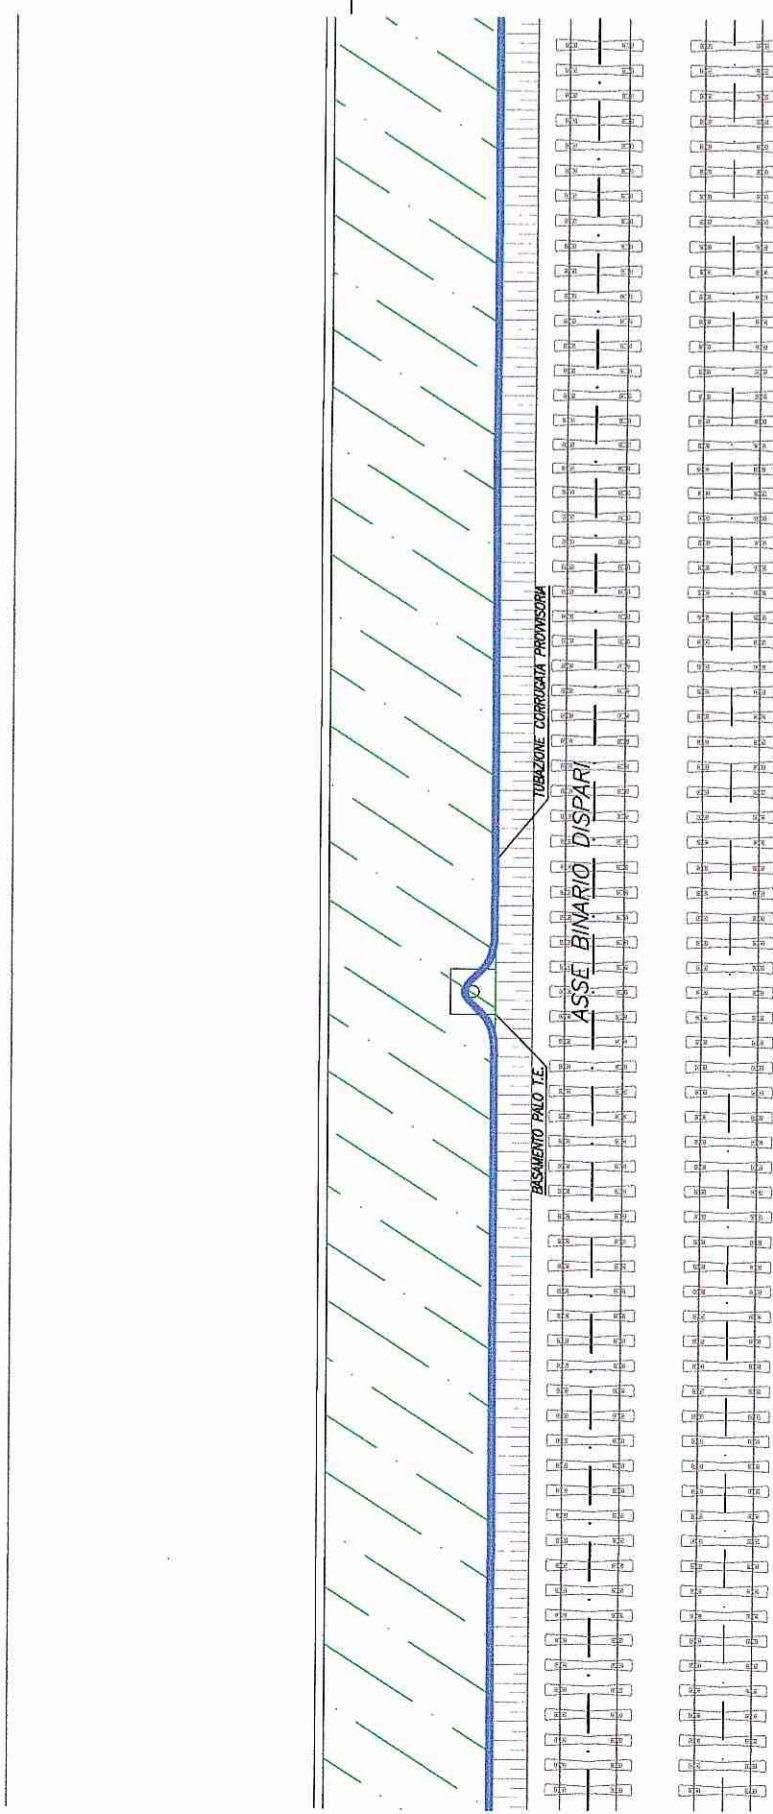


**FASE 3**

– ESECUZIONE BOB PROFONDA H= 7.00 m IN CORRISPONDENZA DEL CORDOLO  
– ESECUZIONE BOB PROFONDA H= 4.00 m DOVE PREVISTA

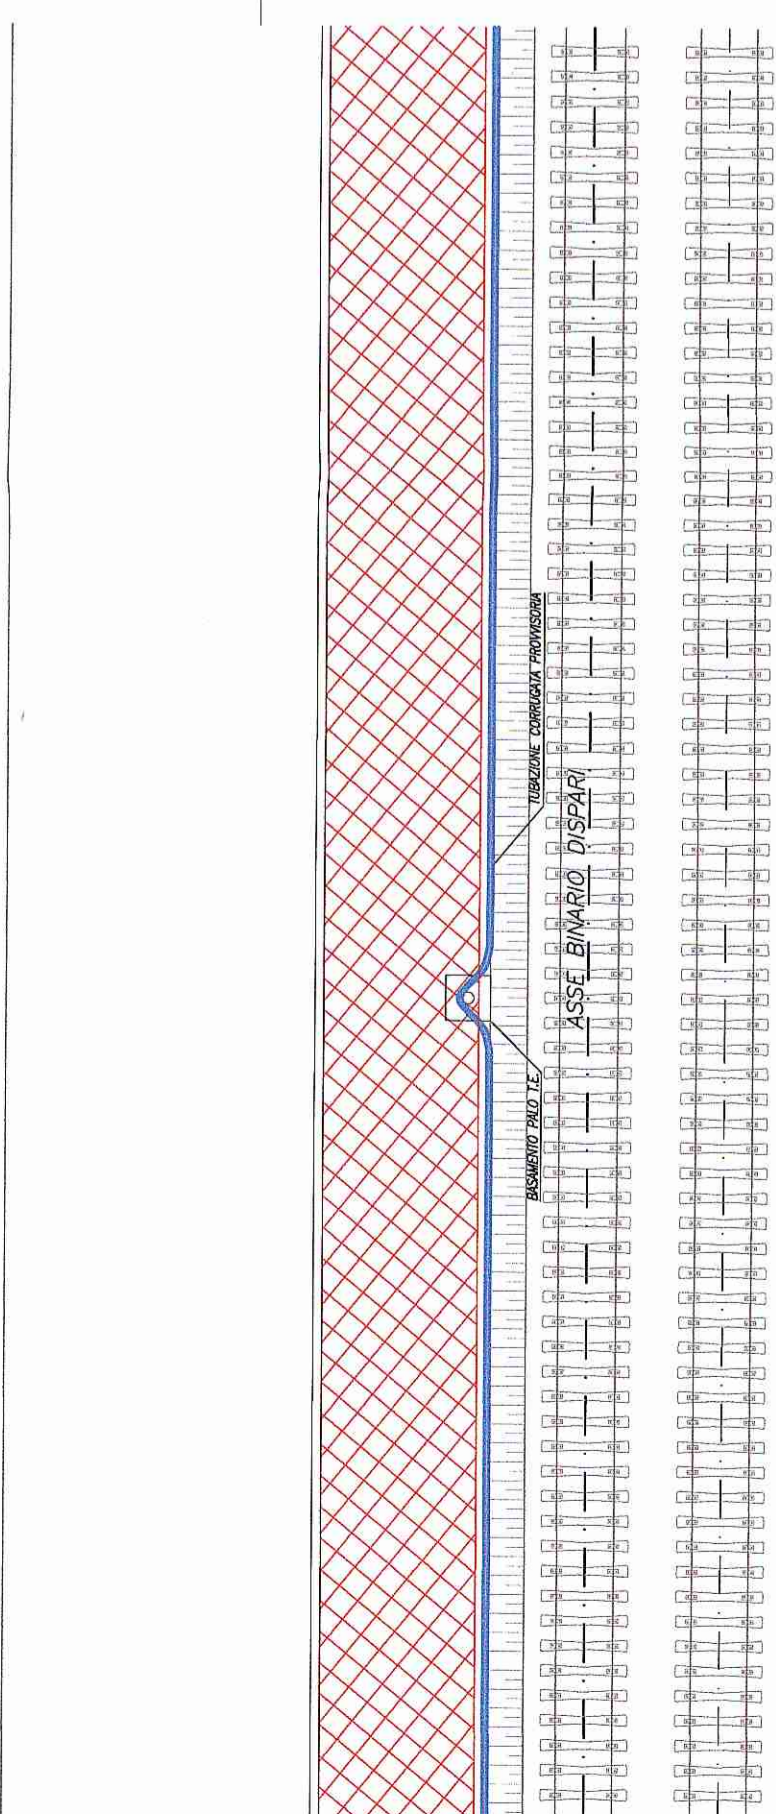


**FASE 4**

– SCAVO PER REALIZZAZIONE OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

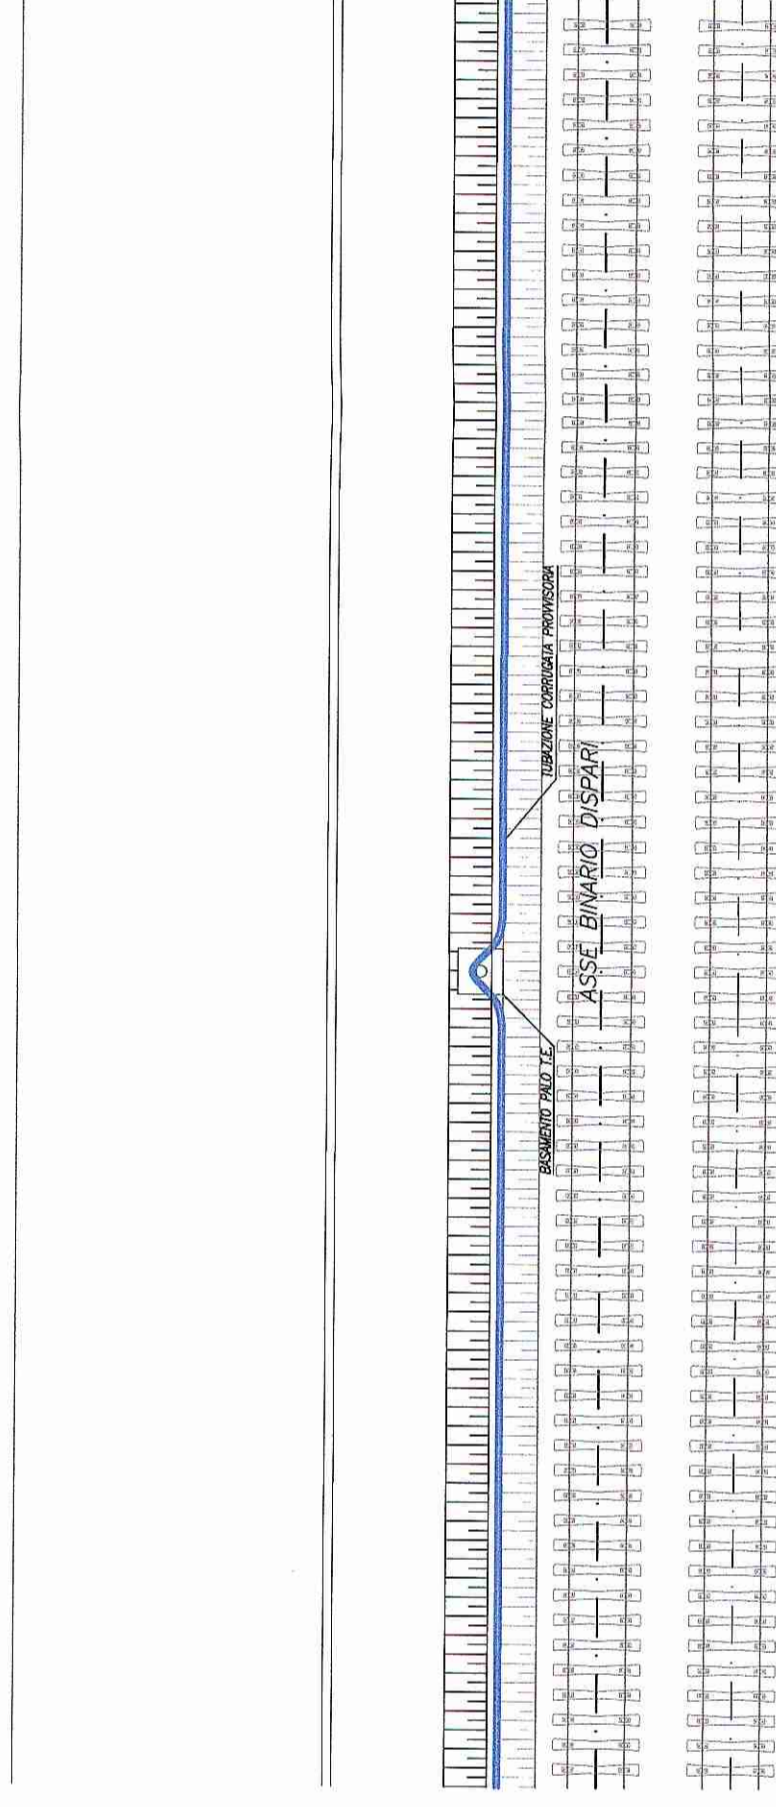


**FASE 5**

– REALIZZAZIONE DEI MICROPAI, POSA DEL CSL MAGRO E REALIZZAZIONE DEL CORDOLO DI FONDAZIONE  
(PREVISTI PER LE BARRIERE BA16 E BA17)

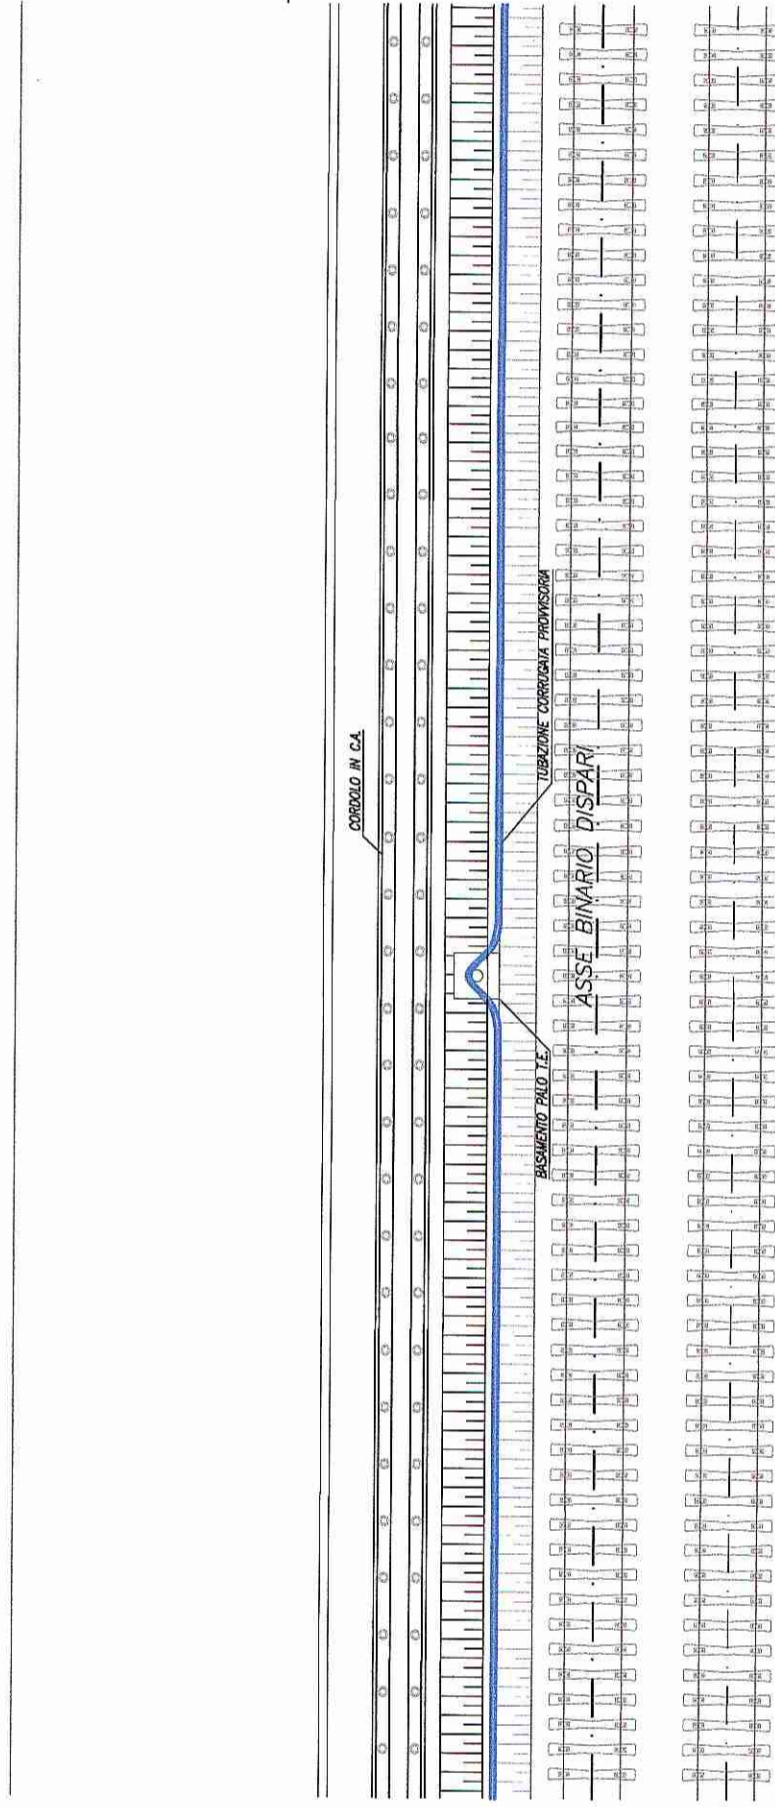


**FASE 6**


– POSA IN OPERA DELLE BARRIERE ANTRIMUORE  
– RIFOSIIONAMENTO DELLE CANALINE PORTA CAMI  
– RICONFIGURAZIONE DELLA SCARPATA ESISTENTE

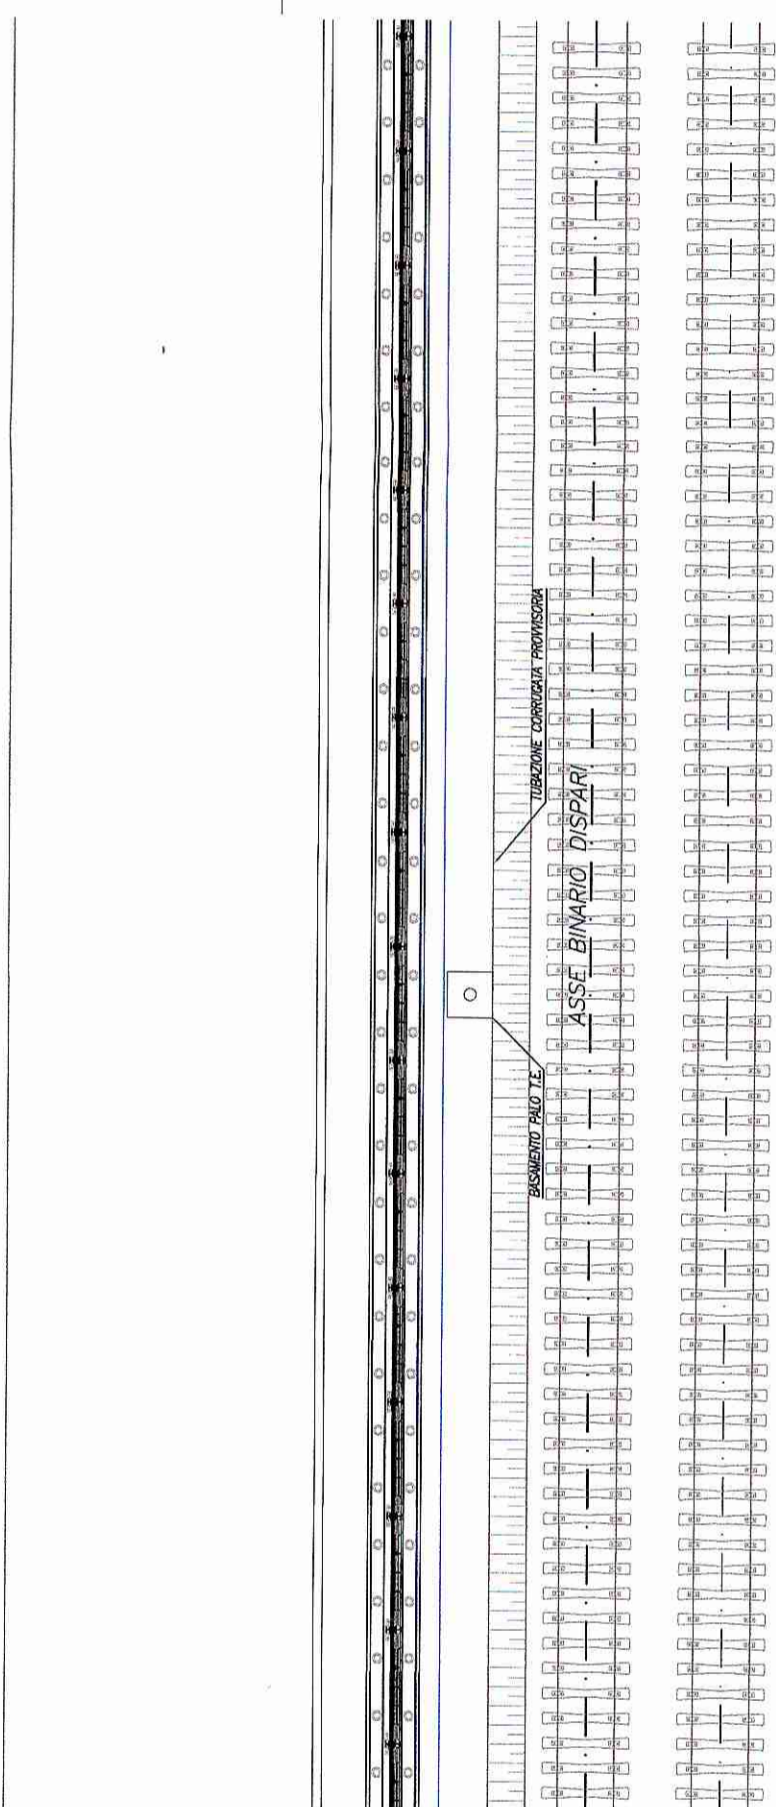


NB: Ogni 1 metro della parete fonoassorbente esistente (Area SH-Ty Color) non sarà effettuata operazione di scavo e marcia.

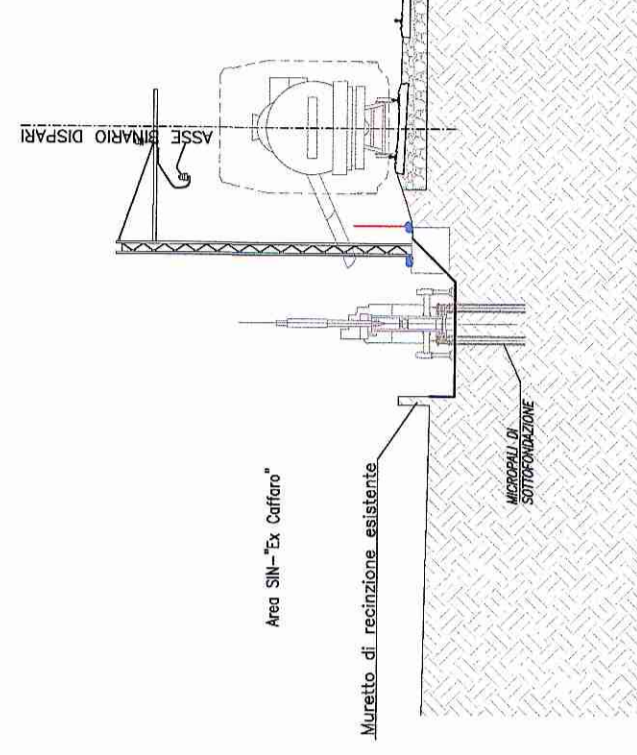

NB: Ogni 1 metro della parete fonoassorbente esistente (Area SH-Ty Color) non sarà effettuata operazione di scavo e marcia.

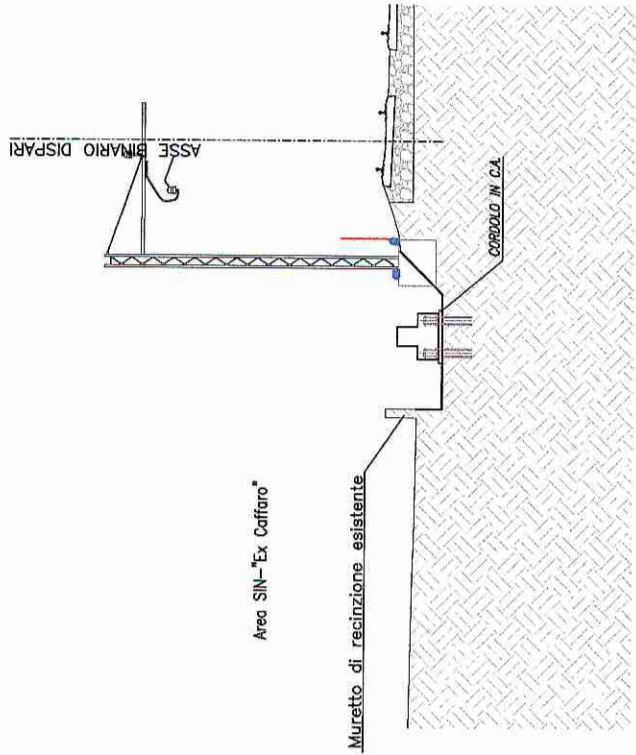

NB: Ogni 1 metro della parete fonoassorbente esistente (Area SH-Ty Color) non sarà effettuata operazione di scavo e marcia.

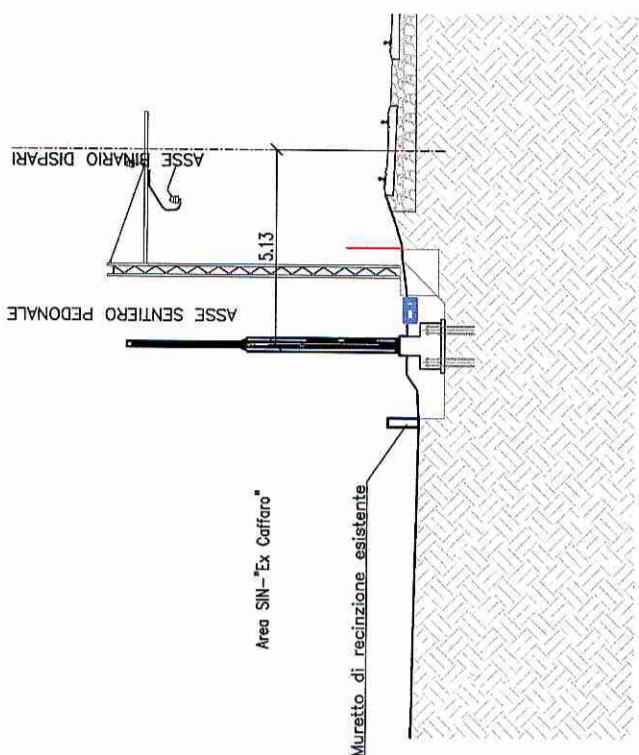

PER ULTERIORI DETTAGLI RELATIVI ALLE FASI REALIZZATIVE SI RIMANDA AGLI ELABORATI DI CANTIERIZZAZIONE:

- INGG00EZZWZCA0000001A
- INGG00EZZWZCA0000002A
- INGG00EZZWZCA0000003A
- INGG00EZZWZCA0000004A

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE - A.T.I. - CAR SEGNALETICA STRADALE S.R.L. (Capogruppo) - SICURBAU S.R.L.



PROGETTAZIONE: S.T.E. srl - Italiana Sistemi srl  
PROGETTO ESECUTIVO

LINEA A.V./A.C. TORINO - VENEZIA Tratta MILANO - VERONA  
Lotto funzionale Treviglio-Brescia

INTERVENTI DI MITIGAZIONE ACUSTICA INGRESSO URBANO  
DELL'INTERCONNESSIONE DI BRESCIA OVEST E NODO DI BRESCIA  
BARRIERE ANTRIMUORE

Fasi realizzative opere di sostegno B.A.16 e B.A.17 - Tav. 3 di 3

SCALA :  
varie

ENTRATA IN OPERA / DISCIPLINA / PROG. / REV.

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato/Date
A	Emissione Esecutiva	M. Simone	Dic.2016	M. Borrelli	Dic.2016	F.M. La Camera	Dic.2016	F.M. La Camera
