
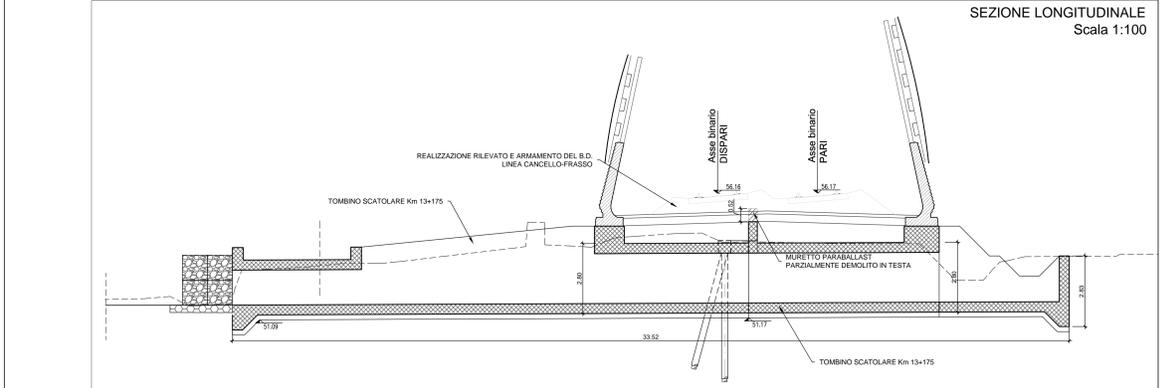
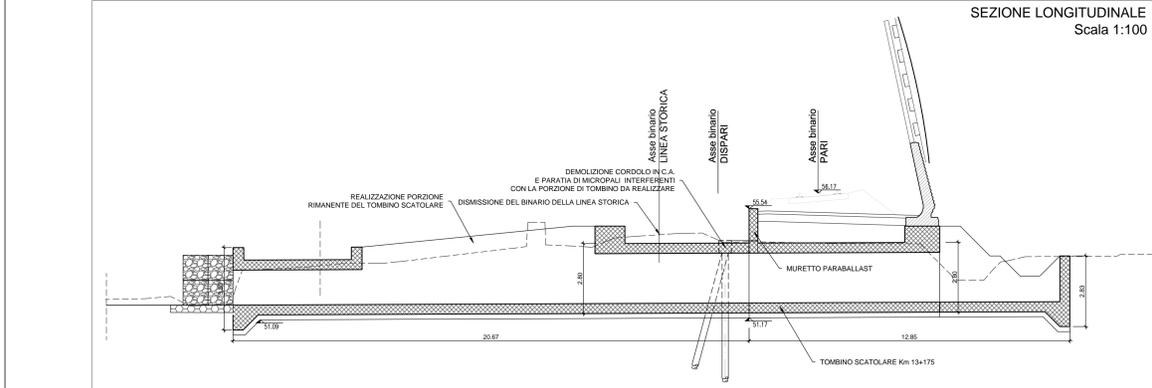
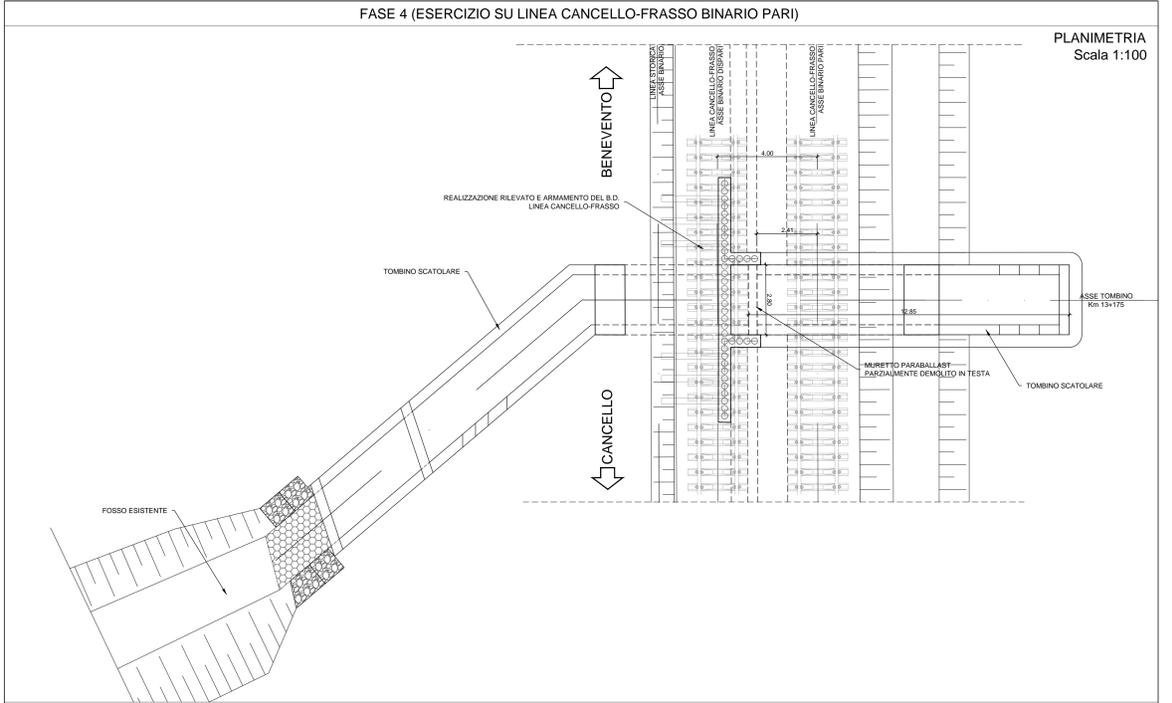


- DESCRIZIONE FASISTICA**
- FASE 1 (esercizio su linea storica):**
- Realizzazione paratia di micropali Ø250, int. 30 cm, L=9.00 m e cordolo in C.A. 50x50 cm per successivo scavo di sbancamento.
 - Scavo di sbancamento fino a quota del magrone della porzione di tombino lato futuro binario pari della linea Canello-Frasso.
 - Realizzazione del tombino per un tratto di 12.85 m con un franco di 0.70 m dal cordolo della paratia di micropali per i ferri di ripresa.
- FASE 2 (esercizio su linea storica):**
- Realizzazione del rilevato ferroviario e armamento del binario pari della linea Canello-Frasso.
 - Attivazione e spostamento dell'esercizio sul binario pari della linea Canello-Frasso.
- FASE 3 (esercizio su linea Canello-Frasso binario pari):**
- Dismissione del binario della linea storica.
 - Demolizione della porzione di opera provvisoria interferente con la realizzazione della restante parte di tombino da realizzare.
 - Scavo fino a quota magrone della restante porzione di tombino ancora non realizzata.
 - Realizzazione della restante porzione di tombino e sistemazione del tratto di raccordo con fosso esistente con materassi e gabbioni.
- FASE 4 (esercizio su linea Canello-Frasso binario pari):**
- Demolizione di 52 cm di muretto parballast, realizzato al disopra del tombino scatolare in fase "1c", per completamento del rilevato ferroviario.
 - Armamento del binario dispari della linea Canello-Frasso.
 - Attivazione del binario dispari della linea Canello-Frasso

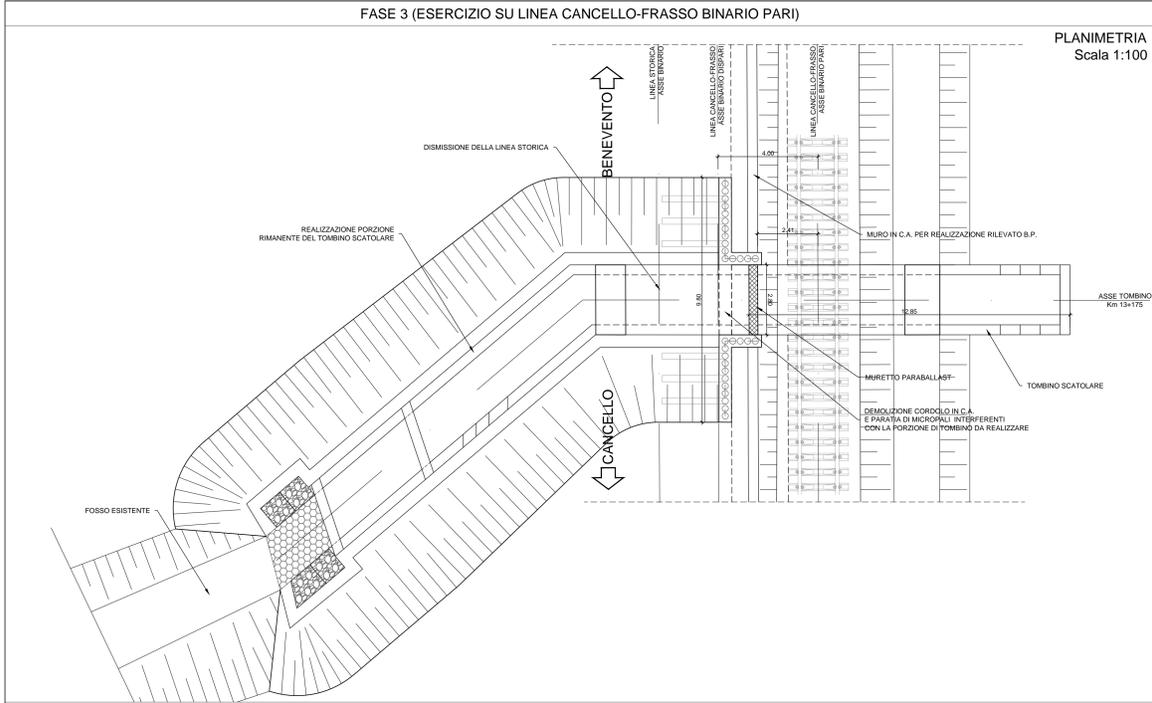

COMMITTENTE:
RFI
PIRE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI:
ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE:
CONSORZIO CFT
PIZZAROTTI

PROGETTAZIONE:
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI
ING. FEDERICO DURASTANTI

PROGETTISTA:
ING. FEDERICO DURASTANTI

DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE:
ING. PIETRO MAZZOLI
Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche

PROGETTO ESECUTIVO

**ITINERARIO NAPOLI-BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
1° LOTTO FUNZIONALE CANCELLO-FRASSO TELESINO E VARIANTE ALLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO NEL COMUNE MADDALONI**

TOMBINI E PONTICELLI IDRAULICI
Tombino scatolare 2mx2m progr. 13+175 : fasi esecutive

APPALTATORE:
CONSORZIO CFT
IL DIRETTORE TECNICO
Gen. C. BIANCHI
Ottobre 2018

SCALA:
varie

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.
I F I N 0 1 E Z Z B Z I N 0 6 0 0 0 0 2 B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Rev. Istruttoria FF 01/018	L.Pacelli	20/09/2018	F.Durastanti	20/09/2018	F.Mazzoli	20/09/2018	F.Durastanti
C	Progettazione esecutiva	L.Pacelli	Ottobre 2018	F.Durastanti	Ottobre 2018	F.Mazzoli	Ottobre 2018	

File: IFIN.0.1.E.ZZ.BZ.IN.06.0.0.002.B.dwg n. Elab.: 13/07/2018
