




# SARLUX

Refining & Power

m\_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0003328.11-02-2019

Sarlux Srl



MATTM

D.G. Valutazioni e Autorizzazioni  
Ambientali

**Divisione III - RIR e AIA**

[aia@pec.minambiente.it](mailto:aia@pec.minambiente.it)

[dva@minambiente.it](mailto:dva@minambiente.it)

Commissione Istruttoria AIA – IPPC

[CIPPC@pec.minambiente.it](mailto:CIPPC@pec.minambiente.it)

ISPRA

[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

ARPAS

[dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it](mailto:dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it)

Sarroch, 7 febbraio 2019

**Oggetto:** Prescrizioni PIC relative all'istanza di modifica non sostanziale per lavori su serbatoio S102 - Procedimento ID 87/9719

**Riferimento:** Decreto 263 del 11.10.2017 di Riesame complessivo dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio del Complesso Raffineria, IGCC e Impianti Nord della Sarlux Srl

Il sottoscritto Settimio Guarrata, amministratore delegato della Società Sarlux Srl, in qualità di Gestore del sito produttivo Sarlux Srl di Sarroch,

premesso che

in data 21.01.2019 la Commissione Istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale – IPPC del MATTM ha trasmesso il Parere Istruttorio Conclusivo ritenendo la proposta di modifica accoglibile con le seguenti prescrizioni:

1. il Gestore deve provvedere ad aggiornare il piano di installazione dei doppi fondi;
2. il Gestore deve comunicare i tempi di realizzazione dell'intervento di modifica relativo al serbatoio S102;
3. il Gestore deve provvedere all'impermeabilizzazione del bacino di contenimento;

comunica

di voler anticipare al 2019 la realizzazione del doppio fondo del serbatoio S102, previsto a piano per il 2020, e che i lavori di modifica del serbatoio S102 comprenderanno l'impermeabilizzazione del bacino di contenimento come da cronoprogramma allegato.

L'aggiornamento del piano completo di realizzazione dei doppi fondi per l'intero stabilimento, attualmente in fase di elaborazione, verrà inviato unitamente al rapporto annuale 2018.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e/o precisazioni, porgiamo

Cordiali saluti


Sarlux Srl  
L'Amministratore Delegato  
Ing. Settimio Guarata



GP  
GJ

# SERBATOIO S102 - IMPIANTI NORD

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Pri
1	SERBATOIO S102	405 g	lun 17/12/18	ven 03/07/20	
2	VUOTAMENTO E PULIZIA SERBATOIO	55 g	lun 17/12/18	ven 01/03/19	
3	DEMOLIZIONE TETTO	40 g	lun 04/03/19	ven 26/04/19	2
4	SOSTITUZIONE FONDO E REALIZZAZIONE DOPPIO FONDO	120 g	lun 29/04/19	ven 11/10/19	3
5	RICOSTRUZIONE TETTO	100 g	lun 14/10/19	ven 28/02/20	4
6	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE	90 g	lun 02/03/20	ven 03/07/20	5
7	PAVIMENTAZIONE	90 g	lun 01/07/19	ven 01/11/19	

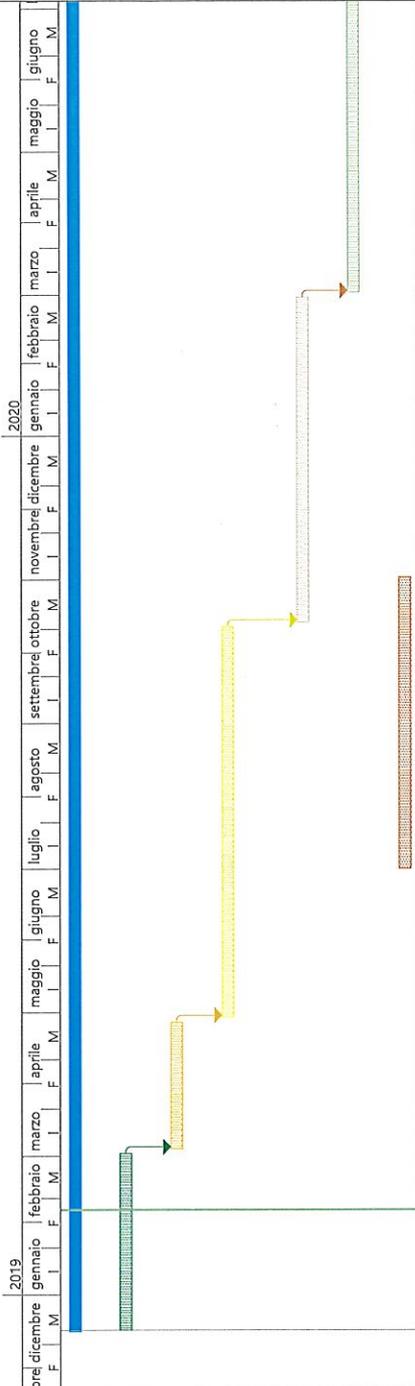

SERBATOIO S102 - IMPIANTI NORD

Attività:  Riepilogo progetto  Riepilogo manuale  Solo inizio  Scadenza

Divisione:  Attività inattiva  Attività manuale  Solo-fine  Avanzamento

Cardine:  Cardine inattiva  Riporto riepilogo manuale  Attività esterne  Avanzamento manuale

Riepilogo:  Riepilogo inattiva  Riepilogo manuale  Cardine esterno  Cardine esterno
