
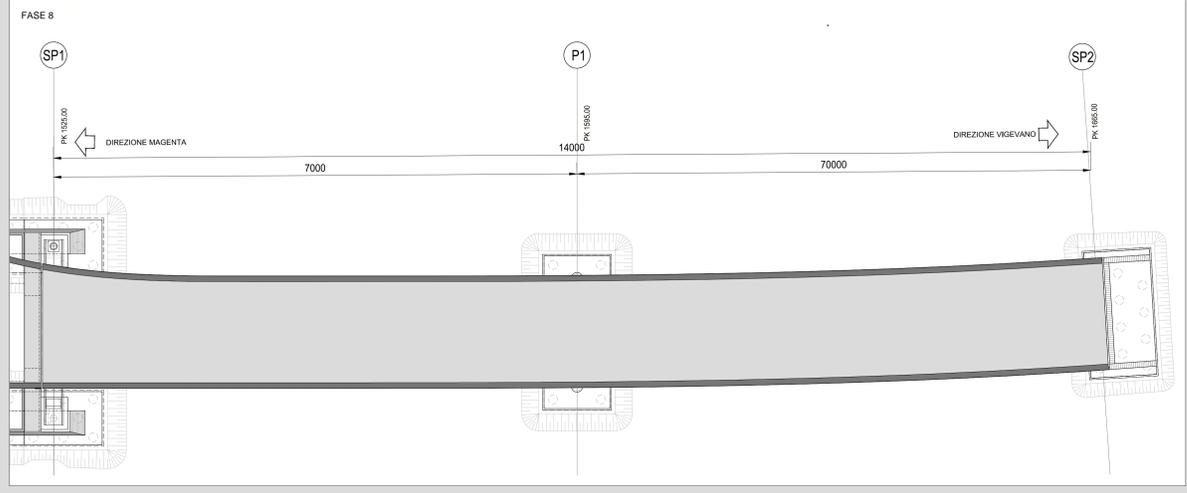
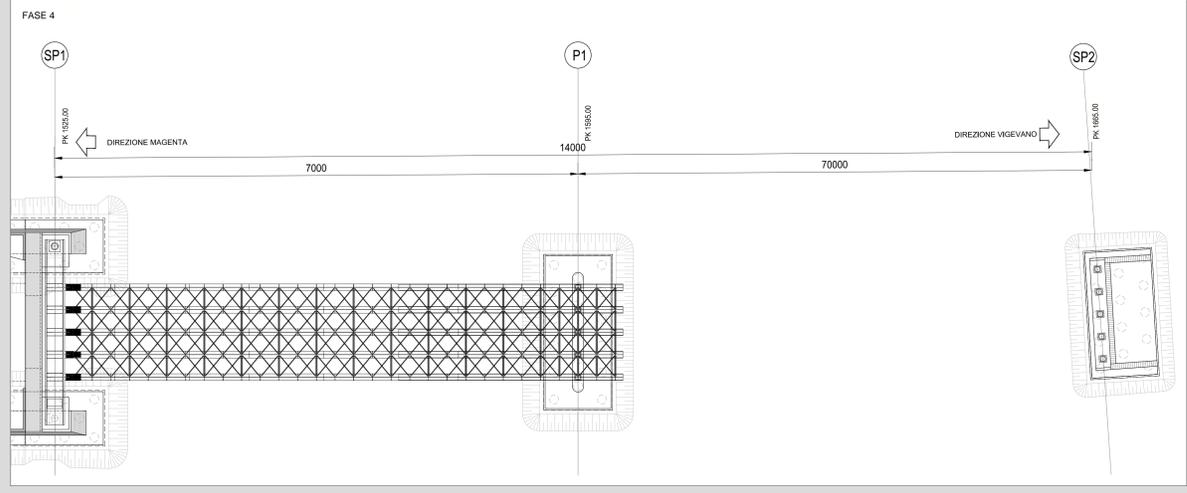
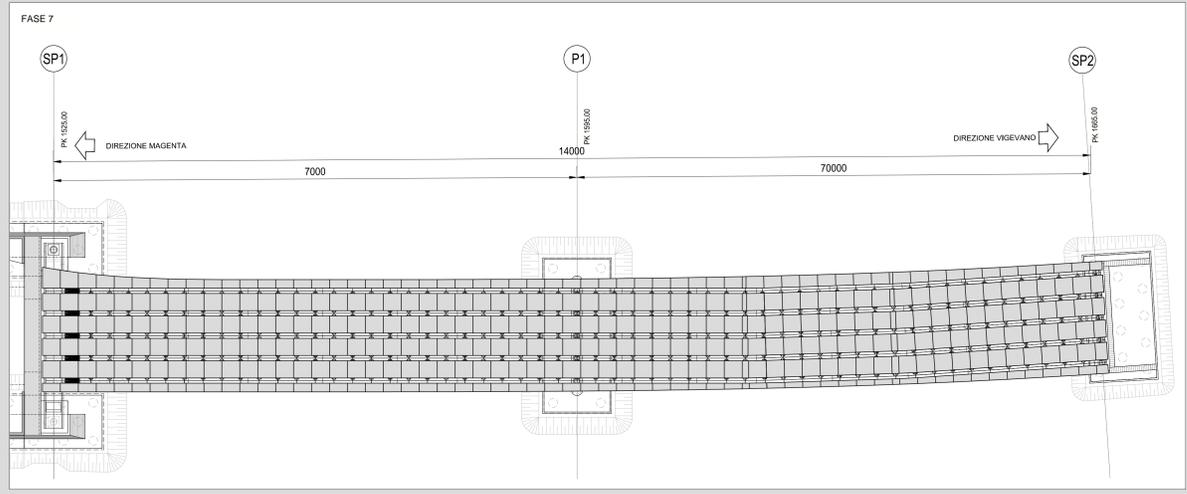
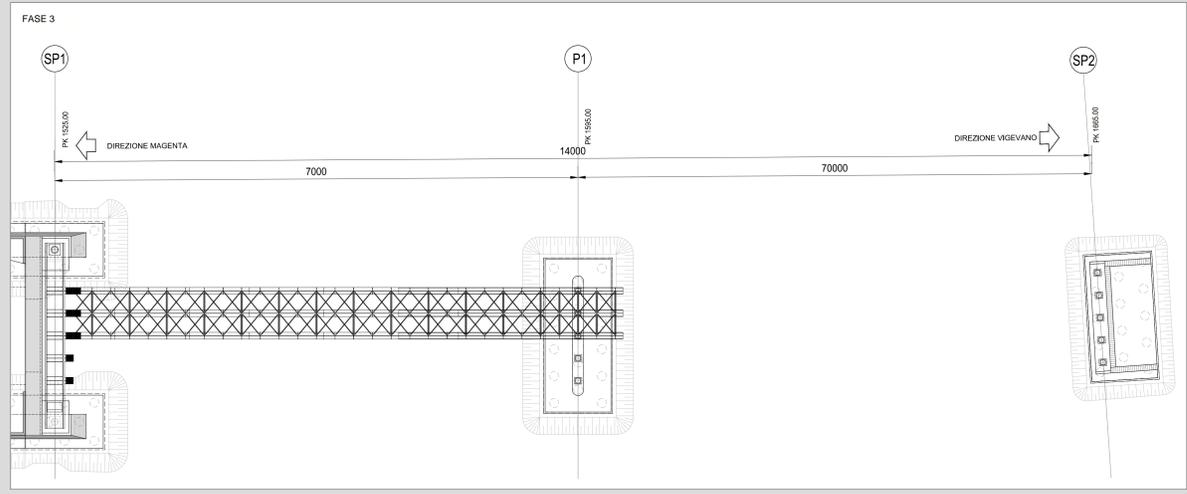
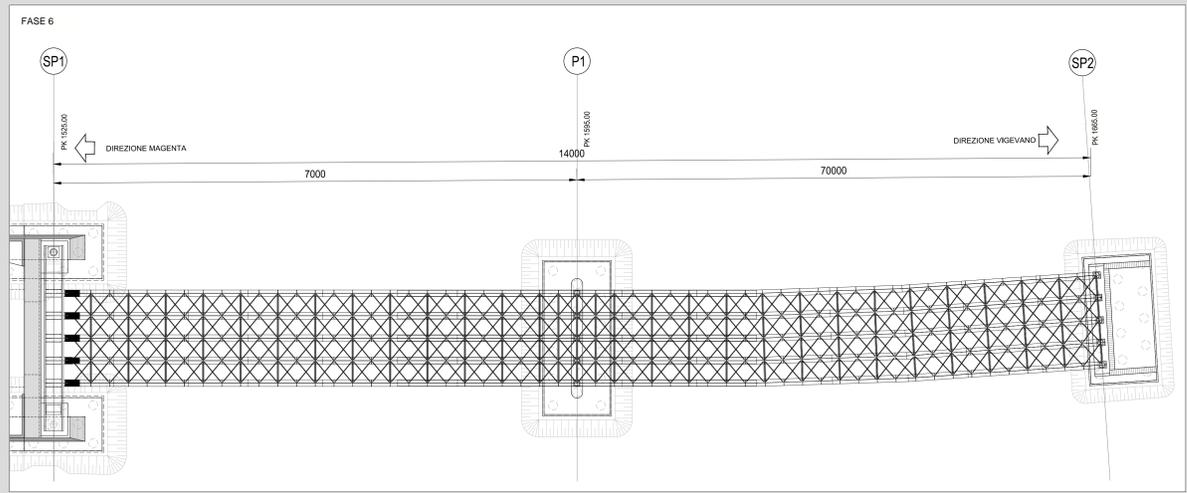


- FASE 1:**
- REALIZZAZIONE DEGLI SCAVI DELLE FONDAZIONI DALLE PILE E DELLE SPALLE
  - REALIZZAZIONE DELLE FONDAZIONI DELLA PILA E DELLE SPALLE
  - REALIZZAZIONE DEI PALI DELLE FONDAZIONI DELLA PILA E DELLE SPALLE
  - REALIZZAZIONE DEI RINTERRI DELLE FONDAZIONI DELLA PILA E DELLE SPALLE
- FASE 2:**
- REALIZZAZIONE DELLE ELEVAZIONI DELLE PILE E DELLE SPALLE
- FASE 3:**
- VARO DEI CONCI TRA LA PILA E LA SPALLA 1 DI TRE TRAVI ESTERNE
- FASE 4:**
- VARO DEI CONCI TRA LA PILA E LA SPALLA 2 DELLE ALTRE DUE TRAVI
  - CONNESSIONE DELLE TRE TRAVI VARATE IN FASE 3 CON LE DUE VARATE IN FASE 4 MEDIANTE LA CONTROVENTATURA DI PIANO
- FASE 5:**
- VARO DEI CONCI TRA LA PILA E LA SPALLA 2 DI TRE TRAVI ESTERNE
- FASE 6:**
- VARO DEI CONCI TRA LA PILA E LA SPALLA 1 DELLE ALTRE DUE TRAVI ESTERNE
  - CONNESSIONE DELLE TRE TRAVI VARATE IN FASE 5 CON LE DUE VARATE IN FASE 6 MEDIANTE LA CONTROVENTATURA DI PIANO
- FASE 7:**
- POSA IN OPERA DELLE PREDALLES
- FASE 8:**
- GETTO DELLA SOLETTA

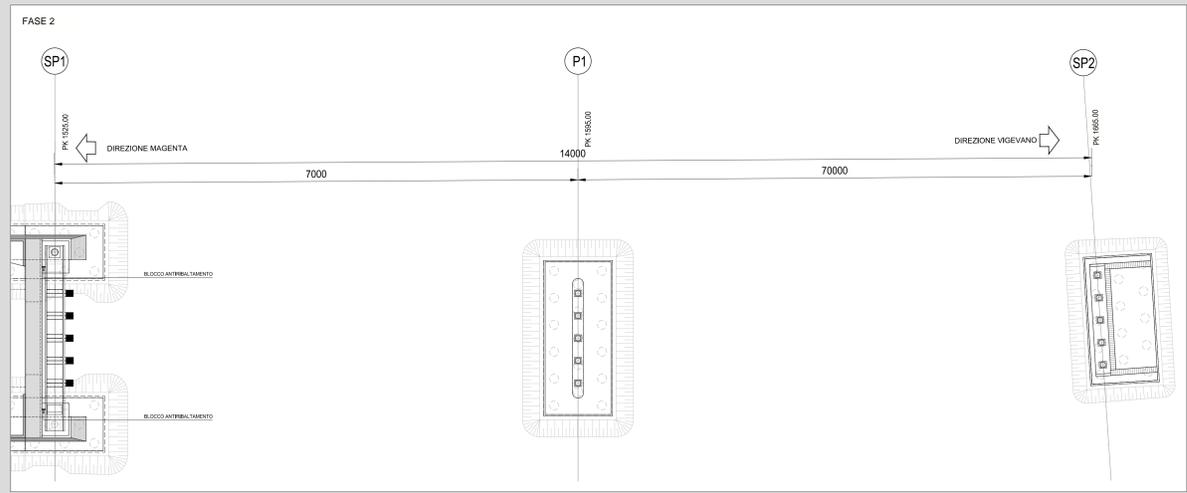

**ANAS S.p.A.**  
 Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

**LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S.11 A MAGENTA E LA TANGENZIALE OVEST DI MILANO**  
**VARIANTE DI ABBIATEGRASSO E ADEGUAMENTO IN SEDE DEL TRATTO ABBIATEGRASSO-VIGEVANO FINO AL PONTE SUL FIUME TICINO**  
**1° STRALCIO DA MAGENTA A VIGEVANO - TRATTA C**

**PROGETTO ESECUTIVO**

<b>STUDIO CORONA</b>	<b>ING. RENATO DEL PRETE</b>	<b>ECOPLAN</b>	<b>GE</b>
<b>ING. VALERIO BAIATI</b>	<b>ING. MARCO DEL PRATO</b>	<b>ARCH. MICHELE FRATELLI</b>	<b>ING. GABRIELE BIANCHI</b>
<b>ING. RENATO VARRI</b>	<b>ING. GIANFRANCO BIANCHI</b>	<b>ING. GIANFRANCO BIANCHI</b>	<b>ING. GIANFRANCO BIANCHI</b>
<b>ING. RENATO VARRI</b>	<b>ING. GIANFRANCO BIANCHI</b>	<b>ING. GIANFRANCO BIANCHI</b>	<b>ING. GIANFRANCO BIANCHI</b>

**VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**INTEGRATORE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE**

**GEOLOGO**

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE**

**NA24**

**N - CANTIERIZZAZIONE**  
**NA - CANTIERIZZAZIONE OPERE MAGGIORI**  
**VI04 - VADOTTO N.04 - FASI COSTRUTTIVE**

**CODICE PROGETTO** NA24-T00CA01CANPE17\_A.dwg  
**PROGETTO** LIV. PROG. N. PROG. NA24-T00CA01CANPE17\_A.dwg  
**LO2|03** **E** **1|8|01** **CODICE ELAB.** T|0|0|CA|0|1|CAN|PE|17 **REVISIONE** A **SCALA:** VARIE

<b>C</b>				
<b>B</b>				
<b>A</b>	EMERSONE A SEGUITO DI RAPPORTO INTERMEDIO DI VERIFICA (TFC-C/18601-01-ATF-SA-0001)	MAGGIO 2019	ARCH. MAURO SASSO	ING. GAETANO RANERI
<b>REV.</b>	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO
