


MACROFASE 1 - FASE 1b - 60 gg

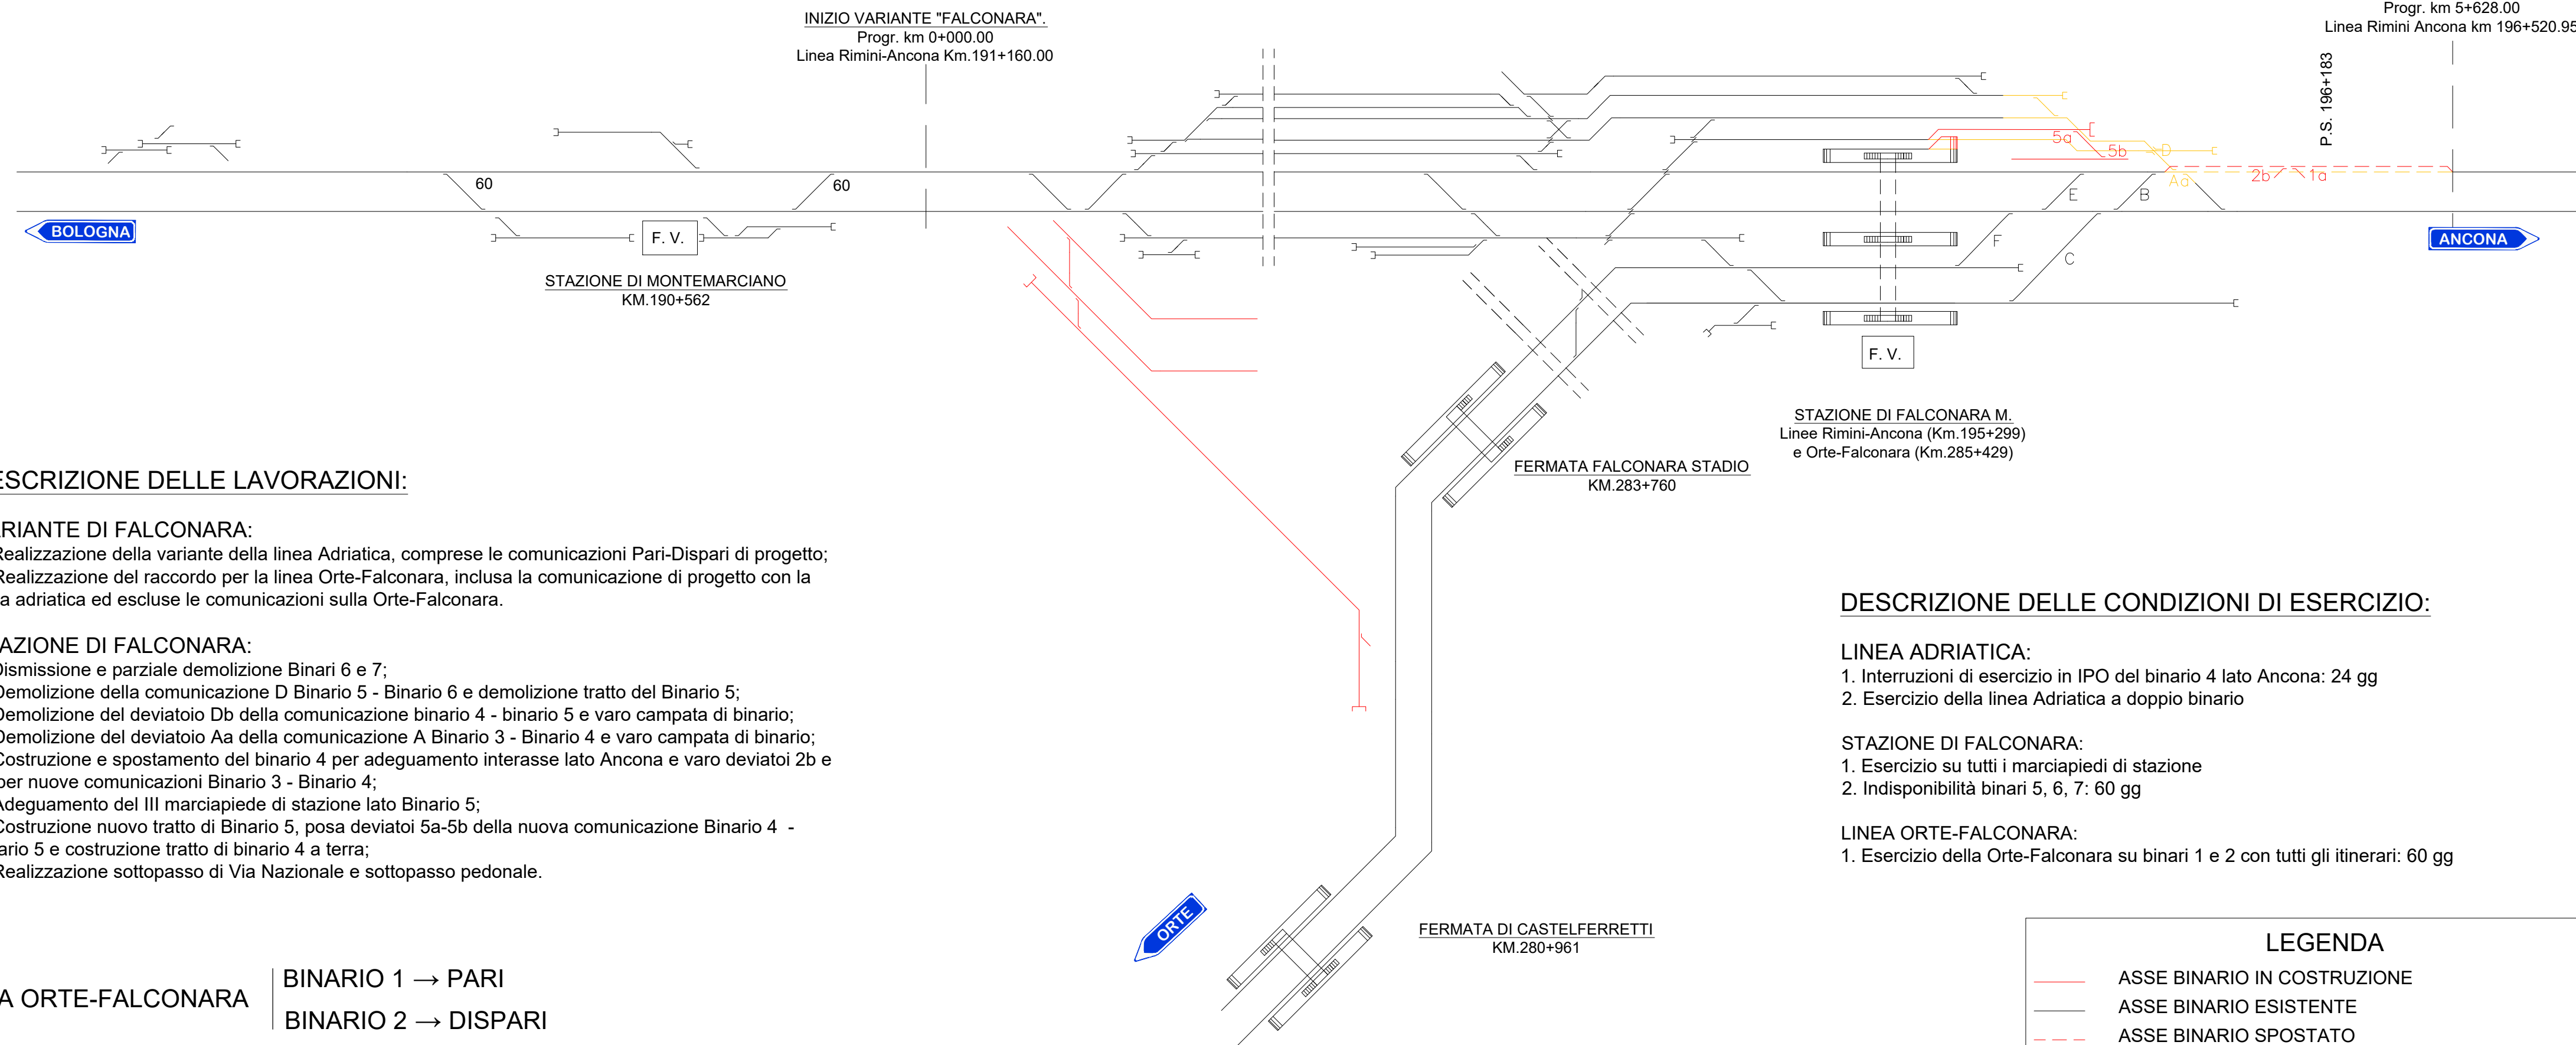

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI:

VARIANTE DI FALCONARA:

1. Realizzazione della variante della linea Adriatica, comprese le comunicazioni Pari-Dispari di progetto;
2. Realizzazione del raccordo per la linea Orte-Falconara, inclusa la comunicazione di progetto con la linea adriatica ed escluse le comunicazioni sulla Orte-Falconara.

STAZIONE DI FALCONARA:

1. Dismissione e parziale demolizione Binari 6 e 7;
2. Demolizione della comunicazione D Binario 5 - Binario 6 e demolizione tratto del Binario 5;
3. Demolizione del deviativo Db della comunicazione binario 4 - binario 5 e varo campata di binario;
4. Demolizione del deviativo Aa della comunicazione A Binario 3 - Binario 4 e varo campata di binario;
5. Costruzione e spostamento del binario 4 per adeguamento interasse lato Ancona e varo deviativi 2b e 1a per nuove comunicazioni Binario 3 - Binario 4;
6. Adeguamento del III marciapiede di stazione lato Binario 5;
7. Costruzione nuovo tratto di Binario 5, posa deviativi 5a-5b della nuova comunicazione Binario 4 - Binario 5 e costruzione tratto di binario 4 a terra;
8. Realizzazione sottopasso di Via Nazionale e sottopasso pedonale.

LINEA ORTE-FALCONARA

BINARIO 1 → PARI
BINARIO 2 → DISPARI

LINEA ADRIATICA

BINARIO 3 → PARI
BINARIO 4 → DISPARI
BINARIO 5 → PRECEDENZA

DESCRIZIONE DELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO:

LINEA ADRIATICA:

1. Interruzioni di esercizio in IPO del binario 4 lato Ancona: 24 gg
2. Esercizio della linea Adriatica a doppio binario

STAZIONE DI FALCONARA:

1. Esercizio su tutti i marciapiedi di stazione
2. Indisponibilità binari 5, 6, 7: 60 gg

LINEA ORTE-FALCONARA:

1. Esercizio della Orte-Falconara su binari 1 e 2 con tutti gli itinerari: 60 gg

LEGENDA

- ASSE BINARIO IN COSTRUZIONE
- ASSE BINARIO ESISTENTE
- ASSE BINARIO SPOSTATO
- ASSE BINARIO DA SPOSTARE
- ASSE BINARIO/OPERE IN DEMOLIZIONE
- ASSE BINARIO COSTRUITO IN FASE PRECEDENTE
- ASSE BINARIO PROVVISORIO

COMMITTENTE:



DIREZIONE INVESTIMENTI - S.O. PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI:



U.O. : AREA OPERATIVA CENTRO SUD

PM Nodi di Roma e Falconara, Orte - Falconara e Bologna - Falconara

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA FERROVIARIA: ADRIATICA
INTERVENTO: VARIANTE DI FALCONARA

CA - CANTIERIZZAZIONE

Esercizio

Schematico - Macrofase 1 b

APPALTATORE	IL PROGETTISTA	SCALA
 RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.r.l.	 TECH PROJECT ingegneria integrata®	-
IL DIRETTORE TECNICO Ing. Fabio Sgarrella		-

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IA1Y	00	E	ZZ	DX	CA2100	010	B

PROGETTAZIONE								IL PROGETTISTA
Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Ing. Giancarlo Tanzi
A	Rec. istruttoria del 13.03.2017	A. Casini	06/04/2017	A. Nastasi	07/04/2017	G. Tanzi	10/04/2017	
B	Rec. Rdv	F. Sgarrella	20/06/2017	A. Nastasi	20/06/2017	G. Tanzi	20/06/2017	

Data: 20/06/2017

CIG. 5512584838

CUP: J41C0700000001

File: IA1Y-00-E-ZZ-DX-CA2100-010_B.dwg
