


MACROFASE 1 - FASE 1c - 40 gg

INIZIO VARIANTE "FALCONARA".
 Progr. km 0+000.00
 Linea Rimini-Ancona Km.191+160.00

FINE VARIANTE "FALCONARA".
 Progr. km 5+628.00
 Linea Rimini Ancona km 196+520.95

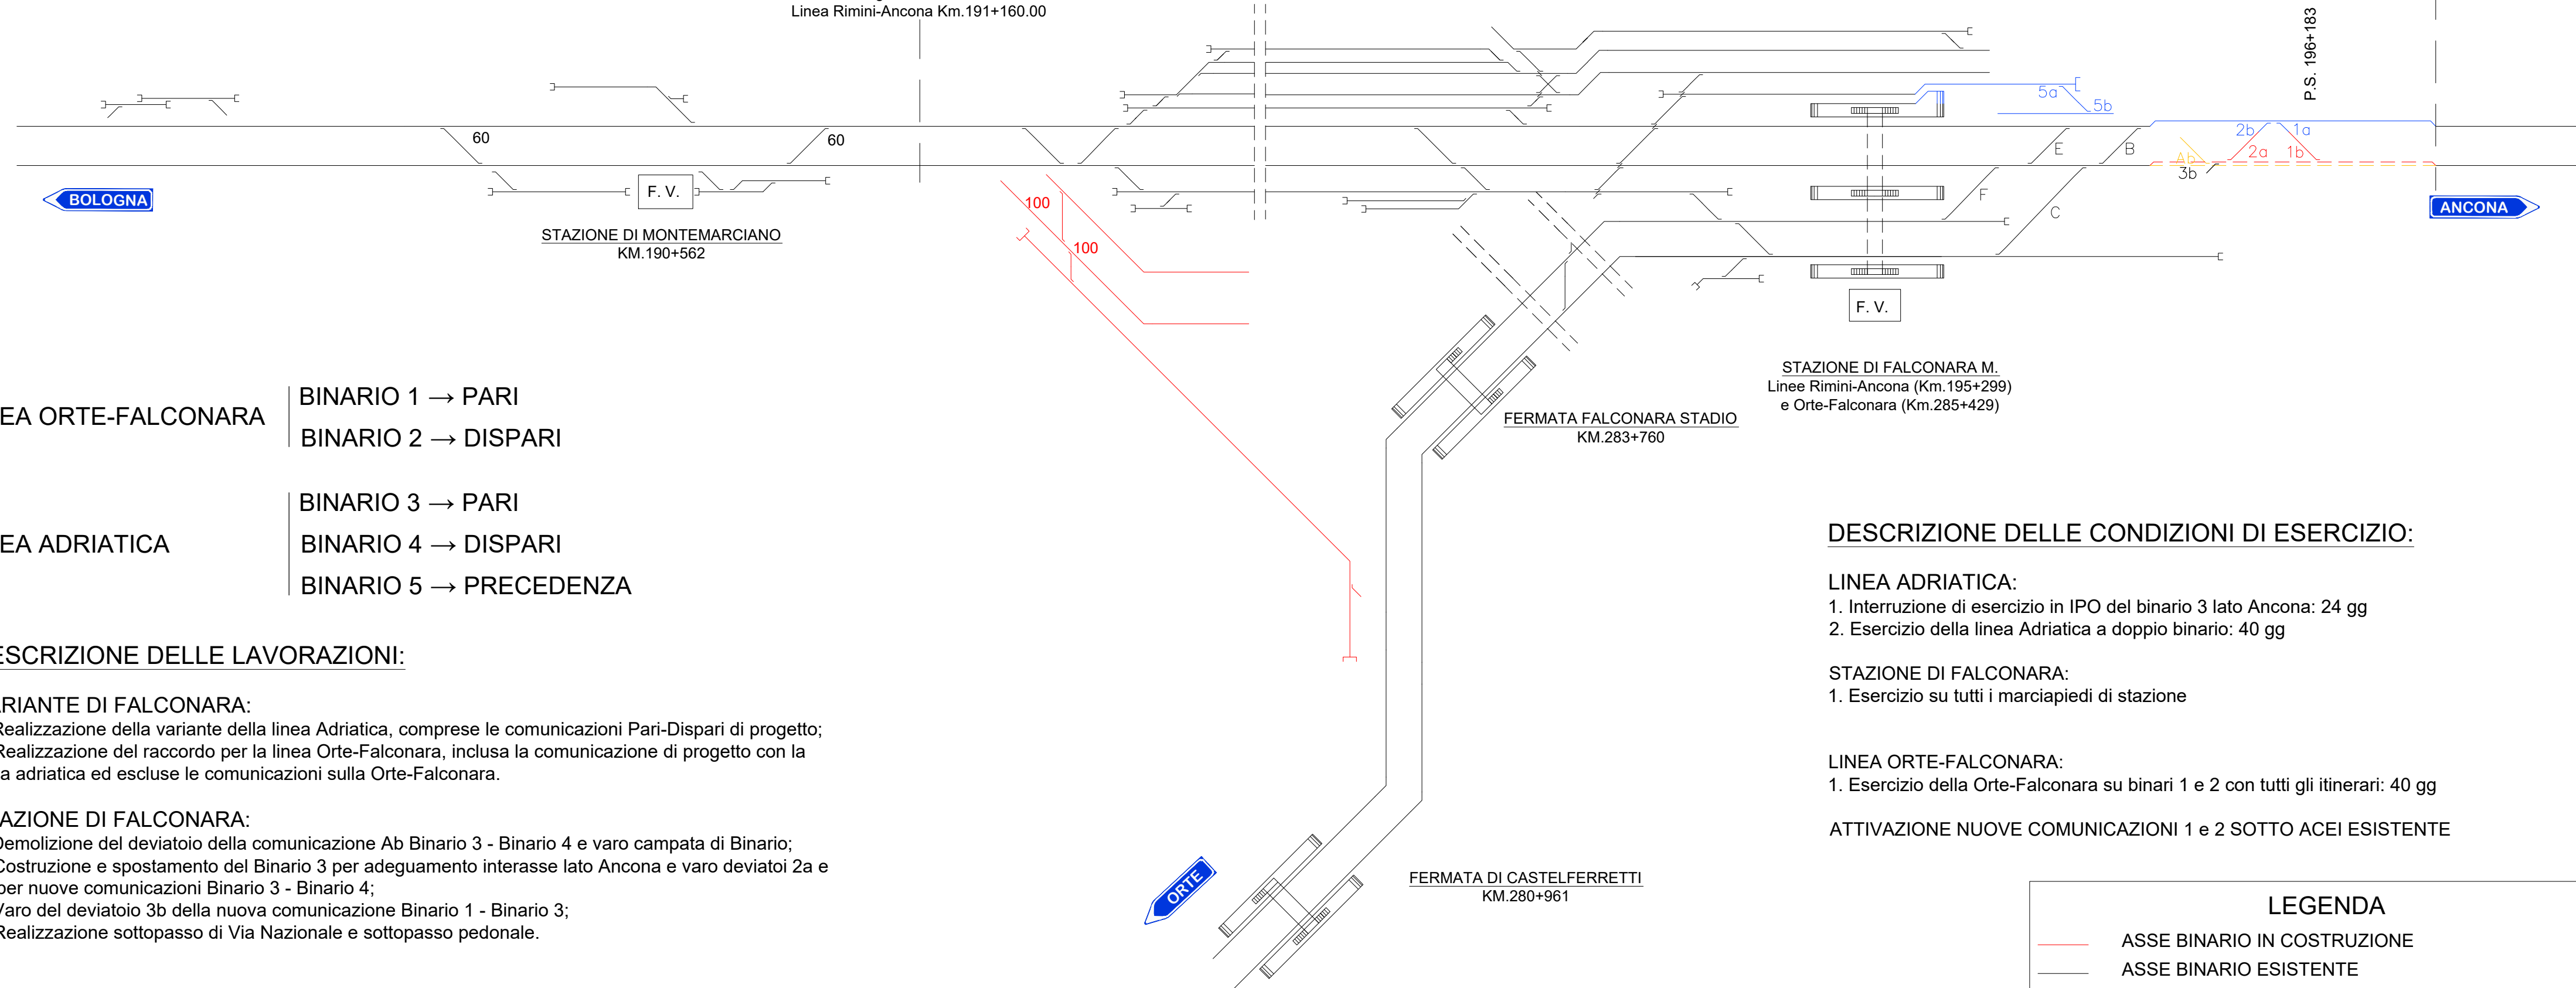

LINEA ORTE-FALCONARA
 BINARIO 1 → PARI
 BINARIO 2 → DISPARI

LINEA ADRIATICA
 BINARIO 3 → PARI
 BINARIO 4 → DISPARI
 BINARIO 5 → PRECEDENZA

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI:

VARIANTE DI FALCONARA:

1. Realizzazione della variante della linea Adriatica, comprese le comunicazioni Pari-Disparsi di progetto;
2. Realizzazione del raccordo per la linea Orte-Falconara, inclusa la comunicazione di progetto con la linea adriatica ed escluse le comunicazioni sulla Orte-Falconara.

STAZIONE DI FALCONARA:

1. Demolizione del deviatoio della comunicazione Ab Binario 3 - Binario 4 e varo campata di Binario;
2. Costruzione e spostamento del Binario 3 per adeguamento interasse lato Ancona e varo deviatoi 2a e 1b per nuove comunicazioni Binario 3 - Binario 4;
3. Varo del deviatioio 3b della nuova comunicazione Binario 1 - Binario 3;
4. Realizzazione sottopasso di Via Nazionale e sottopasso pedonale.

STAZIONE DI FALCONARA M.
 Linee Rimini-Ancona (Km.195+299)
 e Orte-Falconara (Km.285+429)

FERMATA FALCONARA STADIO
 KM.283+760

FERMATA DI CASTELFERRETTI
 KM.280+961

DESCRIZIONE DELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO:

LINEA ADRIATICA:

1. Interruzione di esercizio in IPO del binario 3 lato Ancona: 24 gg
2. Esercizio della linea Adriatica a doppio binario: 40 gg

STAZIONE DI FALCONARA:

1. Esercizio su tutti i marciapiedi di stazione

LINEA ORTE-FALCONARA:

1. Esercizio della Orte-Falconara su binari 1 e 2 con tutti gli itinerari: 40 gg

ATTIVAZIONE NUOVE COMUNICAZIONI 1 e 2 SOTTO ACEI ESISTENTE

LEGENDA

- ASSE BINARIO IN COSTRUZIONE
- ASSE BINARIO ESISTENTE
- ASSE BINARIO SPOSTATO
- ASSE BINARIO DA SPOSTARE
- ASSE BINARIO/OPERE IN DEMOLIZIONE
- ASSE BINARIO COSTRUITO IN FASE PRECEDENTE
- ASSE BINARIO PROVVISORIO

COMMITTENTE:



DIREZIONE INVESTIMENTI - S.O. PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI:



U.O. : AREA OPERATIVA CENTRO SUD

PM Nodi di Roma e Falconara, Orte - Falconara e Bologna - Falconara

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA FERROVIARIA: ADRIATICA
 INTERVENTO: VARIANTE DI FALCONARA

CA - CANTIERIZZAZIONE

Esercizio

Schematico - Macrofase 1 c

APPALTATORE	IL PROGETTISTA	SCALA
 RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.r.l.	 TECH PROJECT ingegneria integrata®	-
IL DIRETTORE TECNICO Ing. Fabio Sgarrella		-

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IA1Y	00	E	ZZ	DX	CA2100	011	B

PROGETTAZIONE								IL PROGETTISTA
Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Ing. Giancarlo Tanzi
A	Rec. istruttoria del 13.03.2017	A. Casini	06/04/2017	A. Nastasi	07/04/2017	G. Tanzi	10/04/2017	
B	Rec. Rdv	F. Sgarrella	20/06/2017	A. Nastasi	20/06/2017	G. Tanzi	20/06/2017	

Data: 20/06/2017

CIG. 5512584838

CUP: J41C0700000001

File: IA1Y-00-E-ZZ-DX-CA2100-011_B.dwg
