






**LEGENDA**

	Aree di cantiere: fasi 1, 2, 3 e 4		opere eseguite nella seconda fase
	Tracciato della galleria		opere eseguite nella quarta fase
	opere eseguite nella prima fase		
	opere eseguite nella terza fase		

### DESCRIZIONE FASE 3

- cantiere attivo sul lato occidentale di Largo Turati;
- incrocio a 4 rami provvisorio realizzato al centro di Largo Turati sfruttando le parti di soletta realizzate in Fase 1 e in Fase 2;
- accesso diretto a corso De Nicola inibito. Accesso possibile facendo inversione a U tramite l'apposito varco realizzato su Corso Rosselli;
- parcheggio ambulanze spostato oltre il varco per l'inversione di marcia su Viale Rosselli in modo da agevolare le manovre dei veicoli di soccorso riducendo le interferenze con le altre correnti veicolari;
- obbligo di svolta su via Jonio per i veicoli provenienti da via Egeo. Tali veicoli potranno comunque compiere tutte le manovre facendo inversione su via Savonarola.

Nota: fase che richiede un impianto semaforico provvisorio.

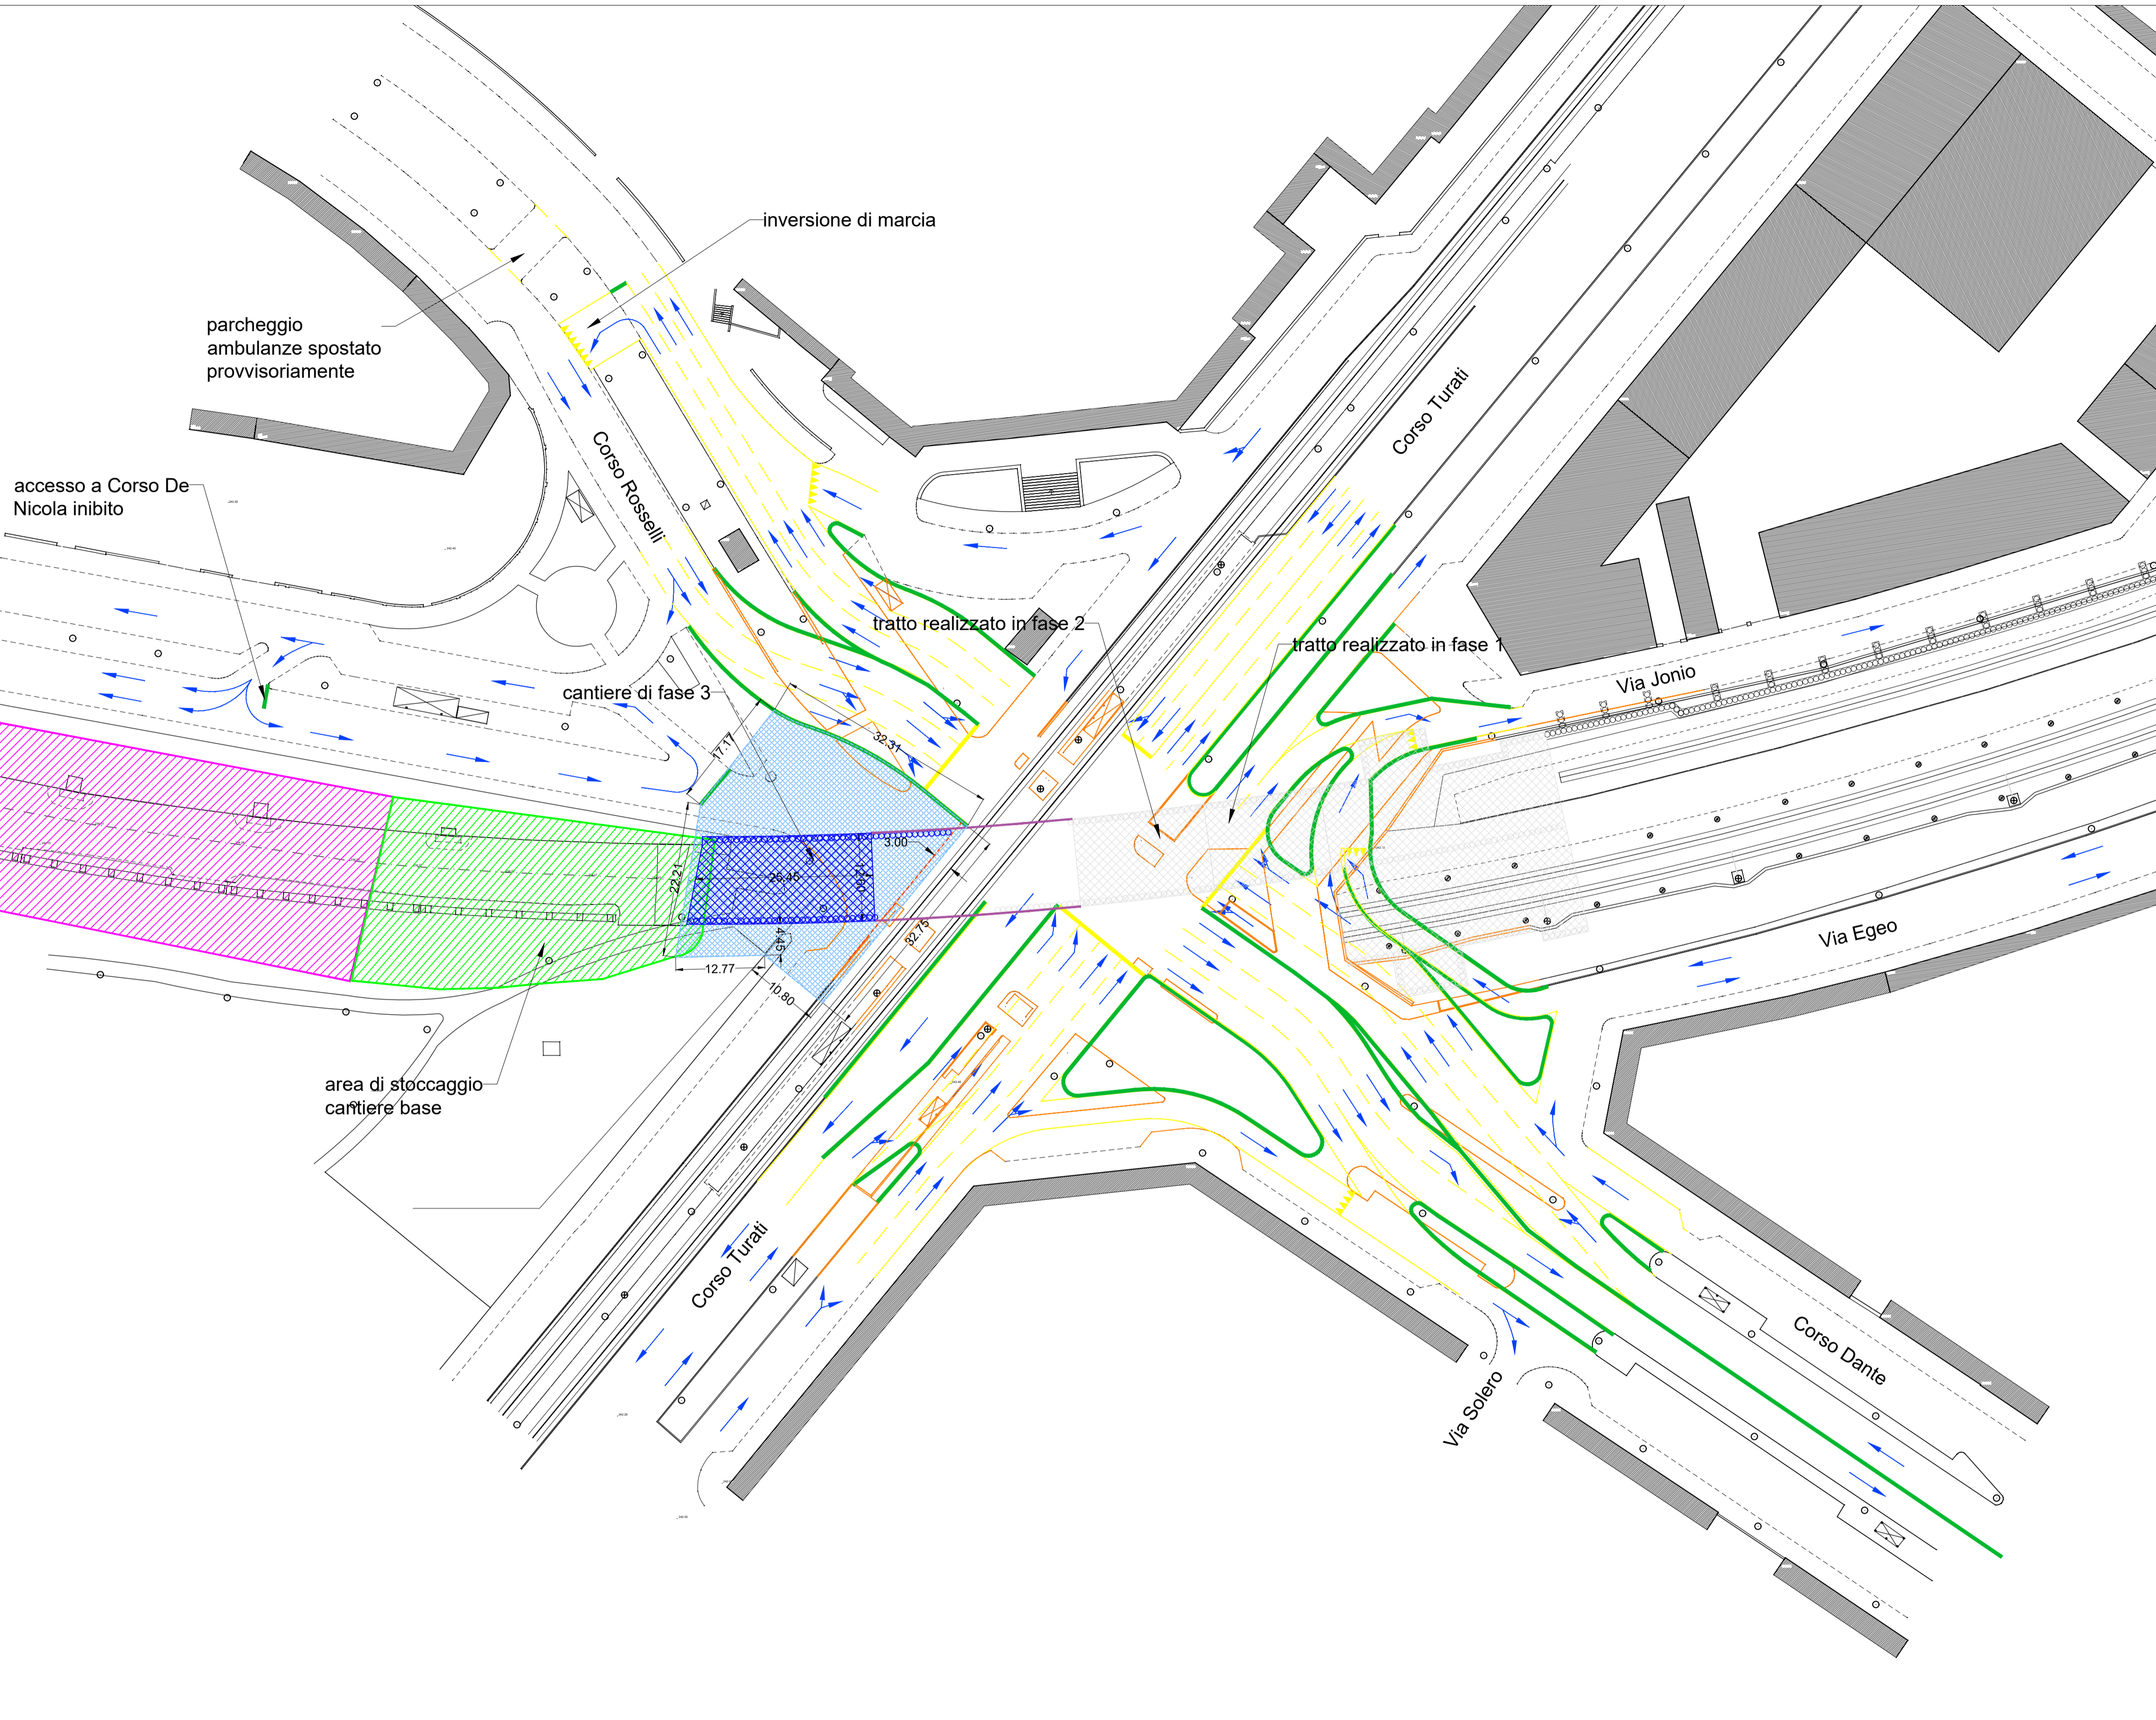

**LAVORAZIONI IN SUPERFICIE**

Approntamento area di cantiere, realizzazione BOE, spostamento sottoservizi e adeguamento viabilità (vedi nota 1)
Scavo di ribasso per la realizzazione del solettone di copertura e pali
Realizzazione di n° 78 pali
Realizzazione Solettone di copertura
Tempo per la maturazione del solettone, rinterro e sistemazione superficiale

**LEGENDA DELLA VIABILITÀ**

	Flusso di traffico
	Flusso di traffico (corsia riservata)
	Demolizioni
	Segnaletica orizzontale provvisoria
	New Jersey provvisorio

COMMITTENTE:  **RFI**  
RETE FERROVIARIA ITALIANA  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:  **ITALFERR**  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

**U.O. INFRASTRUTTURE NORD**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**NODO DI TORINO**

**COMPLETAMENTO LINEA DIRETTA TORINO PORTA SUSAS - TORINO PORTA NUOVA**

OPERE CIVILI  
VIABILITÀ

Sistemazione della viabilità provvisoria e definitiva  
Fasi di realizzazione - Tav. 3 di 4

SCALA: **1:500**

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

**NT0P 00 D 26 P 8 NV0000 003 A**

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorità	Data
A	Emissione esecutiva	V. PEISINO	Apr. 2019	V. A. MANITTA	Mag. 2019	G. DE MICHELE	Mag. 2019		

File: NT0P00D26P8NV000003A.dwg n. Elab.:
