




Inizio progetto km 0+000
Ingresso Stazione di
Dittaino km 172+871 L.S.

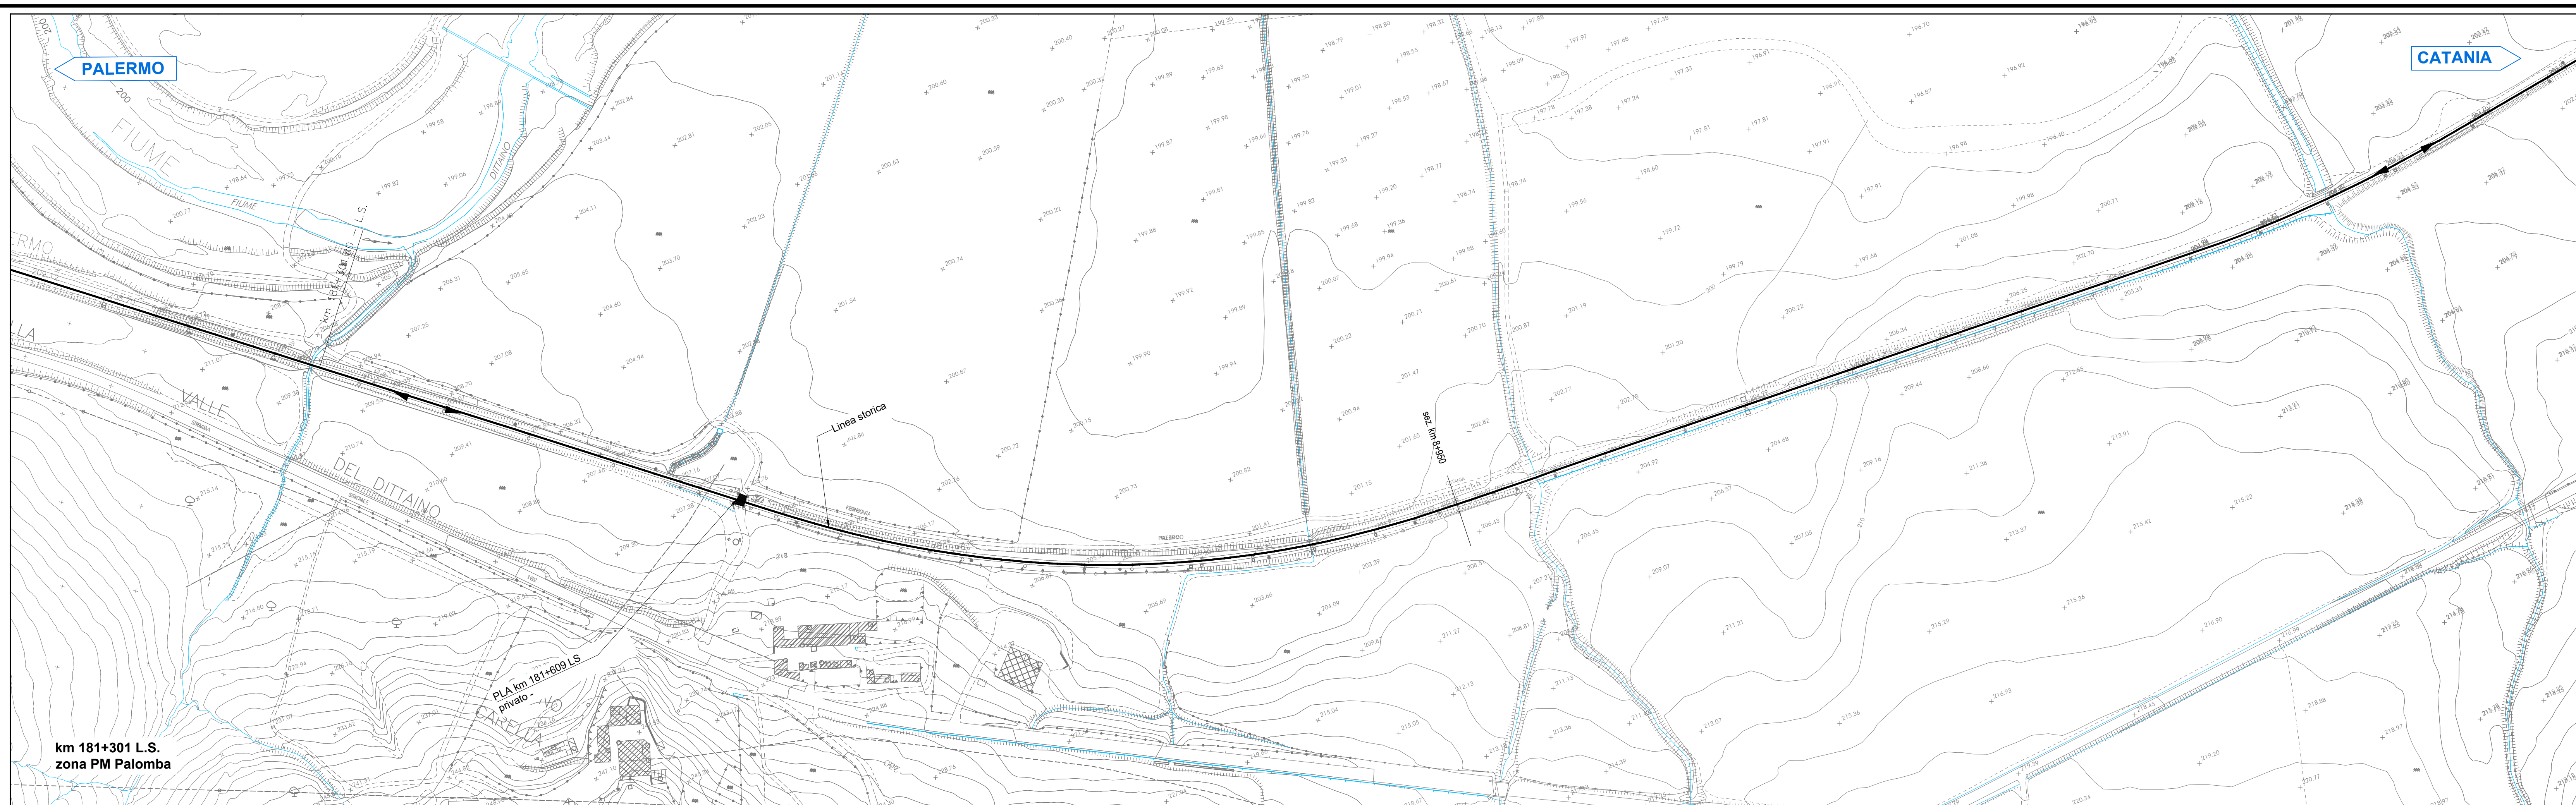

km 181+301 L.S.
zona PM Palomba



Variante definitiva L.S. km 0+000
km 190+909 L.S.



Variante provvisoria linea storica km 0+000
km 194+120 L.S.

Descrizione delle fasi

Fase Iniziale

- ✓ Realizzazione parziale della sede variante alla linea storica dal km 190+909 al km 192+200 non interferente con l'esercizio, comprensiva delle opere.
- ✓ Realizzazione parziale della sede della deviate provvisoria della linea storica dal km 194+120 al km 195+089 non interferente con la linea storica in esercizio comprensiva delle opere VI21, SL03 ed SL04. Durante questa fase sarà costruita parzialmente la viabilità NV18 che sarà collegata al ramo esistente tramite un ramo provvisorio. Durante la costruzione sarà utilizzata una deviazione provvisoria della viabilità interferente con quanto in costruzione.

In questa fase verranno iniziate le attività di realizzazione di tutte le opere di linea non interferenti con la linea in esercizio rappresentate in rosso nella Fase 1.

I lavori saranno effettuati senza interruzione di esercizio.

Legenda

- Esistente
- Costruzione nella fase di riferimento
- Demolizione nella fase di riferimento
- Costruito nella fase precedente
- Provvisorio
- Circolazione nella fase di riferimento

COMMITTENTE: **RFI** RETTE FERROVIARIE ITALIANE GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

PROGETTAZIONE: **ITALFERR** INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO
NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA

U.O. INFRASTRUTTURE SUD
PROGETTO DEFINITIVO
TRATTA DITTAINO - CATENANUOVA
INFRASTRUTTURA FERROVIARIA

Linea Progetto
Planimetria di progetto su cartografia - fasi costruttive tav. 1

SCALA: 1:2000

| | | | | | | | | |
|----------|-------|------|------|-----------|------------|------------|--------|------|
| COMMESSA | LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC. | OPERAZIONE | DISCIPLINA | PROGR. | REV. |
| RS3E | 50 | D | 78 | P6 | IF0104 | 001 | A | |

| Rev. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autorizzato Data |
|------|----------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------------|
| A | Emissione definitiva | C. Di Marco | 19/10/2019 | C. Di Marco | 22/10/2019 | [Signature] | 22/10/2019 | D. Tassi |

File: R3E50D78P6IF0104001.dwg In. Etab.: 398
