

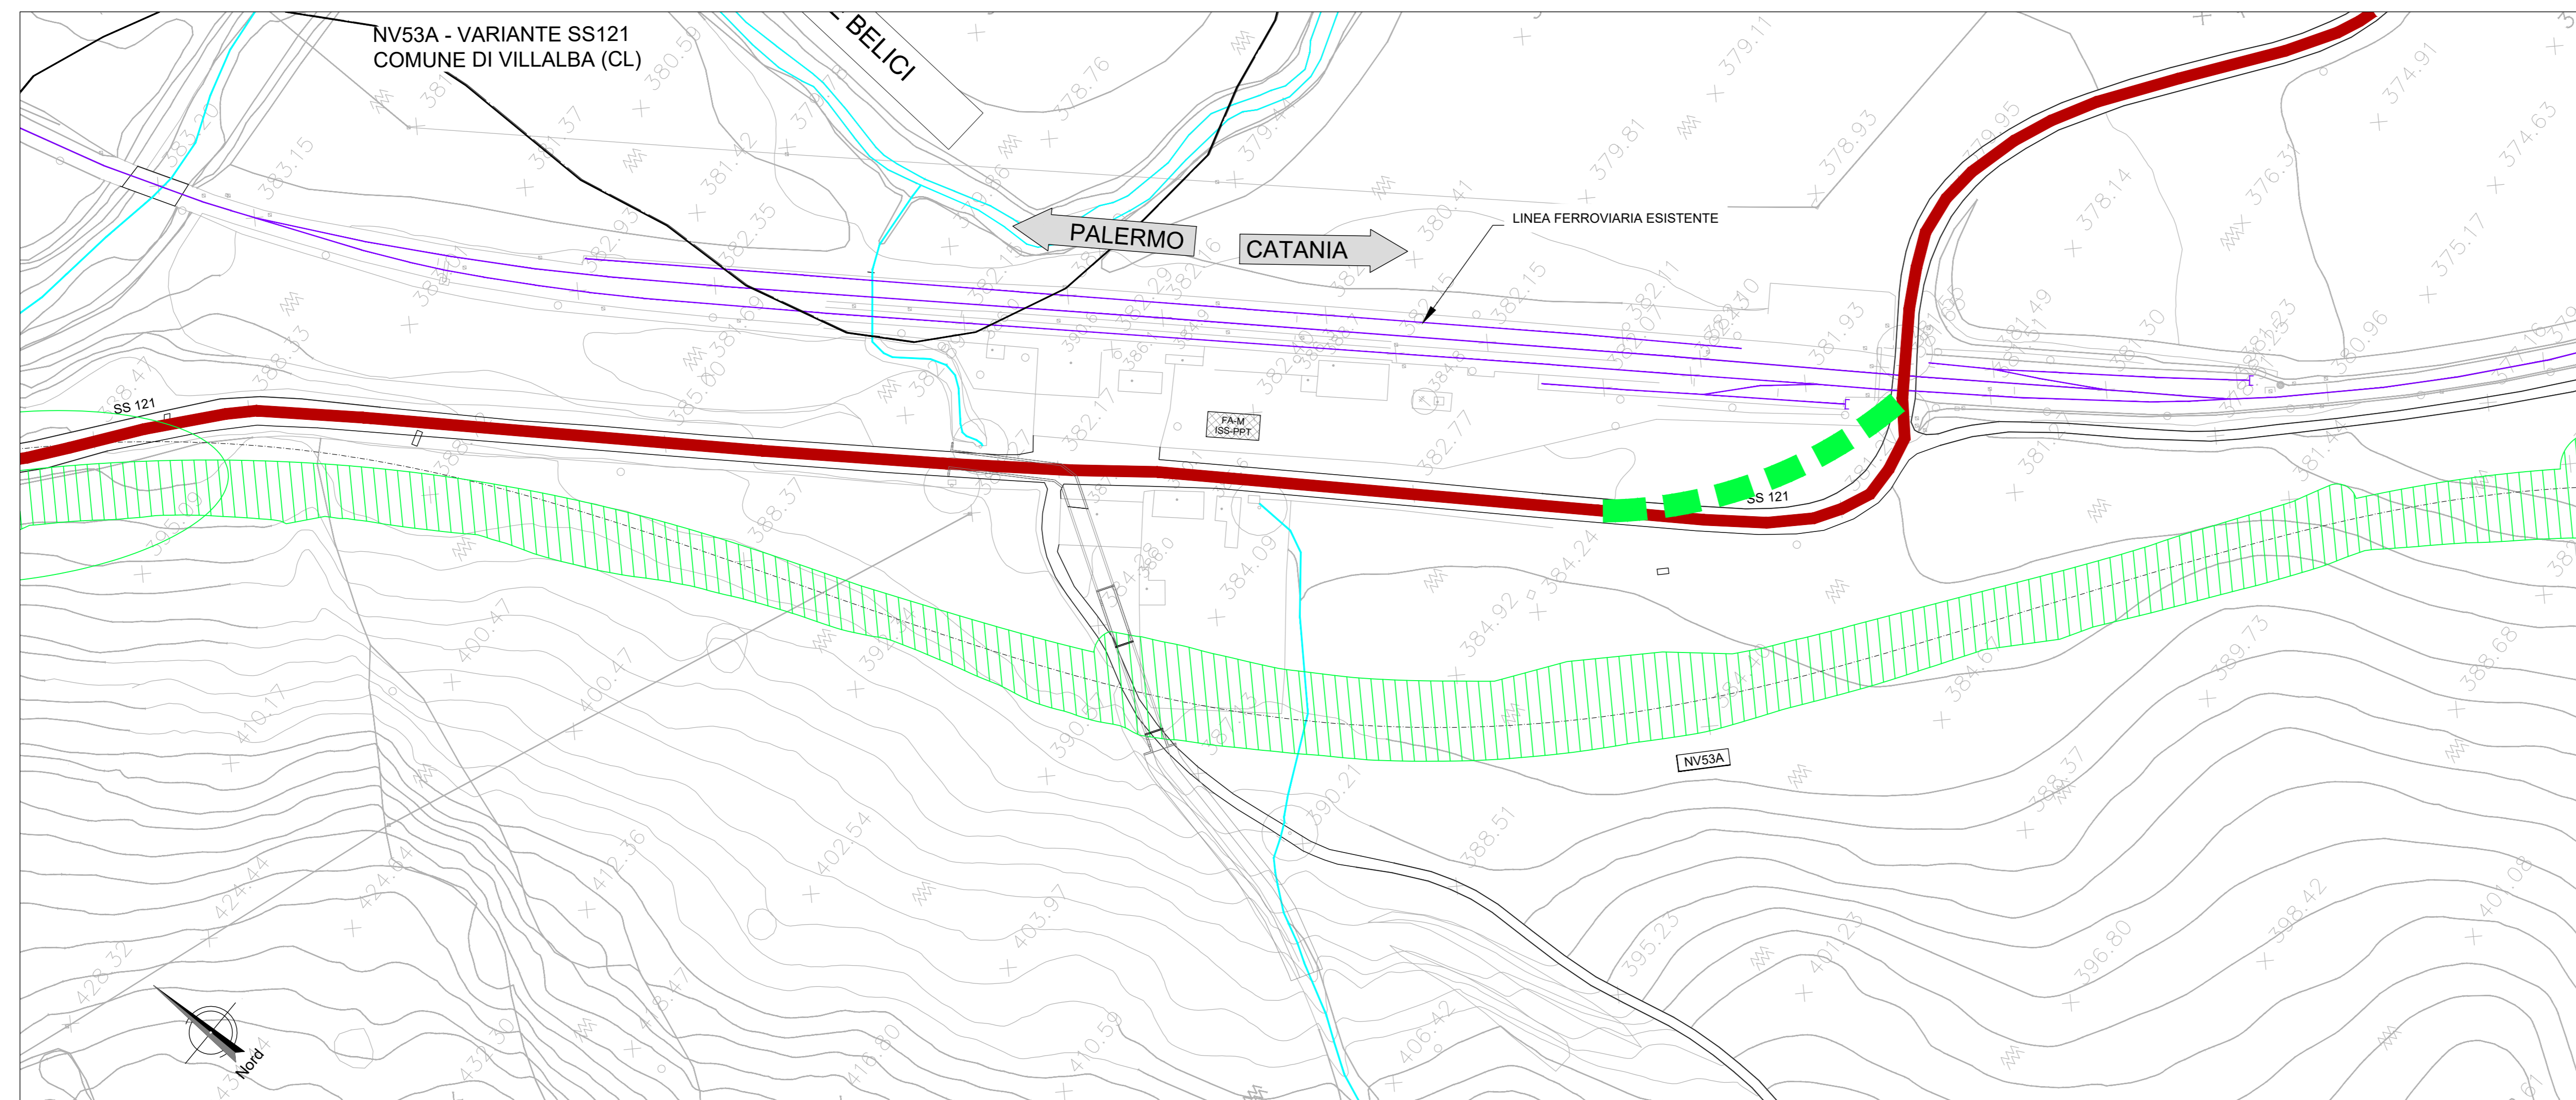


NV53A - VARIANTE SS121  
COMUNE DI VILLALBA (CL)

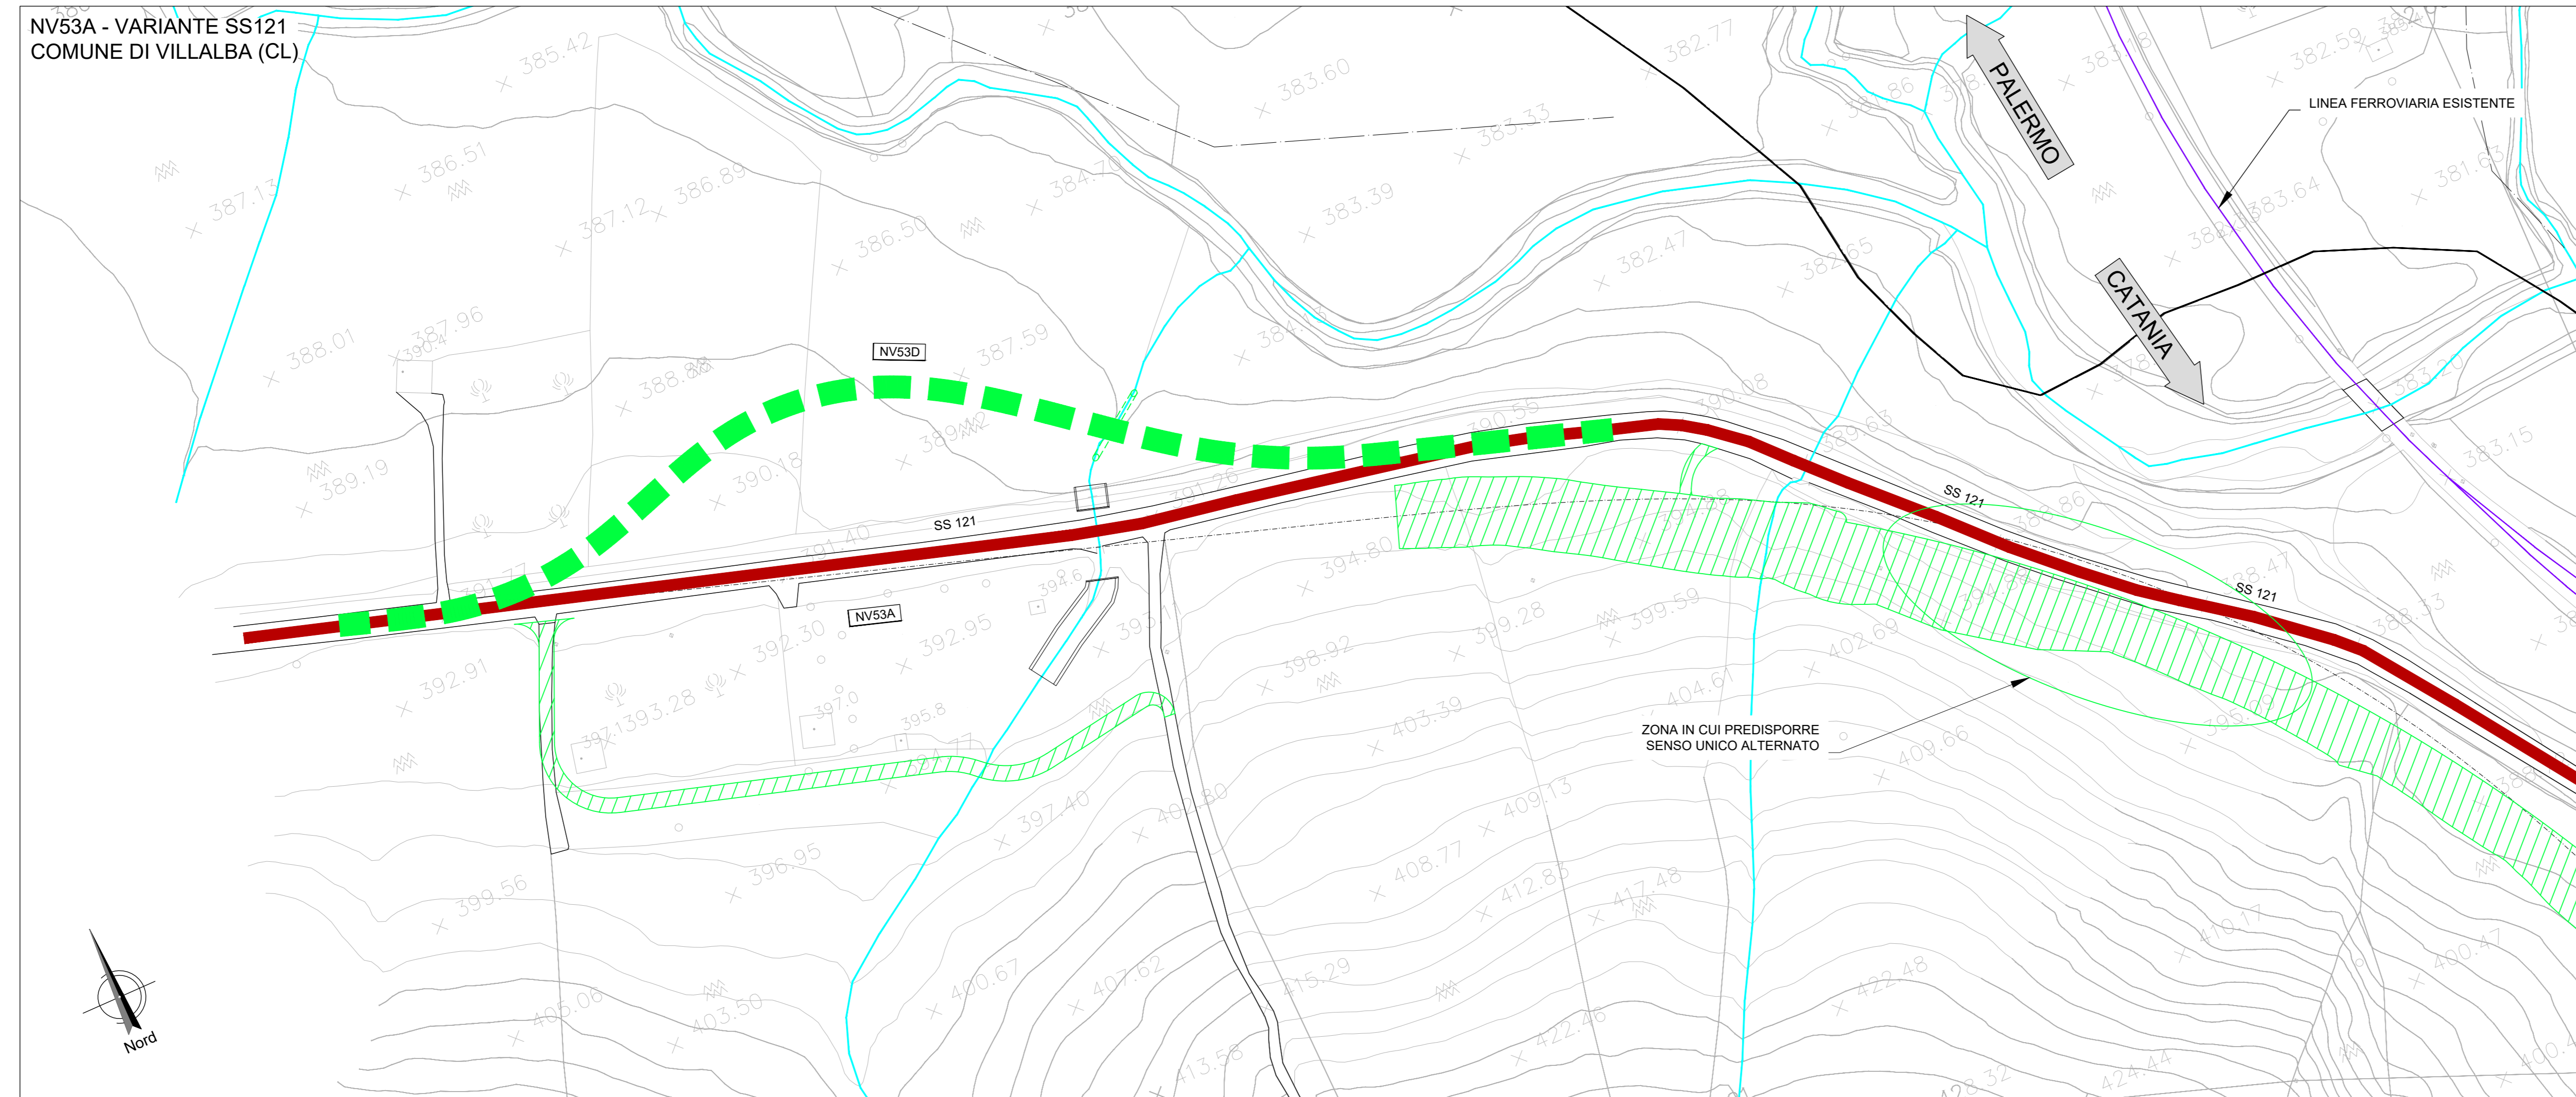

**FASE1**  
Viabilità:  
Il traffico rimane sulla sede attuale della SS121, con restringimento della carreggiata in prossimità delle aree di cantiere, per consentire la realizzazione della NV53A tra la sezione 10 (prog 0+450) e la sezione 12 (prog 0+550), la viabilità esistente verrà parzializzata, istituendo un senso unico alternato (il restringimento e il senso unico alternato sono presenti nelle zone cerchiate); l'accesso alla Stazione di Villalba viene garantito dalla viabilità esistente SS121.

Lavori:  
realizzazione viabilità di progetto NV53A da progressiva 0+300.00 a progressiva 2+791.46;  
realizzazione deviazione provvisoria della SS121 (NV53D) con tomboni provvisori;  
realizzazione deviazione provvisoria della SS121 dopo il passaggio a livello esistente su linea storica a progressiva 22+410;  
realizzazione viabilità di ricorritura per l'accesso ai fondi  
realizzazione parziale tombino NV55.

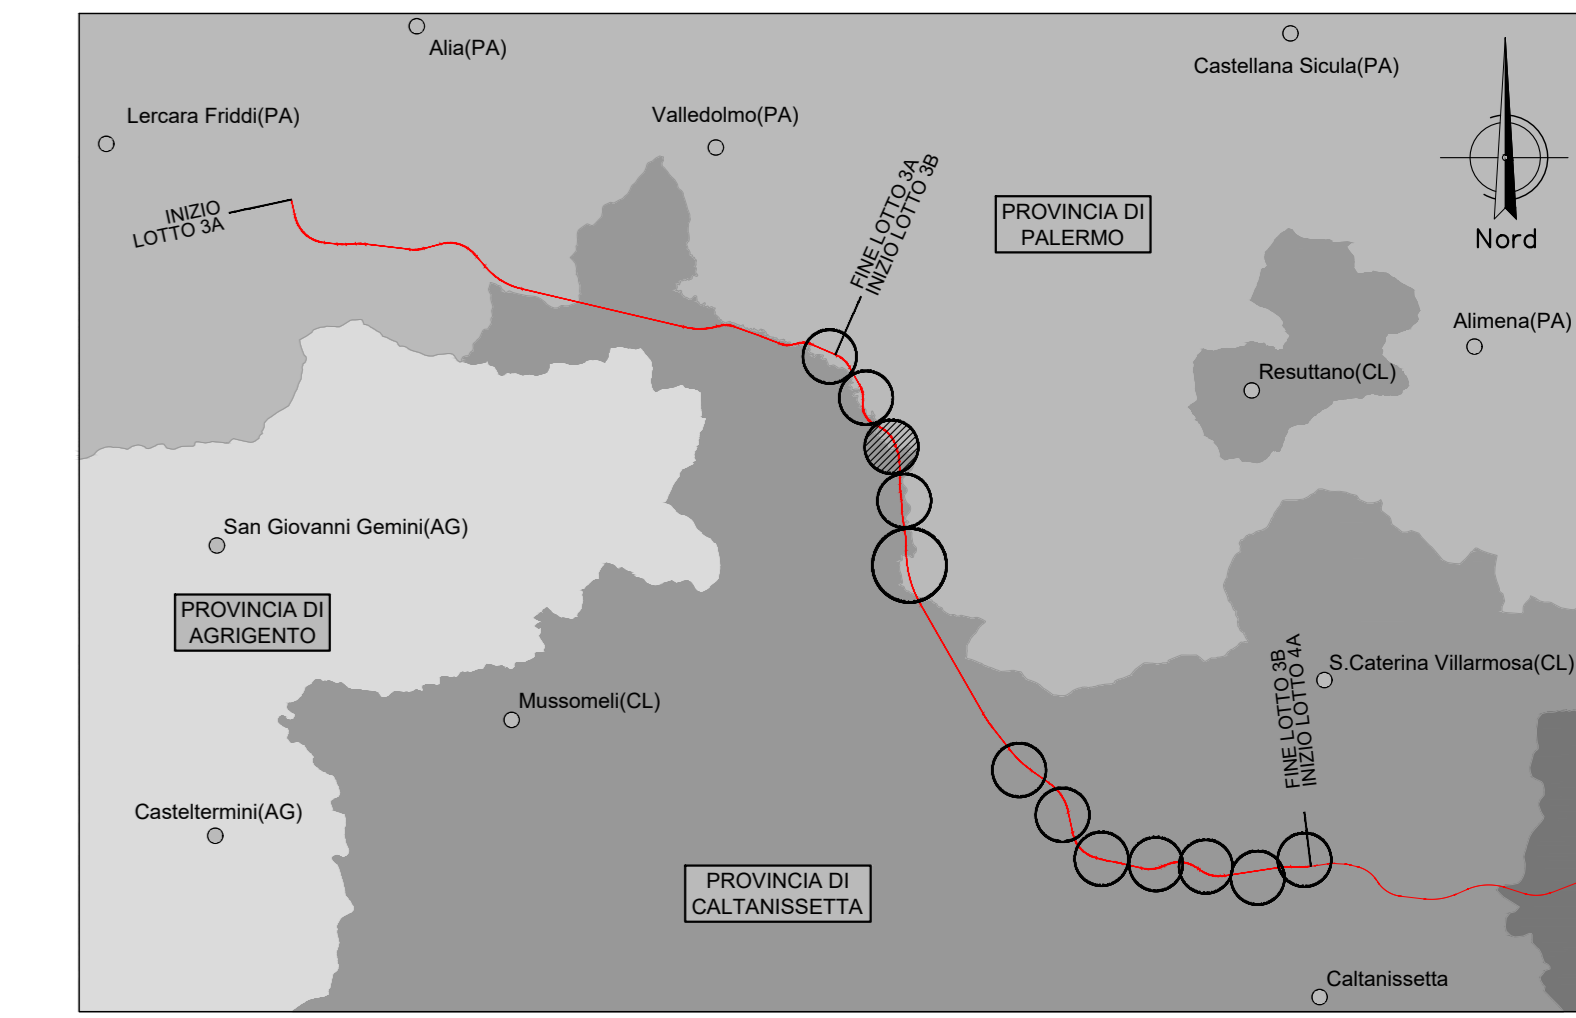

LEGENDA FASI			
SIMBOLO	NOME	SIMBOLO	NOME
	TRAFFICO: VIABILITÀ IN ESERCIZIO NELLA FASE		LAVORI: TRATTO DI VIABILITÀ IN COSTRUZIONE NELLA FASE
	LAVORI: REALIZZAZIONE DEVIAZIONE PROVVISORIA		LAVORI: TRATTO DI VIABILITÀ COSTRUITA NON IN ESERCIZIO

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO  
NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA

U.O. INFRASTRUTTURE SUD  
PROGETTO DEFINITIVO  
TRATTA LERCARA DIR. - CALTANISSETTA XIRBI (LOTTO 3)

VIABILITÀ  
NV53A - Variante SS121 da pk 21+646 a pk 24+300  
Planimetria fasi - Tav. 1 di 4

SCALA:  
1:1000

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.  
RS3T 30 D 78 P7 NV53A0 007 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	M. M. M.	Apr-2020	[Signature]	Apr-2020	[Signature]	Apr-2020	07/04/2020
