


**FASE 1**

Fase 1a) Realizzazione paratie provvisorie lungo la Linea Storica ed a protezione degli scavi delle nuove rampe di accesso lato BD, previa chiusura al traffico di via della Stazione  
 Fase 1b) Demolizione degli edifici lato BD e manufatto esistente limitatamente a una distanza di 3.5m dal nuovo asse BD  
 Fase 1c) Realizzazione del 1° concio del nuovo sottopasso, delle scale e delle rampe lato BD  
 Fase 1d) Realizzazione impalcato, armamento, elettrificazione e finiture 1° concio (lato binario dispari)  
 Fase 1e) Attivazione linea lato BD

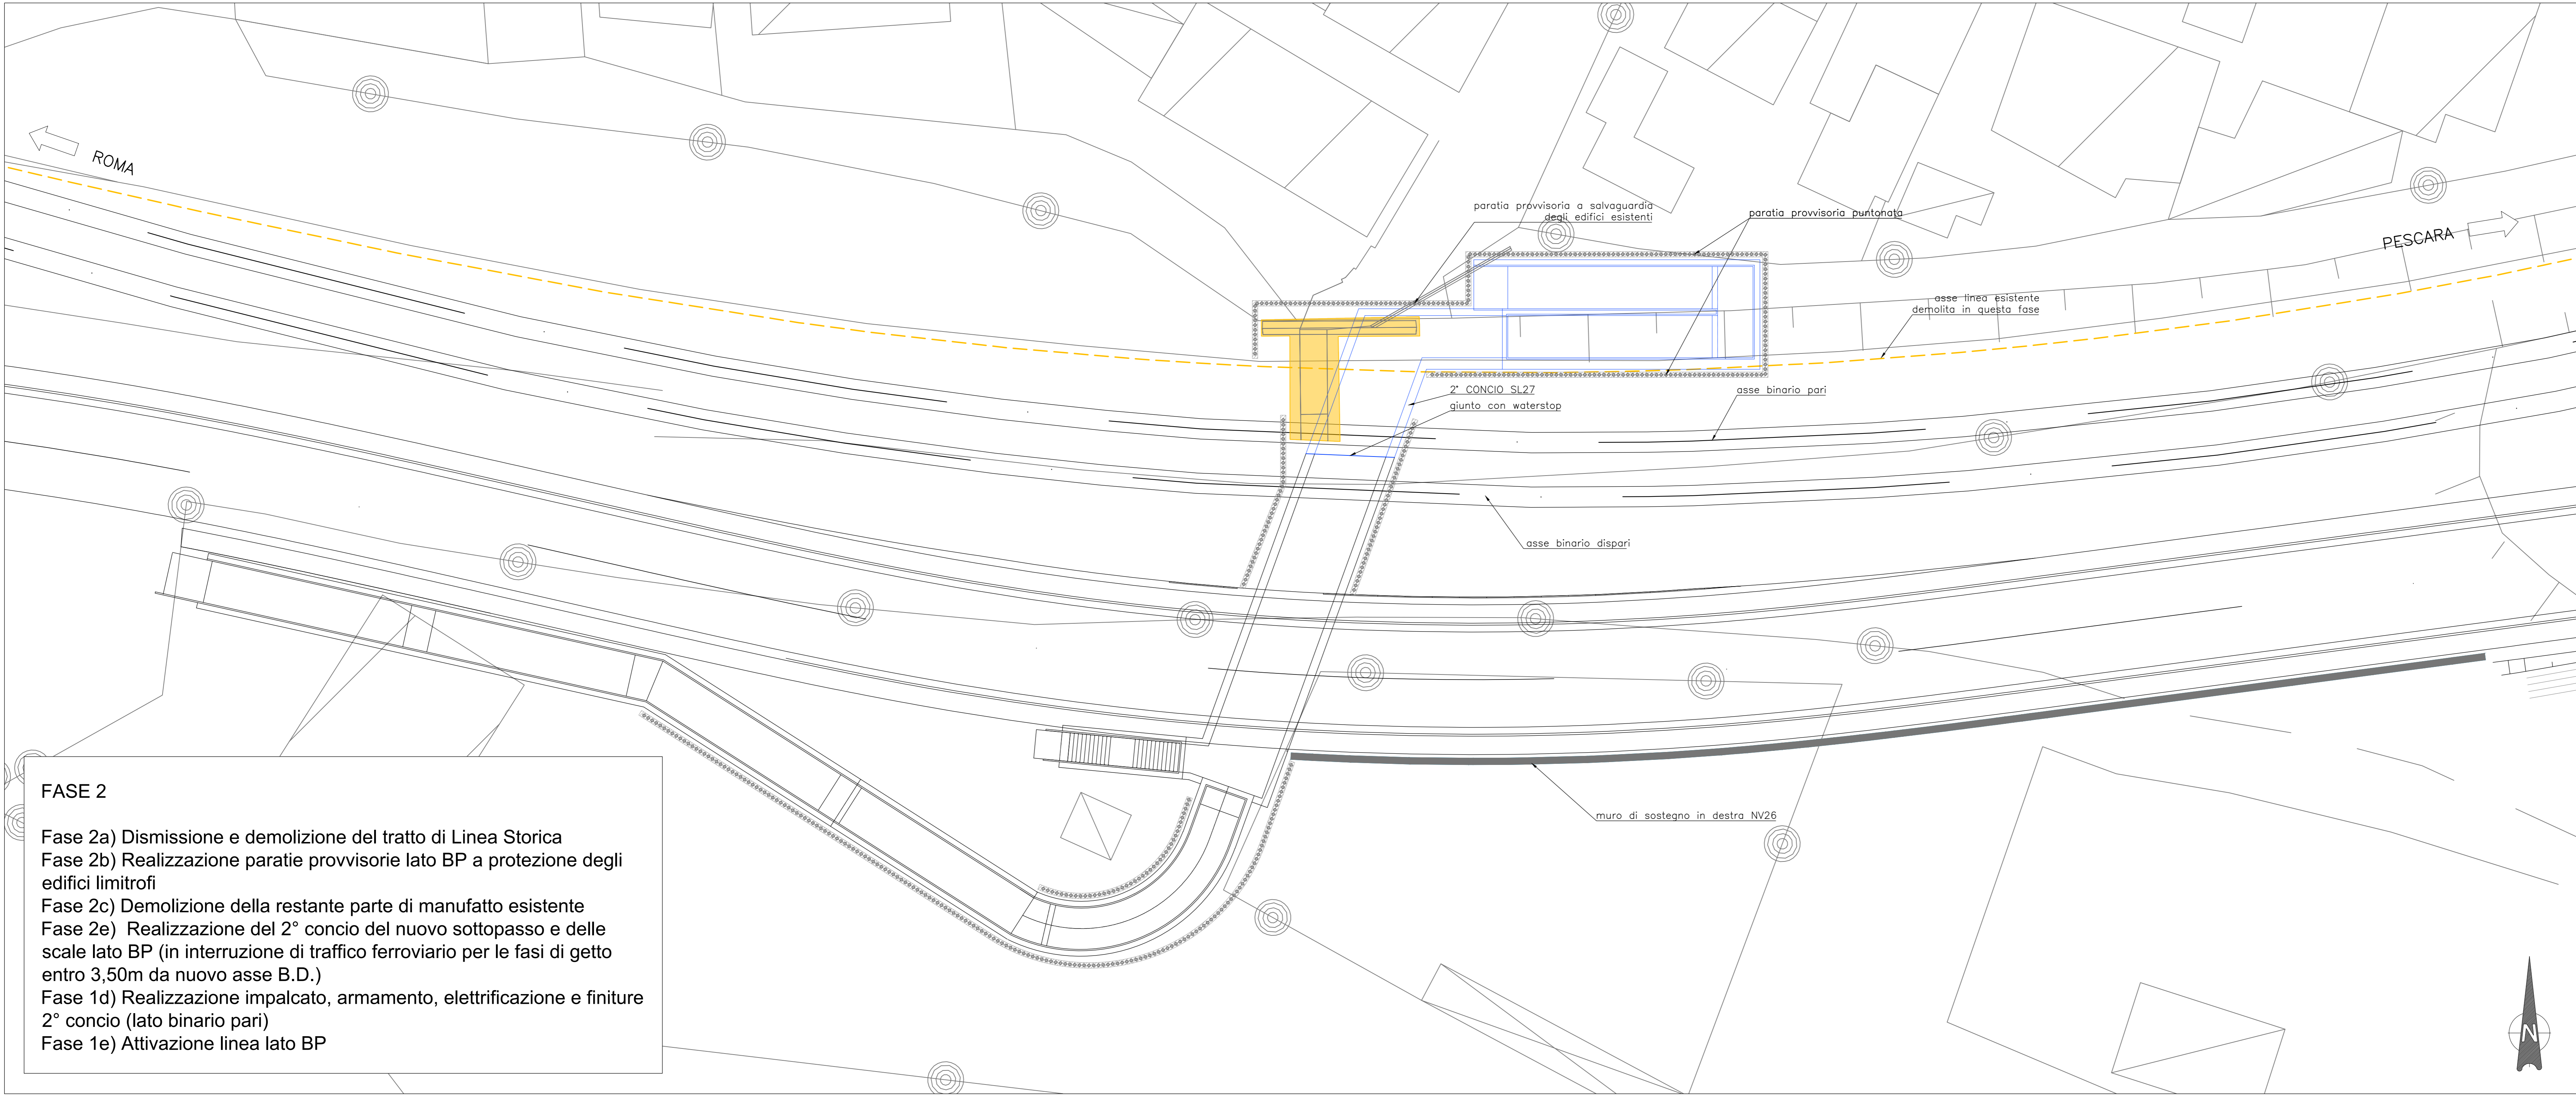

**FASE 2**

Fase 2a) Dismissione e demolizione del tratto di Linea Storica  
 Fase 2b) Realizzazione paratie provvisorie lato BP a protezione degli edifici limitrofi  
 Fase 2c) Demolizione della restante parte di manufatto esistente  
 Fase 2e) Realizzazione del 2° concio del nuovo sottopasso e delle scale lato BP (in interruzione di traffico ferroviario per le fasi di getto entro 3,50m da nuovo asse B.D.)  
 Fase 1d) Realizzazione impalcato, armamento, elettrificazione e finiture 2° concio (lato binario pari)  
 Fase 1e) Attivazione linea lato BP

**LEGENDA**

DEMOLIZIONI  
 REALIZZATO IN QUESTA FASE

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

**DIREZIONE TECNICA**  
**S.O. PROGETTAZIONE INTEGRATA CENTRO**  
**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA**

**VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA ROMA - PESCARA**  
**RADDOPPIO FERROVIARIO TRATTA SCAFA - MANOPPELLO**  
**(LOTTO 2)**

**SL27 - Sottopasso pedonale alla pk 7+163,00**  
 Fasi costruttive

SCALA :  
 1:200

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IA97	00	R	29	BZ	SL27/00	001	A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione definitiva	P. Luciani	Agosto 2021	P. Di Pietro	Agosto 2021	T. Pirogati	Agosto 2021	F. Arduni	Agosto 2021
